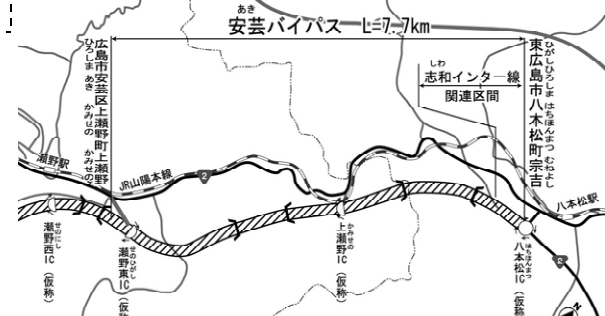


再評価結果（平成20年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道防災課
担当課長名：下保 修

事業名	地域高規格道路 一般国道2号 安芸バイパス	事業区分	一般国道 (2次改築)	事業主体	中国地方整備局
起終点	自：広島県東広島市八本松町宗吉 至：広島県広島市安芸区上瀬野町上瀬野	延長	7.7 km		
事業概要	<p>一般国道2号は、大阪市から北九州市に至る延長約680kmの主要な幹線道路であり、西日本の大動脈として沿道地域の産業・社会活動や住民の生活に大きな役割を果たす重要な路線である。</p> <p>安芸バイパスは、国道2号の慢性的な交通混雑の緩和、交通安全の確保、周辺地域との連携強化を図ることを目的とした延長7.7kmの4車線道路である。</p>				
H7年度事業化	S49年度都市計画決定 (H18年度変更)	H9年度用地着手	H12年度工事着手		
全体事業費	550億円	事業進捗率	27%	供用済延長	0.0km
計画交通量	46,000~48,200 台/日				
費用対効果 分析結果	B/C (事業全体) 2.5 (残事業) 4.2	総費用 (残事業)/(事業全体) 296 / 499 億円 事業費：266 / 469 億円 維持管理費：30 / 30 億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 1,247 / 1,247 億円 走行時間短縮便益：902 / 902 億円 走行経費減少便益：278 / 278 億円 交通事故減少便益：66 / 66 億円	基準年	平成19年
感度分析の結果	<p>残事業（事業全体）について感度分析を実施</p> <p>交通量変動：B/C=2.8 (4.8) (交通量+10%) B/C=2.0 (3.4) (交通量-10%)</p> <p>事業費変動：B/C=2.3 (3.9) (事業費+10%) B/C=2.8 (4.6) (事業費-10%)</p>				
事業の効果等	<ul style="list-style-type: none"> 円滑なモビリティの確保（当該路線の整備により西条駅から広島バスセンター（芸予バス）等、バス路線の定時制が確保されるなど、路線バスの利便性向上が見込まれる） 国土・地域ネットワークの構築（東広島市と広島市を最短で連絡） <p style="text-align: right;">他14項目に該当</p>				
関係する地方公共団体等の意見	<p>安芸バイパスは東広島バイパスと一体となって、地域交流の促進、交通混雑の緩和等に重要な役割を果たすことが期待されており、広島市、東広島市、海田町の首長で構成される「国道2号東広島・安芸バイパス建設促進期成同盟会」により早期整備の要望（平成19年7月23日）を受けている。</p>				
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	<p>当該地域に隣接する東広島市では、広島大学の移転及び中央テクノポリスの建設により急速な発展に伴う自動車交通の増加が、広島市東側流入部等における国道2号の慢性的な交通混雑を引き起こしている。</p>				
事業の進捗状況、残事業の内容等	<p>平成18年度末時点で、用地買収については54%が完了。</p>				
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	<p>現在、全線暫定2車供用を目指し、事業を進めているところである。</p>				
施設の構造や工法の変更等	<p>新技術の活用（PCコンポ橋、鋼管ソイルセメント杭の導入）等によりコスト縮減を図っている。</p>				
対応方針	事業継続				
対応方針決定の理由	以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。				
事業概要図					

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。
