

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道17号 綾戸バイパス
事業主体	関東地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	○費用 ・事業全体：事業費99億円（85億円）、維持管理費7.3億円（7.3億円） ○災害時の迂回解消を含む走行時間の短縮等（119億円 事業全体・残事業） ○災害による被害の回避 ・バイパス整備による災害の回避、迂回の解消（要防災対策箇所回避） 要防災対策箇所28箇所⇒全箇所回避 関越自動車道通行止め時に代替路として機能する（0.52億円） ・救急医療へのアクセス向上 渋川消防署、渋川総合病院から綾戸バイパス沿線地区までの到着時間が短縮される（0.82億円） ・歩行者・自転車の安全性、利便性の向上 歩道設置により、歩行者、自転車の安全性、利便性が向上される（0.05億円） ・線形不良箇所の回避、急勾配区間の回避 線形不良箇所（半径150m未満）15箇所、急勾配区間（5%を超える）2区間⇒全箇所回避 ○地域住民の不安感の解消（通行止めの解消等）（390億円） ※（ ）内の数値は残事業の効果 （注1）事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値であり、試算値を含む。 （注2）費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析区間）について 渋滞損失時間（現況）の渋滞損失時間：6,301,500人・時間/年 渋滞損失削減時間：411,900人・時間/年（7,597.2千人時間/年⇒7,185.3千人時間/年）削減率：5.42% 区間b（当該区間／平行区間）について：（該当区間：一般国道17号、渋川市上白井～沼田市岩本町） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：135,451人・時間/年 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：10割削減
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	民間バス路線（定期便）
	<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる <input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 <input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

1. 活力

都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
	<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
	<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
	<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
	<input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
	<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	

		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	渋川総合病院（二次医療施設）から綾戸バイパス沿線地区までの到着時間が2分短縮。
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置付けがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置付けのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	群馬県地域防災計画：第一次緊急輸送道路として位置づけ
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道17号現道（渋川市上白井～沼田市岩本町）が通行止めになった場合大幅な迂回を強いられる。
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	国道17号現道（渋川市上白井～沼田市岩本町）は道路防災総点検要対策箇所が28箇所存在。バイパス整備により全箇所回避。
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：約5,940t/年 排出削減率：約0.46%削減
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	排出削減量：約9.3t/年、排出削減率：約0.70%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	排出削減量：約1.0t/年、排出削減率：約0.82%削減
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要がある	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用と便益の内容

※便益は、災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮 等

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
国道17号	綾戸バイパス	L=2.3km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
17,600~18,200	4	関東地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成22年度		
単純合計	150億円	29億円	179億円
うち残事業分	138億円	29億円	168億円
基準年における 現在価値 (C)	99億円	7.3億円	106億円
うち残事業分	85億円	7.3億円	92億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成22年度			
供用年	平成42年度			
単年便益 (初年便益)	6.7億円	0.04億円	0.08億円	6.9億円
基準年における 現在価値 (B)	115億円	0.40億円	3.3億円	119億円
うち残事業分	115億円	0.40億円	3.3億円	119億円

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化


事業名：綾戸バイパス（事業全体・残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]： 2.3km	交通量	[台/日]	-	17,900	
	走行時間	[分]	-	3	
	走行時間費用	[億円/年]	-	9.38	
②主な周 辺道路	国道17 号：2.5km	交通量	[台/日]	16,000	-
		走行時間	[分]	4	-
		走行時間費用	[億円/年]	13.41	-
	(県)下 久屋洪川 線：8.8km	交通量	[台/日]	5,900	5,700
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	15.40	14.73
	関越自動 車道： 8.7km	交通量	[台/日]	22,300	21,800
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	31.20	30.50
③その他道路合計 ：337.5km	走行時間費用	[億円/年]	835.94	831.23	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：357.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	895.95	885.84	10.11

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること)

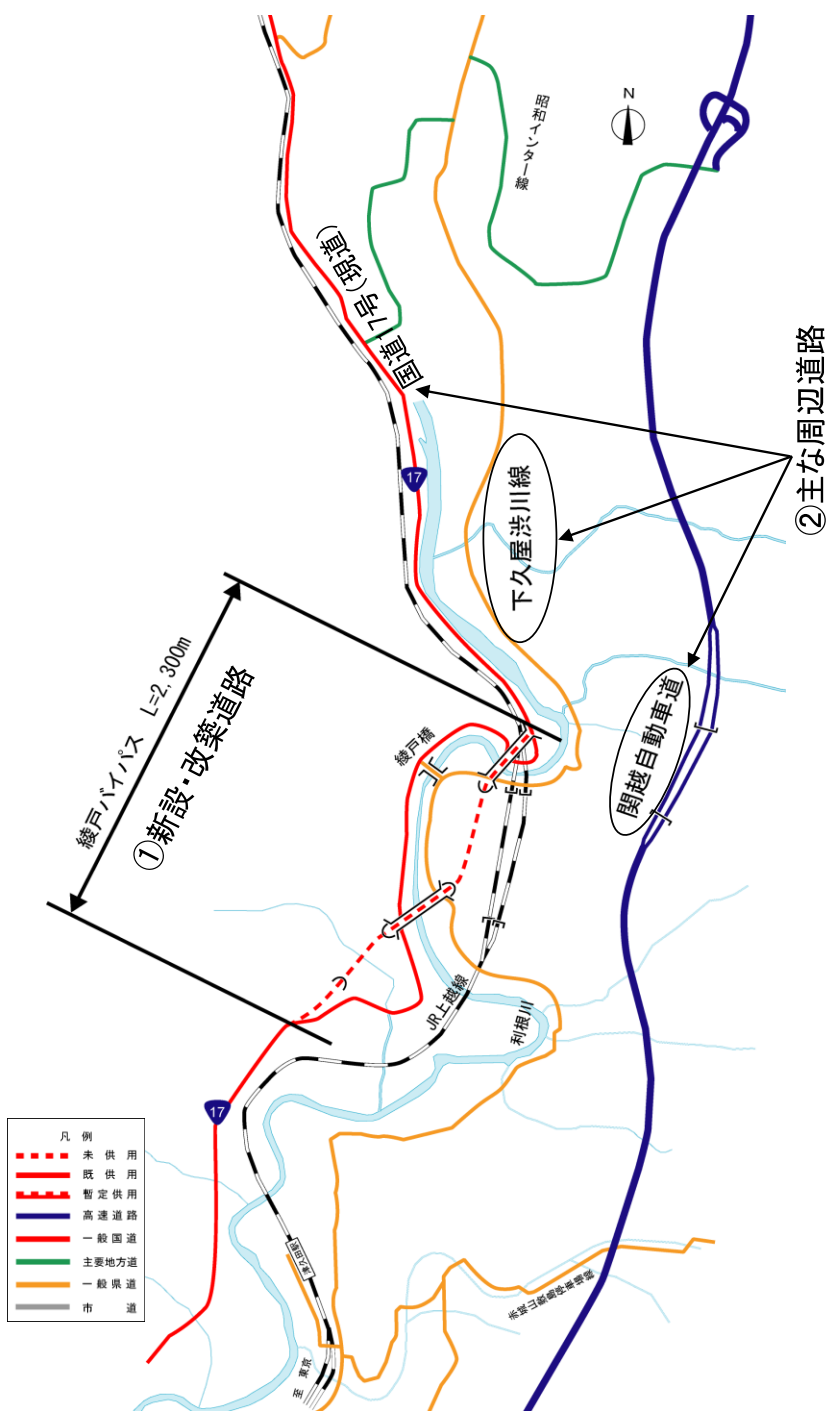

算出の条件

様式-3②

事業名：綾戸バイパス

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成22年度
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>
	採用理由を記載	
その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input checked="" type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	(4.2) %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	(2) 日
			並行する関越自動車道昭和IC～赤城IC過去10年間の濃霧・降雪による通行止履歴より年間平均2日とした	
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

様式-4

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
箇所名: 綾戸バイパス (事業全体)				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.29	2.3	0.66	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-31年目	H 4	2.0258	103.4	0.19	0.34		
-30年目	H 5	1.9479	103.7	0.48	0.83		
-29年目	H 6	1.8730	103.6	0.29	0.48		
-28年目	H 7	1.8009	103.0	0.29	0.46		
-27年目	H 8	1.7317	102.4	0.10	0.15		
-26年目	H 9	1.6651	103.4	0.10	0.14		
-25年目	H 10	1.6010	102.8	0.10	0.14		
-24年目	H 11	1.5395	101.3	0.19	0.26		
-23年目	H 12	1.4802	99.7	0.10	0.13		
-22年目	H 13	1.4233	98.4	0.10	0.13		
-21年目	H 14	1.3686	96.6	0.33	0.43		
-20年目	H 15	1.3159	95.4	0.80	1.01		
-19年目	H 16	1.2653	94.4	0.57	0.70		
-18年目	H 17	1.2167	93.2	0.90	1.07		
-17年目	H 18	1.1699	92.5	1.01	1.17		
-16年目	H 19	1.1249	91.7	1.30	1.46		
-15年目	H 20	1.0816	91.3	2.53	2.74		
-14年目	H 21	1.0400	91.3	0.95	0.99		
-13年目	H 22	1.0000	91.3	1.23	1.23		
-12年目	H 23	0.9615	91.3	0.85	0.82		
-11年目	H 24	0.9246	91.3	0.10	0.09		
-10年目	H 25	0.8890	91.3	0.33	0.30		
-9年目	H 26	0.8548	91.3	0.27	0.23		
-8年目	H 27	0.8219	91.3	3.33	2.74		
-7年目	H 28	0.7903	91.3	3.19	2.52		
-6年目	H 29	0.7599	91.3	5.10	3.88		
-5年目	H 30	0.7307	91.3	6.67	4.87		
-4年目	H 31	0.7026	91.3	10.48	7.36		
-3年目	H 32	0.6756	91.3	11.43	7.72		
-2年目	H 33	0.6496	91.3	28.57	18.56		
-1年目	H 34	0.6246	91.3	14.44	9.02		
供用開始年次	H 35	0.6006	91.3	0.00	0.00	0.31	0.19
1年目	H 36	0.5775	91.3	0.00	0.00	0.31	0.18
2年目	H 37	0.5553	91.3	4.76	2.64	0.31	0.17
3年目	H 38	0.5339	91.3	13.26	7.08	0.31	0.17
4年目	H 39	0.5134	91.3	21.10	10.83	0.31	0.16
5年目	H 40	0.4936	91.3	9.20	4.54	0.31	0.16
6年目	H 41	0.4746	91.3	5.29	2.51	0.31	0.15
7年目	H 42	0.4564	91.3			0.63	0.29
8年目	H 43	0.4388	91.3			0.63	0.28
9年目	H 44	0.4220	91.3			0.63	0.27
10年目	H 45	0.4057	91.3			0.63	0.26
11年目	H 46	0.3901	91.3			0.63	0.25
12年目	H 47	0.3751	91.3			0.63	0.24
13年目	H 48	0.3607	91.3			0.63	0.23
14年目	H 49	0.3468	91.3			0.63	0.22
15年目	H 50	0.3335	91.3			0.63	0.21
16年目	H 51	0.3207	91.3			0.63	0.20
17年目	H 52	0.3083	91.3			0.63	0.19
18年目	H 53	0.2965	91.3			0.63	0.19
19年目	H 54	0.2851	91.3			0.63	0.18
20年目	H 55	0.2741	91.3			0.63	0.17
21年目	H 56	0.2636	91.3			0.63	0.17
22年目	H 57	0.2534	91.3			0.63	0.16
23年目	H 58	0.2437	91.3			0.63	0.15
24年目	H 59	0.2343	91.3			0.63	0.15
25年目	H 60	0.2253	91.3			0.63	0.14
26年目	H 61	0.2166	91.3			0.63	0.14
27年目	H 62	0.2083	91.3			0.63	0.13
28年目	H 63	0.2003	91.3			0.63	0.13
29年目	H 64	0.1926	91.3			0.63	0.12
30年目	H 65	0.1852	91.3			0.63	0.12
31年目	H 66	0.1780	91.3			0.63	0.11
32年目	H 67	0.1712	91.3			0.63	0.11
33年目	H 68	0.1646	91.3			0.63	0.10
34年目	H 69	0.1583	91.3			0.63	0.10
35年目	H 70	0.1522	91.3			0.63	0.10
36年目	H 71	0.1463	91.3			0.63	0.09
37年目	H 72	0.1407	91.3			0.63	0.09
38年目	H 73	0.1353	91.3			0.63	0.09
39年目	H 74	0.1301	91.3			0.63	0.08
40年目	H 75	0.1251	91.3			0.63	0.08
41年目	H 76	0.1203	91.3			0.63	0.08
42年目	H 77	0.1157	91.3			0.63	0.07
43年目	H 78	0.1112	91.3			0.63	0.07
44年目	H 79	0.1069	91.3			0.63	0.07
45年目	H 80	0.1028	91.3			0.63	0.06
46年目	H 81	0.0989	91.3			0.63	0.06
47年目	H 82	0.0951	91.3			0.63	0.06
48年目	H 83	0.0914	91.3			0.63	0.06
49年目	H 84	0.0879	91.3	-7.41	-0.65	0.63	0.06
合計				142.50	98.90	29.23	7.26
単純事業費計				149.91		29.23	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

様式-4

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
箇所名：綾戸バイパス（残事業）				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.29	2.3	0.66	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-31年目	H 4	2.0258	103.4				
-30年目	H 5	1.9479	103.7				
-29年目	H 6	1.8730	103.6				
-28年目	H 7	1.8009	103.0				
-27年目	H 8	1.7317	102.4				
-26年目	H 9	1.6651	103.4				
-25年目	H 10	1.6010	102.8				
-24年目	H 11	1.5395	101.3				
-23年目	H 12	1.4802	99.7				
-22年目	H 13	1.4233	98.4				
-21年目	H 14	1.3686	96.6				
-20年目	H 15	1.3159	95.4				
-19年目	H 16	1.2653	94.4				
-18年目	H 17	1.2167	93.2				
-17年目	H 18	1.1699	92.5				
-16年目	H 19	1.1249	91.7				
-15年目	H 20	1.0816	91.3				
-14年目	H 21	1.0400	91.3				
-13年目	H 22	1.0000	91.3				
-12年目	H 23	0.9615	91.3	0.85	0.82		
-11年目	H 24	0.9246	91.3	0.10	0.09		
-10年目	H 25	0.8890	91.3	0.33	0.30		
-9年目	H 26	0.8548	91.3	0.27	0.23		
-8年目	H 27	0.8219	91.3	3.33	2.74		
-7年目	H 28	0.7903	91.3	3.19	2.52		
-6年目	H 29	0.7599	91.3	5.10	3.88		
-5年目	H 30	0.7307	91.3	6.67	4.87		
-4年目	H 31	0.7026	91.3	10.48	7.36		
-3年目	H 32	0.6756	91.3	11.43	7.72		
-2年目	H 33	0.6496	91.3	28.57	18.56		
-1年目	H 34	0.6246	91.3	14.44	9.02		
供用開始年次	H 35	0.6006	91.3	0.00	0.00	0.31	0.19
1年目	H 36	0.5775	91.3	0.00	0.00	0.31	0.18
2年目	H 37	0.5553	91.3	4.76	2.64	0.31	0.17
3年目	H 38	0.5339	91.3	13.26	7.08	0.31	0.17
4年目	H 39	0.5134	91.3	21.10	10.83	0.31	0.16
5年目	H 40	0.4936	91.3	9.20	4.54	0.31	0.16
6年目	H 41	0.4746	91.3	5.29	2.51	0.31	0.15
7年目	H 42	0.4564	91.3			0.63	0.29
8年目	H 43	0.4388	91.3			0.63	0.28
9年目	H 44	0.4220	91.3			0.63	0.27
10年目	H 45	0.4057	91.3			0.63	0.26
11年目	H 46	0.3901	91.3			0.63	0.25
12年目	H 47	0.3751	91.3			0.63	0.24
13年目	H 48	0.3607	91.3			0.63	0.23
14年目	H 49	0.3468	91.3			0.63	0.22
15年目	H 50	0.3335	91.3			0.63	0.21
16年目	H 51	0.3207	91.3			0.63	0.20
17年目	H 52	0.3083	91.3			0.63	0.19
18年目	H 53	0.2965	91.3			0.63	0.19
19年目	H 54	0.2851	91.3			0.63	0.18
20年目	H 55	0.2741	91.3			0.63	0.17
21年目	H 56	0.2636	91.3			0.63	0.17
22年目	H 57	0.2534	91.3			0.63	0.16
23年目	H 58	0.2437	91.3			0.63	0.15
24年目	H 59	0.2343	91.3			0.63	0.15
25年目	H 60	0.2253	91.3			0.63	0.14
26年目	H 61	0.2166	91.3			0.63	0.14
27年目	H 62	0.2083	91.3			0.63	0.13
28年目	H 63	0.2003	91.3			0.63	0.13
29年目	H 64	0.1926	91.3			0.63	0.12
30年目	H 65	0.1852	91.3			0.63	0.12
31年目	H 66	0.1780	91.3			0.63	0.11
32年目	H 67	0.1712	91.3			0.63	0.11
33年目	H 68	0.1646	91.3			0.63	0.10
34年目	H 69	0.1583	91.3			0.63	0.10
35年目	H 70	0.1522	91.3			0.63	0.10
36年目	H 71	0.1463	91.3			0.63	0.09
37年目	H 72	0.1407	91.3			0.63	0.09
38年目	H 73	0.1353	91.3			0.63	0.09
39年目	H 74	0.1301	91.3			0.63	0.08
40年目	H 75	0.1251	91.3			0.63	0.08
41年目	H 76	0.1203	91.3			0.63	0.08
42年目	H 77	0.1157	91.3			0.63	0.07
43年目	H 78	0.1112	91.3			0.63	0.07
44年目	H 79	0.1069	91.3			0.63	0.07
45年目	H 80	0.1028	91.3			0.63	0.06
46年目	H 81	0.0989	91.3			0.63	0.06
47年目	H 82	0.0951	91.3			0.63	0.06
48年目	H 83	0.0914	91.3			0.63	0.06
49年目	H 84	0.0879	91.3	-7.21	-0.63	0.63	0.06
合計				131.14	85.07	29.23	7.26
単純事業費計				138.35		29.23	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

