

再評価結果（平成25年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：三浦 真紀

事業名	地域高規格道路 名豊道路 一般国道23号 岡崎バイパス	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 中部地方整備局
起終点	自：愛知県額田郡幸田町芦谷 至：愛知県西尾市南中根町			延長	14.6km
事業概要					
<p>一般国道23号は、愛知県豊橋市を起点とし、名古屋市及び三重県津市などの主要都市を経て三重県伊勢市に至る、延長約177kmの幹線道路です。</p> <p>本事業の一般国道23号岡崎バイパスは、愛知県額田郡幸田町芦谷から愛知県西尾市南中根町に至る延長14.6kmのバイパスであり、交通渋滞の緩和、物流効率化の支援、災害に強い道路機能の確保を主な目的として事業を推進しています。</p>					
S55年度事業化		S50年度都市計画決定		S55年度用地着手	
S62年度事業化		S51年度都市計画決定		S61年度工事着手	
全体事業費		1,040億円		事業進捗率 68%	
計画交通量		53,000台/日			
費用対効果 分析結果	B/C (事業全体)	総費用 (事業費/維持管理費)		総便益 (走行時間短縮/走行経費減少/交通事故減少)	
	6.6	325/1,580億円		1,964/10,387億円	
	(残事業)	6.0		270/1,455億円 55/125億円	
<p>感度分析の結果</p> <p>(事業全体) 交通量 : B/C=5.9~7.2 (交通量 ±10%) 事業費 : B/C=6.0~7.2 (事業費 ±10%) 事業期間 : B/C=5.3~7.9 (事業期間±20%)</p> <p>(残事業) 交通量 : B/C=5.4~6.6 (交通量 ±10%) 事業費 : B/C=5.6~6.6 (事業費 ±10%) 事業期間 : B/C=5.6~6.4 (事業期間±20%)</p>					
事業の効果等					
<p>①円滑なモビリティの確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 ・現道等の旅行速度の改善が期待される。 ・利便性の向上が期待できるバス路線（名鉄バス）が存在する。 ・空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 <p>②物流効率化の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三河港へのアクセス向上が見込まれる。 <p>③都市の再生</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携がある。 <p>④国土・地域ネットワークの構築</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域高規格道路の位置づけがある。 <p>⑤個性ある地域の形成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・拠点開発プロジェクトを支援する。 ・主要な観光地（ラグーナ蒲郡）へのアクセス向上が期待される。 <p>⑥安全で安心できるくらしの確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三次医療施設（安城更生病院）へのアクセス向上が見込まれる。 <p>⑦災害への備え</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 ・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 <p>⑧地球環境の保全</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CO2排出量の削減が見込まれる。 <p>⑨生活環境の改善・保全</p> <ul style="list-style-type: none"> ・NO2排出量の削減が見込まれる。 ・SPM排出量の削減が見込まれる。 					
関係する地方公共団体等の意見					
地域から頂いた主な意見等：					

- 10市1町で構成される名豊道路建設推進協議会が未開通区間の早期完了、交通混雑区間の4車線化を要望。
愛知県知事の意見：
- 1 「対応方針（原案）」案に対して、異議はありません。
 - 2 名豊道路を構成する岡崎バイパスは、三河港等の重要港湾と自動車産業の集積地を結ぶ物流の軸であるとともに、災害時には緊急輸送道路としての役割を果たす重要な幹線道路であるため、早期に全線4車線整備を図っていただきたい。
 - 3 なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。

事業評価監視委員会の意見
「事業継続」することは「妥当」である。

- 事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
- ・岡崎バイパスの暫定2車線供用区間、岡崎バイパスに並行する国道1号では、渋滞損失時間が愛知県平均を大きく超える区間が多数存在し、交通渋滞が著しい状況である。
 - ・愛知県は、日本を代表する製造業、とりわけ自動車産業の一大集積地で、岡崎バイパス沿線の2市1町では、愛知県の約4%の人口集積に対して、輸送機械製造品出荷額は愛知県の約14%を占めるなど、多くの自動車関連工場が集積している。
 - ・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。

- 事業の進捗状況、残事業の内容等
- ・事業進捗率は68%。用地取得率は100%。（平成23年度末）
 - ・全線14.6kmのうち、全線を暫定供用済み。


- 事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
- ・藤井IC～安城西尾IC間（L=1.5km）は、平成24年度の完成4車線供用を予定。
 - ・西尾東IC～藤井IC（L=4.0km）は、平成27年度の完成4車線供用を予定。

- 施設の構造や工法の変更等
- ・防錆処理法を見直すことにより、約0.3億円のコスト縮減。
 - ・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

- 対応方針決定の理由
- ・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

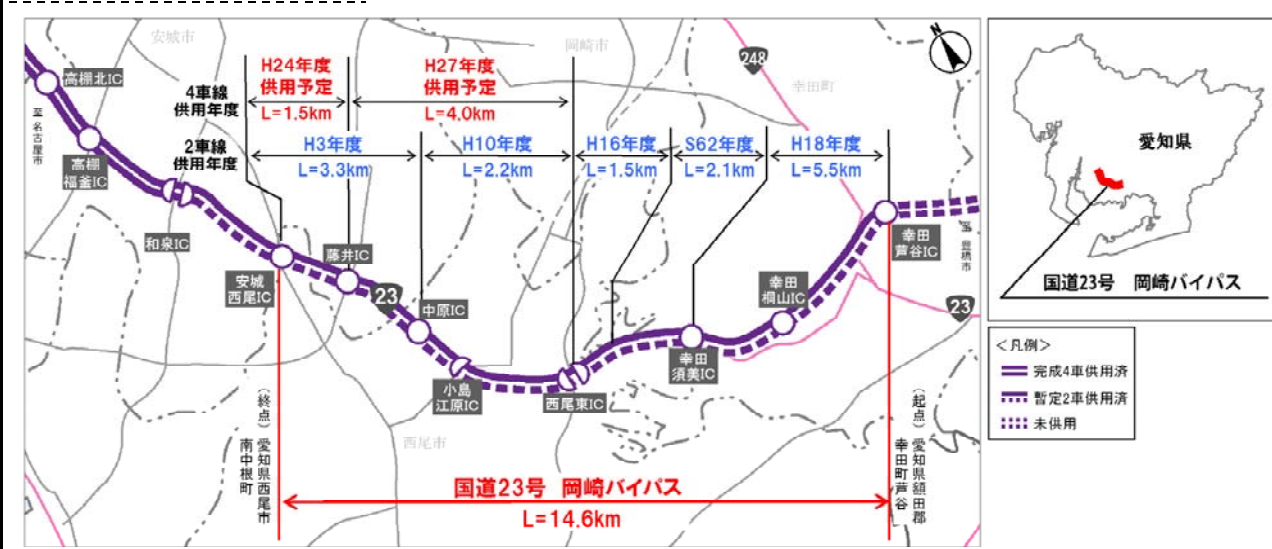

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
 ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
