

再評価結果（平成25年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・防災課

担当課長名：三浦 真紀

事業名 地域高規格道路 琵琶湖西縦貫道路 一般国道161号 小松拡幅	事業区分 一般国道	事業主体 国土交通省 近畿地方整備局
起終点 自：滋賀県高島市勝野 至：滋賀県大津市北小松		延長 6.5km
事業概要 一般国道161号は福井県敦賀市を起点とし、滋賀県湖西地域を経て滋賀県大津市に至る延長約110kmの幹線道路である。 小松拡幅は、交通混雑の緩和と交通安全の確保、沿道騒音の改善、地域の活性化等を目的に計画された道路である。		
S45年度事業化	S50年度都市計画決定 (大津市域) S51年度都市計画決定 (高島市域)	S45年度用地着手
		S47年度工事着手
全体事業費 190億円		事業進捗率 約24%
計画交通量 22,500台/日		供用済延長 2.0km
費用対効果分析結果	B/C (事業全体) 1.9 (残事業) 4.0	総費用 (残事業)/(事業全体) 121/292億円 (事業費：101/268億円) (維持管理費：20/23億円)
		総便益 (残事業)/(事業全体) 490/567億円 (走行時間短縮便益：447/517億円) (走行経費減少便益：38/44億円) (交通事故減少便益：4.7/5.8億円)
感度分析の結果 (事業全体) 交通量：B/C=1.5~2.4(交通量 ±10%) (残事業) 交通量：B/C=3.2~5.0(交通量 ±10%) 事業費：B/C=1.9~2.0(事業費 ±10%) 事業費：B/C=3.7~4.4(事業費 ±10%) 事業期間：B/C=1.8~2.1(事業期間 ±20%) 事業期間：B/C=3.9~4.1(事業期間 ±20%)		
事業の効果等		
①交通混雑の緩和 ・一般国道161号の小松拡幅整備区間では約2万台/日の交通量があり、交通容量を超過していることから混雑が発生しているが、整備により交通混雑の緩和が期待される。		
②交通安全の確保 ・未整備区間の事故率が高く、また歩道が未整備の区間もあり住民とトラックの死亡事故が発生しているが、整備により交通混雑が緩和され、事故の減少も期待される。		
③沿道騒音の改善 ・小松拡幅整備区間では、騒音レベルが環境基準を超過しているが、整備により現道の騒音が低減するなど、沿道環境の改善が期待される。		
④地域の活性化 ・大津・湖西地域の観光入り込み客数は、年間約1,500万人にのぼり、小松拡幅をはじめとする国道161号の整備により、地域の活性化が期待される。		
⑤主要な観光地へのアクセス向上 ・沿線へのアクセス性向上により、観光客の増加が見込まれる。 (マキノ高原・さらさ：H22観光客入込数446千人/年)		
⑥高度医療施設へのアクセス向上 ・高島市～大津赤十字病院の所要時間が短縮。(67分→63分)		
関係する地方公共団体等の意見		
地域から頂いた主な意見等： ・平成23年7月、国道161号改良整備促進期成同盟会(S42.12設立、大津市長、高島市長、大津市議会議員、高島市議会議員)より早期整備の要望を受けている。		
滋賀県知事の意見： 照会のありました事業については、対応方針(原案)(案)で【事業継続】とされているとおり、事業効果の早期発現に向けてさらなる整備促進をお願いしたい。 地元も交通混雑、交通事故等の課題解消のため、当該事業の事業推進、早期完成を強く望んでおります。		

す。
このことから、事業推進のための十分な予算の確保に取り組んでいただきたい。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道161号小松拡幅」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切に進められており、対応方針(原案)のとおり「事業継続」でよいと判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

周辺地域では、人口が著しく増加している。また自動車保有台数の伸び率は、全国、近畿、滋賀県の平均をともに上回っている。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに、用地取得は約60%完了、S63年度までに暫定2車線1.0km、4車線1.0kmを供用済みであり、今後、残る区間の事業進捗を図る。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の採活用等により、コスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

再評価結果(平成25年度事業継続箇所)


担当課：道路局 国道・防災課

担当課長名：三浦 真紀

事業名：地域高規格道路 琵琶湖西縦貫道路 一般国道161号 小松拡幅	事業区分：一般国道	事業主体：国土交通省 近畿地方整備局
起終点：自：滋賀県高島市勝野 至：滋賀県大津市北小松	延長：6.5km	

事業概要図

【位置図】

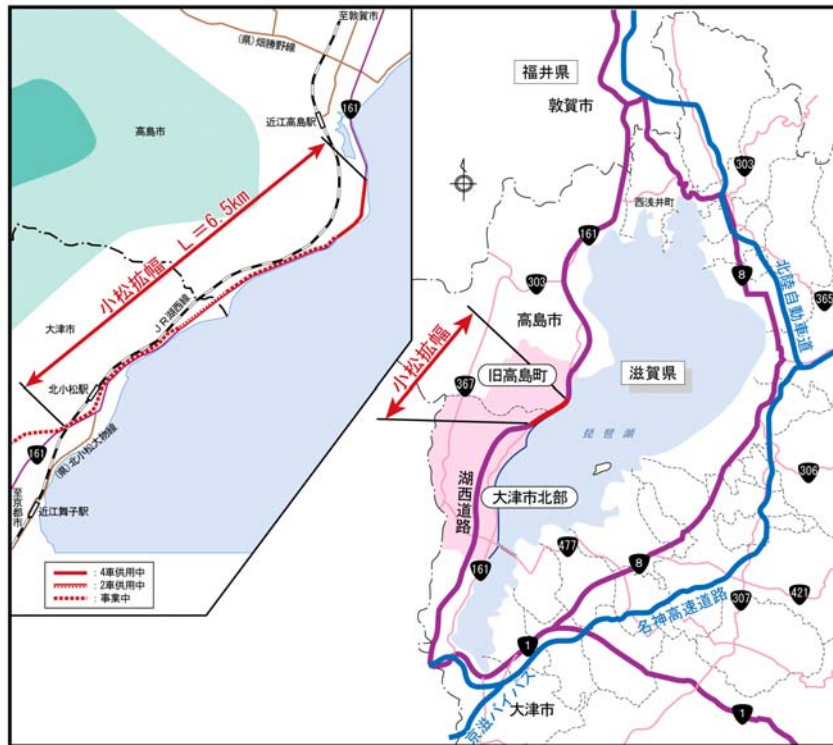

【概要図】

