

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道8号 滑川富山バイパス
事業主体	北陸地方整備局

●事業の効果や必要性の評価に対応する事後評価項目

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	事業区間の損失時間削減率：約7.5%（約75.8万人時間/年） 整備なし 約1004.5万人時間/年 → 整備あり 約928.7万人時間/年
		● 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	事業区間の旅行速度が改善：約23km/h向上 整備前（H17センサス、混雑時）22.8km/h → 整備後（H26プローブデータ）45.7km/h
		○ 現道又は並行区間等における踏切道の除去もしくは交通改善の状況	
		○ 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	
		● 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	北陸新幹線 富山駅
		○ 拠点空港（会社管理空港、国管理空港、特定地方管理空港）、地方管理空港もしくはその他の空港・共用空港へのアクセス向上の状況	
	物流効率化の支援	● 重要港湾もしくは国際拠点港湾へのアクセス向上の状況	伏木富山港（重要港湾）へのアクセス利便性が向上：約11.8分短縮 整備前（H17センサス）25.8分 → 整備後（H26プローブデータ）14.0分
		○ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
	都市の再生	○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
		○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成（又は一部形成）されたことによる効果	
		○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
		○ 中心市街地内で行われたことによる効果	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上			
□ 対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となった			

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠	
1. 活力	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり <input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり <input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合） <input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する <input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間が解消 <input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消 <input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	滑川市から富山市へのアクセス性が向上したことにより通勤圏が拡大し、滑川市の人口増加都市の住みやすさの評価が上昇
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況 <input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果 <input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上による効果 <input checked="" type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果	二次交通の利便性が向上し、北陸新幹線開業効果の波及や地域活性化に貢献
	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	富山市郊外から救急医療施設（富山市民病院）への搬送時間が短縮し、救命率が向上：約8.5分短縮 整備前（H17センサス）36.7分 → 整備後（H26プローブデータ）28.2分

政策目標	指標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
3. 安全	<p>安全な生活環境の確保</p> <p>□ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる</p> <p>当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される</p> <p>災害への備え</p> <p>□ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消</p> <p>対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり</p> <p>□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成</p> <p>□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能（A'路線として位置づけがある場合）</p> <p>□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消</p> <p>□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消</p>	<p>富山県の地域防災計画において、第1次緊急通行確保路線として位置づけあり</p>
4. 環境	<p>地球環境の保全</p> <p>◆ 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量</p> <p>生活環境の改善・保全</p> <p>◆ 現道等における自動車からのNO2排出削減率</p> <p>◆ 現道等における自動車からのSPM排出削減率</p> <p>◇ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況</p> <p>○ その他、環境や景観上の効果</p>	<p>(推計結果) 対象区間：費用便益算出エリア CO₂排出削減量：0.1万t-CO₂/年(整備前72.9万t-CO₂/年 → 整備後72.7万t-CO₂/年)</p> <p>(推計結果) 対象区間：費用便益算出エリア NO₂排出削減量：5.8t-NO₂/年(整備前1,487.4t-NO₂/年 → 整備後1,481.6t-NO₂/年)</p> <p>(推計結果) 対象区間：費用便益算出エリア SPM排出削減量：0.2t-SPM/年(整備前72.2t-SPM/年 → 整備後72.0t-SPM/年)</p>
5. その他	<p>他のプロジェクトとの関係</p> <p>□ 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果</p> <p>□ 他機関との連携プログラムに関する効果</p> <p>その他</p> <p>□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果</p>	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道8号	滑川富山バイパス	L=4.9Km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
28,200~39,200	4	北陸地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成27年度		
単純合計	24億円	43億円	67億円
基準年における 現在価値(C)	30億円	23億円	52億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成27年度			
供用年	平成23年度			
単年便益 (初年便益)	23億円	0.10億円	1.0億円	24億円
基準年における 現在価値(B)	523億円	7.8億円	23億円	555億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	10.6
経済的純現在価値(事業全体)	502億円
経済的内部収益率(事業全体)	46.1%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

様式-3①

事業名:一般国道8号 滑川富山バイパス

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [一般国道8号 滑川 富山BP] :4.9km	交通量 ^{※1}	[台/日]	19,800	35,600	
	走行時間 ^{※2}	[分]	7.90	5.69	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	29.3	37.14	
②主な周 辺道路 ^{※4}	A[(一)富 山滑川魚 津線] :4.9km	交通量	[台/日]	15,500	9,800
		走行時間	[分]	9.77	7.63
		走行時間費用	[億円/年]	27.3	13.61
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計: 1,065.3km	走行時間費用	[億円/年]	2,114.11	2,100.05	

			整備なし(A)	整備あり(B)	削減量 (A - B)
合計:1,075.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2,170.72	2,150.80	19.92


※1: 推計した所用時間と基準速度で走行した場合の所用時間との差。

※2: 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3: 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4: 当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。

事業名:一般国道8号 滑川富山バイパス

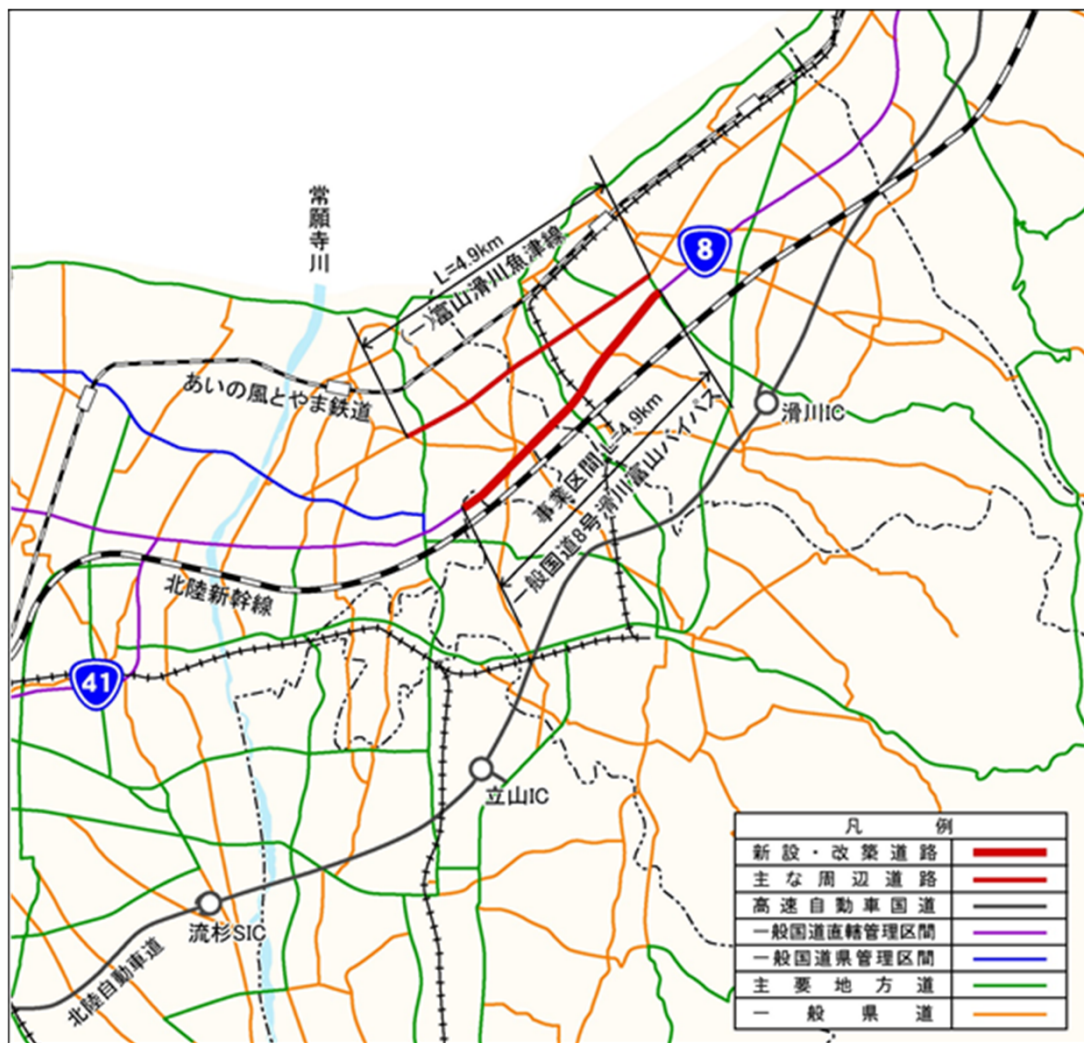

算出の条件

事業名: 一般国道8号 滑川富山バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	H27年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17年センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
	その他()	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通容量未滿・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	()%
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	
		とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 降雪が最初に観測された日から最後に観測された日までの日数を考慮	(106)日
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 降雪が最初に観測された日から最後に観測された日までの冬期日数(106日)及び降雪日数(43日)を考慮	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道8号 滑川富山バイパス

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.19	4.9	0.93

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-4年目	H 19	1.3686	97.6	5.9	7.5	0.0	0.0
-3年目	H 20	1.3159	96.8	7.4	9.1	0.0	0.0
-2年目	H 21	1.2653	95.6	8.7	10.5	0.0	0.0
-1年目	H 22	1.2167	93.7	2.1	2.5	0.0	0.0
供用開始年次	H 23	1.1699	92.1	0.0	0.0	0.9	1.0
1年目	H 24	1.1249	91.3	0.0	0.0	0.9	1.0
2年目	H 25	1.0816	91.1	0.0	0.0	0.9	0.9
3年目	H 26	1.0400	91.1	0.0	0.0	0.9	0.9
4年目	H 27	1.0000	91.1	0.0	0.0	0.9	0.9
5年目	H 28	0.9615	91.1	0.0	0.0	0.9	0.8
6年目	H 29	0.9246	91.1	0.0	0.0	0.9	0.8
7年目	H 30	0.8890	91.1	0.0	0.0	0.9	0.8
8年目	H 31	0.8548	91.1	0.0	0.0	0.9	0.7
9年目	H 32	0.8219	91.1	0.0	0.0	0.9	0.7
10年目	H 33	0.7903	91.1	0.0	0.0	0.9	0.7
11年目	H 34	0.7599	91.1	0.0	0.0	0.9	0.7
12年目	H 35	0.7307	91.1	0.0	0.0	0.9	0.6
13年目	H 36	0.7026	91.1	0.0	0.0	0.9	0.6
14年目	H 37	0.6756	91.1	0.0	0.0	0.9	0.6
15年目	H 38	0.6496	91.1	0.0	0.0	0.9	0.6
16年目	H 39	0.6246	91.1	0.0	0.0	0.9	0.5
17年目	H 40	0.6006	91.1	0.0	0.0	0.9	0.5
18年目	H 41	0.5775	91.1	0.0	0.0	0.9	0.5
19年目	H 42	0.5553	91.1	0.0	0.0	0.9	0.5
20年目	H 43	0.5339	91.1	0.0	0.0	0.9	0.5
21年目	H 44	0.5134	91.1	0.0	0.0	0.9	0.4
22年目	H 45	0.4936	91.1	0.0	0.0	0.9	0.4
23年目	H 46	0.4746	91.1	0.0	0.0	0.9	0.4
24年目	H 47	0.4564	91.1	0.0	0.0	0.9	0.4
25年目	H 48	0.4388	91.1	0.0	0.0	0.9	0.4
26年目	H 49	0.4220	91.1	0.0	0.0	0.9	0.4
27年目	H 50	0.4057	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
28年目	H 51	0.3901	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
29年目	H 52	0.3751	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
30年目	H 53	0.3607	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
31年目	H 54	0.3468	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
32年目	H 55	0.3335	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
33年目	H 56	0.3207	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
34年目	H 57	0.3083	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
35年目	H 58	0.2965	91.1	0.0	0.0	0.9	0.3
36年目	H 59	0.2851	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
37年目	H 60	0.2741	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
38年目	H 61	0.2636	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
39年目	H 62	0.2534	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
40年目	H 63	0.2437	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
41年目	H 64	0.2343	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
42年目	H 65	0.2253	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
43年目	H 66	0.2166	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
44年目	H 67	0.2083	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
45年目	H 68	0.2003	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
46年目	H 69	0.1926	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
47年目	H 70	0.1852	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
48年目	H 71	0.1780	91.1	0.0	0.0	0.9	0.2
49年目	H 72	0.1712	91.1	0.0	#REF!	0.9	0.1
合計				24.1	#REF!	43.1	22.5

単純事業費計	24.1	43.1
--------	------	------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道8号 滑川富山バイパス

年度 (基準年) H27	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレート	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)				
	乗用車	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	-	① 計	現在価値 (1)×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	-	② 計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)~(3)	割引率4%	
	年次	乗用車	小型貨物	普通貨物	全車	(A)																	
供用開始年次	H 23	0.99469	0.98273	0.97572	0.99051	1.1699	92.1000	18.7	3.5	0.5	0.0	22.7	26.3	1.5	0.2	-1.6	0.0	0.1	0.1	1.0	1.2	23.8	27.6
1年目	H 24	0.99466	0.98243	0.97511	0.99042	1.1249	91.3000	18.6	3.5	0.5	0.0	22.5	25.3	1.5	0.2	-1.6	0.0	0.1	0.1	1.0	1.1	23.7	26.6
2年目	H 25	0.99463	0.98212	0.97448	0.99033	1.0816	91.1000	18.5	3.4	0.4	0.0	22.3	24.2	1.5	0.2	-1.5	0.0	0.2	0.2	1.0	1.1	23.5	25.4
3年目	H 26	0.99460	0.98179	0.97381	0.99023	1.0400	91.1000	18.4	3.4	0.4	0.0	22.2	23.1	1.5	0.2	-1.5	0.0	0.2	0.2	1.0	1.0	23.4	24.3
4年目	H 27	0.99457	0.98145	0.97310	0.99014	1.0000	91.1000	18.3	3.3	0.4	0.0	22.0	22.0	1.4	0.2	-1.4	0.0	0.2	0.2	1.0	1.0	23.2	23.2
5年目	H 28	0.99454	0.98110	0.97236	0.99004	0.9615	91.1000	18.2	3.2	0.4	0.0	21.8	21.0	1.4	0.2	-1.4	0.0	0.2	0.2	1.0	0.9	23.0	22.2
6年目	H 29	0.99451	0.98074	0.97157	0.98994	0.9246	91.1000	18.1	3.2	0.4	0.0	21.7	20.0	1.4	0.2	-1.4	0.0	0.3	0.2	1.0	0.9	22.9	21.2
7年目	H 30	0.99448	0.98036	0.97074	0.98984	0.8890	91.1000	18.0	3.1	0.4	0.0	21.5	19.1	1.4	0.2	-1.3	0.0	0.3	0.3	1.0	0.9	22.7	20.2
8年目	H 31	0.99445	0.97997	0.96986	0.98973	0.8548	91.1000	17.9	3.0	0.4	0.0	21.3	18.2	1.4	0.2	-1.3	0.0	0.3	0.3	1.0	0.8	22.6	19.3
9年目	H 32	0.99588	0.98583	0.98106	0.99285	0.8219	91.1000	17.8	3.0	0.4	0.0	21.1	17.4	1.4	0.2	-1.3	0.0	0.3	0.3	0.9	0.8	22.4	18.4
10年目	H 33	0.99586	0.98563	0.98070	0.99280	0.7903	91.1000	17.7	2.9	0.4	0.0	21.0	16.6	1.4	0.2	-1.2	0.0	0.4	0.3	0.9	0.7	22.3	17.6
11年目	H 34	0.99585	0.98542	0.98032	0.99275	0.7599	91.1000	17.6	2.9	0.4	0.0	20.9	15.9	1.4	0.2	-1.2	0.0	0.4	0.3	0.9	0.7	22.2	16.9
12年目	H 35	0.99583	0.98520	0.97992	0.99270	0.7307	91.1000	17.6	2.9	0.3	0.0	20.8	15.2	1.4	0.2	-1.2	0.0	0.4	0.3	0.9	0.7	22.1	16.1
13年目	H 36	0.99581	0.98498	0.97951	0.99264	0.7026	91.1000	17.5	2.8	0.3	0.0	20.7	14.5	1.4	0.2	-1.2	0.0	0.4	0.3	0.9	0.6	22.0	15.4
14年目	H 37	0.99579	0.98475	0.97908	0.99259	0.6756	91.1000	17.4	2.8	0.3	0.0	20.5	13.9	1.4	0.2	-1.1	0.0	0.4	0.3	0.9	0.6	21.9	14.8
15年目	H 38	0.99578	0.98452	0.97864	0.99253	0.6496	91.1000	17.3	2.7	0.3	0.0	20.4	13.3	1.4	0.2	-1.1	0.0	0.4	0.3	0.9	0.6	21.7	14.1
16年目	H 39	0.99576	0.98427	0.97817	0.99248	0.6246	91.1000	17.3	2.7	0.3	0.0	20.3	12.7	1.4	0.2	-1.1	0.0	0.4	0.3	0.9	0.6	21.6	13.5
17年目	H 40	0.99574	0.98402	0.97768	0.99242	0.6006	91.1000	17.2	2.6	0.3	0.0	20.2	12.1	1.4	0.2	-1.1	0.0	0.5	0.3	0.9	0.5	21.5	12.9
18年目	H 41	0.99572	0.98376	0.97717	0.99236	0.5775	91.1000	17.1	2.6	0.3	0.0	20.0	11.6	1.4	0.2	-1.0	0.0	0.5	0.3	0.9	0.5	21.4	12.4
19年目	H 42	0.99077	0.99335	1.00200	0.99205	0.5553	91.1000	17.1	2.6	0.3	0.0	19.9	11.1	1.3	0.2	-1.0	0.0	0.5	0.3	0.9	0.5	21.3	11.8
20年目	H 43	0.99069	0.99330	1.00200	0.99199	0.5339	91.1000	16.9	2.5	0.3	0.0	19.7	10.5	1.3	0.2	-1.0	0.0	0.5	0.3	0.9	0.5	21.1	11.3
21年目	H 44	0.99060	0.99326	1.00200	0.99193	0.5134	91.1000	16.7	2.5	0.3	0.0	19.6	10.0	1.3	0.2	-1.0	0.0	0.5	0.2	0.9	0.4	20.9	10.7
22年目	H 45	0.99051	0.99321	1.00199	0.99186	0.4936	91.1000	16.6	2.5	0.3	0.0	19.4	9.6	1.3	0.2	-1.0	0.0	0.4	0.2	0.9	0.4	20.7	10.2
23年目	H 46	0.99042	0.99316	1.00199	0.99179	0.4746	91.1000	16.4	2.5	0.3	0.0	19.2	9.1	1.3	0.2	-1.0	0.0	0.4	0.2	0.9	0.4	20.5	9.7
24年目	H 47	0.99033	0.99312	1.00198	0.99173	0.4564	91.1000	16.3	2.5	0.3	0.0	19.0	8.7	1.3	0.2	-1.0	0.0	0.4	0.2	0.8	0.4	20.3	9.3
25年目	H 48	0.99023	0.99307	1.00198	0.99166	0.4388	91.1000	16.1	2.5	0.3	0.0	18.9	8.3	1.3	0.2	-1.0	0.0	0.4	0.2	0.8	0.4	20.1	8.8
26年目	H 49	0.99014	0.99302	1.00198	0.99159	0.4220	91.1000	16.0	2.4	0.3	0.0	18.7	7.9	1.3	0.2	-1.0	0.0	0.4	0.2	0.8	0.3	19.9	8.4
27年目	H 50	0.99004	0.99297	1.00197	0.99152	0.4057	91.1000	15.8	2.4	0.3	0.0	18.5	7.5	1.2	0.2	-1.0	0.0	0.4	0.2	0.8	0.3	19.7	8.0
28年目	H 51	0.98994	0.99292	1.00197	0.99144	0.3901	91.1000	15.6	2.4	0.3	0.0	18.4	7.2	1.2	0.2	-1.0	0.0	0.4	0.1	0.8	0.3	19.5	7.6
29年目	H 52	0.98984	0.99287	1.00196	0.99137	0.3751	91.1000	15.5	2.4	0.3	0.0	18.2	6.8	1.2	0.2	-1.0	0.0	0.3	0.1	0.8	0.3	19.3	7.2
30年目	H 53	0.98973	0.99282	1.00196	0.99129	0.3607	91.1000	15.3	2.4	0.3	0.0	18.0	6.5	1.2	0.2	-1.0	0.0	0.3	0.1	0.8	0.3	19.1	6.9
31年目	H 54	0.98963	0.99277	1.00196	0.99122	0.3468	91.1000	15.2	2.4	0.3	0.0	17.8	6.2	1.2	0.1	-1.0	0.0	0.3	0.1	0.8	0.3	18.9	6.6
32年目	H 55	0.98952	0.99272	1.00195	0.99114	0.3335	91.1000	15.0	2.3	0.3	0.0	17.7	5.9	1.2	0.1	-1.0	0.0	0.3	0.1	0.8	0.3	18.7	6.2
33年目	H 56	0.98941	0.99266	1.00195	0.99106	0.3207	91.1000	14.9	2.3	0.3	0.0	17.5	5.6	1.2	0.1	-1.0	0.0	0.3	0.1	0.8	0.3	18.5	5.9
34年目	H 57	0.98929	0.99261	1.00194	0.99098	0.3083	91.1000	14.7	2.3	0.3	0.0	17.3	5.3	1.2	0.1	-1.0	0.0	0.3	0.1	0.8	0.2	18.3	5.7
35年目	H 58	0.98918	0.99255	1.00194	0.99090	0.2965	91.1000	14.5	2.3	0.3	0.0	17.1	5.1	1.1	0.1	-1.0	0.0	0.2	0.1	0.8	0.2	18.1	5.4
36年目	H 59	0.98906	0.99250	1.00194	0.99081	0.2851	91.1000	14.4	2.3	0.3	0.0	17.0	4.8	1.1	0.1	-1.0	0.0	0.2	0.1	0.8	0.2	18.0	5.1
37年目	H 60	0.98894	0.99244	1.00193	0.99073	0.2741	91.1000	14.2	2.3	0.3	0.0	16.8	4.6	1.1	0.1	-1.1	0.0	0.2	0.1	0.8	0.2	17.8	4.9
38年目	H 61	0.98881	0.99238	1.00193	0.99064	0.2636	91.1000	14.1	2.2	0.3	0.0	16.6	4.4	1.1	0.1	-1.1	0.0	0.2	0.1	0.7	0.2	17.6	4.6
39年目	H 62	0.98870	0.99233	1.00193	0.99056	0.2534	91.1000	13.9	2.2	0.3	0.0	16.4	4.2	1.1	0.1	-1.1	0.0	0.2	0.0	0.7	0.2	17.4	4.4
40年目	H 63	0.98858	0.99227	1.00192	0.99048	0.2437	91.1000	13.8	2.2	0.3	0.0	16.3	4.0	1.1	0.1	-1.1	0.0	0.2	0.0	0.7	0.2	17.2	4.2
41年目	H 64	0.98847	0.99222	1.00192	0.99040	0.2343	91.1000	13.6	2.2	0.3	0.0	16.1	3.8	1.1	0.1	-1.1	0.0	0.2	0.0	0.7	0.2	17.0	4.0
42年目	H 65	0.98835	0.99216	1.00192	0.99032	0.2253	91.1000	13.4	2.2	0.3	0.0	15.9	3.6	1.1	0.1	-1.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.2	16.8	3.8
43年目	H 66	0.98824	0.99211	1.00191	0.99023	0.2166	91.1000	13.3	2.2	0.3	0.0	15.7	3.4	1.0	0.1	-1.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.2	16.6	3.6
44年目	H 67	0.98812	0.99205	1.00191	0.99015	0.2083	91.1000	13.1	2.1	0.3	0.0	15.6	3.2	1.0	0.1	-1.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.1	16.4	3.4
45年目	H 68	0.98801	0.99200	1.00191	0.99007	0.2003	91.1000	13.0	2.1	0.3	0.0	15.4	3.1	1.0	0.1	-1.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.1	16.2	3.2
46年目	H 69	0.98789	0.99194	1.00190	0.98999	0.1926	91.1000	12.8	2.1	0.3	0.0	15.2	2.9	1.0	0.1								
