

## 再評価結果（平成30年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：村山 一弥

事業名	一般国道41号 <small>いのたににれはら</small> 猪谷榆原道路	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 北陸地方整備局
起終点	自：富山県富山市猪谷 <small>いのたに</small> 至：富山県富山市榆原 <small>にれはら</small>	延長	7.4km		
事業概要	<p>一般国道41号猪谷榆原道路は、地域高規格道路「富山高山連絡道路」の一部を構成し、富山市猪谷～富山市榆原において、災害に強い道路ネットワークの形成、事前通行規制区間の回避、急カーブ・急勾配区間及び冬期交通障害の回避などを目的とした、延長7.4kmのバイパス事業である。</p>				
H9年度事業化	H一年度都市計画決定	H13年度用地着手	H14年度工事着手		
全体事業費	約360億円	事業進捗率	72%	供用済延長	5.8km
地域の防災面の課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国道41号は、「富山県地域防災計画」において第1次緊急通行確保路線に指定されているが、事前通行規制区間があり0.9回/年の通行規制が発生しているほか、並行する県道も事前通行規制が多く、規制時の集落孤立化等が懸念される。</li> <li>・ 国道41号や神通川対岸の県道東猪谷富山線で災害や雨量規制による全面通行止めが発生した場合、事前通行規制区間に囲まれた集落の孤立化が懸念される。</li> <li>・ 飛騨地域は、富山市への買い物利用が多く、都市間相互の結びつきが強い。一方、事業区間は、特別豪雪地帯に指定され、冬期の降雪・積雪により、登坂不能や大型車のスリップ事故による車線閉塞などの冬期交通障害が発生している。</li> </ul>				
課題を踏まえた対策・事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事前通行規制区間等を回避するため、現道のうち4.6km区間を別線整備（橋梁により神通川右岸へのバイパス整備）</li> <li>・ 現道が存在する左岸は、神通川とJR高山線に挟まれているほか、現道両脇には急峻な斜面が連続しており、左岸側で整備する場合は大規模なトンネル整備が必要となることから、一部右岸へのバイパス整備とした。</li> </ul>				
事業の効果等	<ol style="list-style-type: none"> <li>①災害に強い道路ネットワークの形成                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事前通行規制区間を回避するなど、災害に強い道路ネットワークが形成される。</li> </ul> </li> <li>②孤立集落の解消                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通行規制時の迂回路が形成されることで、富山市内でも高齢化が進んでいる集落における孤立化が解消し、安全・安心な暮らしが確保される。</li> </ul> </li> <li>③冬期交通障害の解消                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路線形の改善や堆雪に必要な幅員が確保され、冬期間においても安全で安定した交通機能が確保され、冬期交通障害の解消が期待される。</li> </ul> </li> </ol>		<p style="text-align: center;">費 用 <small>（残事業） / （事業全体）</small></p> <p style="text-align: center;">91 / 455 億円</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">事 業 費： 85 / 430 億円</p> <p style="text-align: center;">維持管理費： 6.5 / 26 億円</p> </div>		
関係する地方公共団体等の意見	<p>地域から頂いた主な意見等： 富山高山連絡道路整備促進期成同盟会や富山・岐阜両県等から整備促進の要望を受けている。</p> <p>知事の意見： 事業継続に同意する。 今後ともコスト縮減に努め、早期に効果が発現されるよう整備促進に格段の配慮を願いたい。</p>				
事業評価監視委員会の意見	<p>審議の結果、再評価及び対応方針（原案）のとおり事業継続することが妥当。</p>				

事業採択時より再評価実施までの周辺環境変化等  
 前回再評価以降、大きな社会経済情勢などの変化はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等  
 事業の進捗状況：用地進捗率100%、事業進捗率72%（平成29年度末予定）  
 残事業の内容：橋梁工事、改良工事


事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 富山市猪谷から富山市片掛間において、猪谷橋（仮称）、片掛橋（仮称）の橋梁工事及び改良工事等を推進し、早期完成2車線供用を目指して整備を進める。

施設の構造や工法の変更等  
 ・猪谷橋・片掛橋の基礎掘削工法変更、巨石発生による破碎費用、発生土運搬先の変更に伴い事業費が増加している。  
 ・新技術の積極的な活用等により、コスト縮減を図る。

対応方針：事業継続

対応方針決定の理由  
 当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも、引き続き事業を継続することが妥当であると考える。

事業概要図

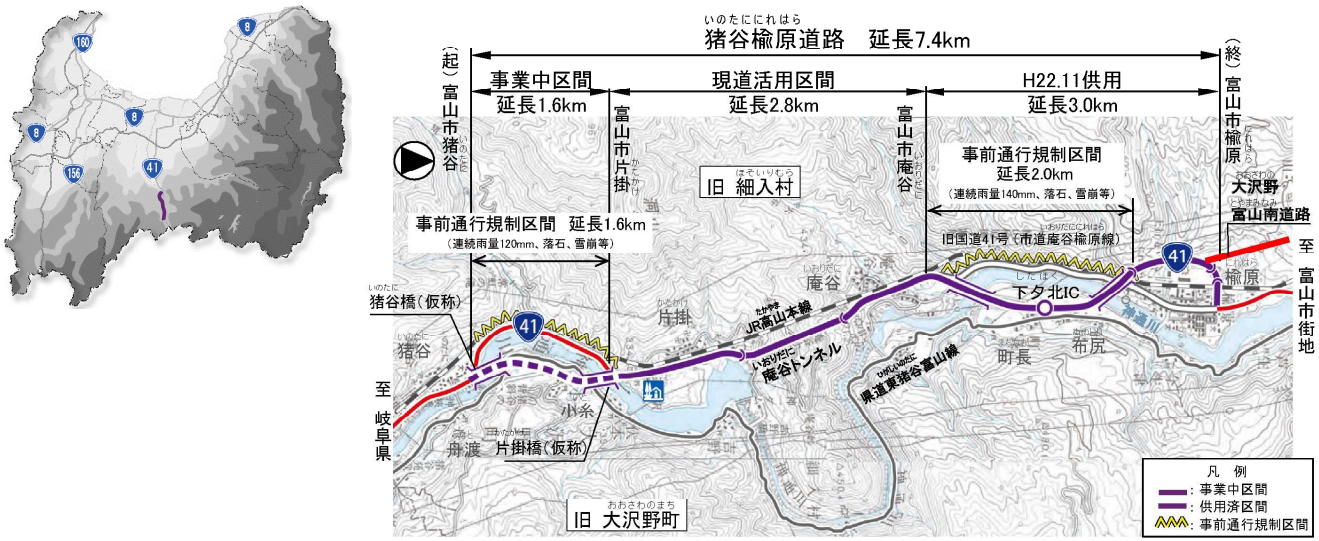

※1 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値であり、試算値を含む。  
 ※2 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。
