


再評価結果（平成30年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業名 地域高規格道路 上信自動車道 一般国道145号 吾妻東バイパス	事業 区分 一般国道	事業 主体 群馬県		
起終点 自：群馬県吾妻郡東吾妻町厚田 至：群馬県吾妻郡東吾妻町植栗		延長 6.4 km		
事業概要 上信自動車道は、群馬県の沼田・渋川地域集積圏と長野県の上田地域集積圏との連携を強化するとともに、広域交流を促進する延長約80kmの地域高規格道路である。 一般国道145号吾妻東BPは、上信自動車道の一部を構成する延長6.4kmの2車線道路である。				
H25年度事業化	都市計画決定なし	用地未着手		
全体事業費	96億円	事業進捗率 10%		
計画交通量	10,000～11,200台/日			
費用対効果 分析結果	B/C (事業全体) 2.5	総費用 (事業費/維持管理費) 72/7.3億円	総便益 (走行時間短縮/走行経費減少/交通事故減少) 212/212億円	基準年 平成29年
	(残事業) 2.9	(事業費/維持管理費) 65/7.3億円	(走行時間短縮/走行経費減少/交通事故減少) 158/30/24億円	
感度分析の結果 (事業全体) 交通量 : B/C=2.2～2.7 (交通量 ±10%) 事業費 : B/C=2.3～2.8 (事業費 ±10%) 事業期間 : B/C=2.3～2.7 (事業期間±20%) (残事業) 交通量 : B/C=2.6～3.2 (交通量 ±10%) 事業費 : B/C=2.7～3.2 (事業費 ±10%) 事業期間 : B/C=2.7～3.1 (事業期間±20%)				
事業の効果等 ・地域高規格道路「上信自動車道」の一部であり、吾妻地域の産業競争力の向上に寄与 ・災害に対する道路の信頼性が向上し、地域の防災力が強化されるほか、三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる ・草津温泉等の観光地へのアクセス向上が見込まれる				
関係する地方公共団体等の意見 ・渋川市をはじめとする3市4町2村の首長や議会議長等で構成される「上信自動車道建設促進期成同盟会」より、当該路線の整備促進の要望を受けている。				
事業評価監視委員会の意見 ・事業継続を妥当と認める。				
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 ・平成26年度に隣接する一般国道353号吾東BP2期が事業化				
事業の進捗状況、残事業の内容等 ・用地取得率約0%、事業進捗率約10%				
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 ・計画の具体化にあたって地元住民や関係機関との合意形成に不測の期間を要したが、今後は用地買収を推進し、早期に工事着手できるよう進める予定。				
施設の構造や工法の変更等 ・土工量収支に配慮し、処分費低減・残土の有効活用に努め、コスト縮減に努める。				
対応方針 事業継続				
対応方針決定の理由 ・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性・重要性は変わらないと考えられる。				

事業概要図

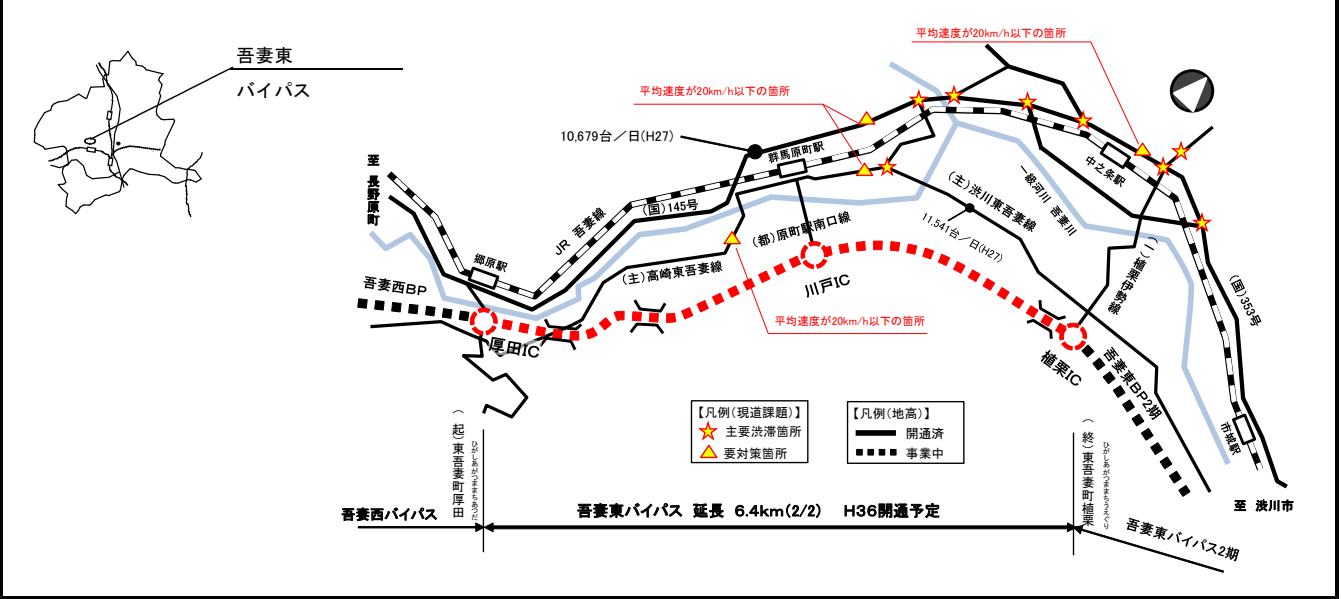

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。
 ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
