

## 再評価結果（令和4年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・技術課

担当課長名：長谷川 朋弘

事業名	一般国道9号 <small>おおだ しずま</small> 大田・静岡道路		事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 中国地方整備局
起終点	自： <small>しまね おおだ</small> 島根県大田市久手町刺鹿 至： <small>しまね おおだ</small> 島根県大田市静岡町				延長	5.0 km
<b>事業概要</b> 一般国道9号は、 <small>きょうと きょうと やまぐち しものせき</small> 京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約751kmの主要幹線道路である。 大田・静岡道路は、 <small>しまね おおだ</small> 島根県大田市久手町刺鹿と大田市静岡町を結ぶ延長5.0kmの自動車専用道路である。 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間広域交流の促進及び地域活性化を図ることである。						
H24年度事業化		H17年度都市計画決定		H26年度用地着手		H27年度工事着手
全体事業費	約360億円	事業進捗率 (令和3年3月末時点)	64%	供用済延長	0.0 km	
計画交通量	16,200台/日					
費用対効果 分析結果	B/C (3便益) <small>(事業全体)</small> 1.2 <small>(残事業)</small> 3.6	総費用 <small>(残事業)/(事業全体)</small> 126 / 376 億円 事業費 : 97/347億円 維持管理費 : 29/ 29億円	総便益 <small>(残事業)/(事業全体)</small> 450 / 450億円 走行時間短縮便益 : 357/357億円 走行費用減少便益 : 77/ 77億円 交通事故減少便益 : 16/ 16億円	基準年 令和3年		
<b>感度分析の結果</b> <small>(事業全体)</small> 交通量:B/C=1.1~1.3 (交通量±10%) <small>(残事業)</small> 交通量:B/C=3.2~4.0 (交通量±10%) 事業費:B/C=1.2~1.2 (事業費±10%)                      事業費:B/C=3.3~3.9 (事業費±10%) 事業期間:B/C=1.1~1.2 (事業期間±20%)                      事業期間:B/C=3.5~3.7 (事業期間±20%)						
<b>事業の効果等</b> ①円滑なモビリティの確保 ・渋滞損失時間の削減が期待される ・利便性の向上が期待できるバス路線が存在する〔石見交通 大田・江津線（大田市立病院・大田バスセンター～仁万駅前・道の駅サンピコ・済生会江津病院）19便/日〕 ・江津市から出雲空港へのアクセス向上が見込まれる ②物流効率化の支援 ・大田市から浜田港（重要港湾）へのアクセス向上が見込まれる ・県内大手養鶏会社から県外出荷先へのアクセス向上が期待される ③国土・地域ネットワークの構築 ・高規格道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけられている ・日常生活圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる ④個性ある地域の形成 ・島根県東部から石見銀山（R1 観光入込み客数：26.5万人/年）等へのアクセス向上が期待される ⑤安全で安心できるくらしの確保 ・第三次救急医療機関（島根県立中央病院、島根大学医学部附属病院）へのアクセス向上が期待される ⑥災害への備え ・第1次緊急輸送道路である国道9号の代替路線を形成する ⑦地球環境の保全 ・CO2排出量の削減が期待される ⑧生活環境の改善・保全 ・NOx排出量の削減が期待される ・SPM排出量の削減が期待される ⑨他のプロジェクトとの関係 ・「中国ブロックにおける社会資本整備重点計画（H28.3）」に位置づけられている ・大規模道路事業（一般国道9号 出雲・湖陵道路、湖陵・多伎道路、静岡・仁摩道路）と一体的に整備する必要あり ・「島根総合発展計画 第三次実施計画（H28.3）」、「大田市総合計画 後期計画改訂版（H29.3）」、「大田市都市計画マスタープラン（H20.3）」に位置づけられている						

関係する地方公共団体等の意見

対応方針（原案）については妥当である。

一般国道9号大田・静間道路については、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、国道9号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線である。とりわけ、令和3年8月の大雨により出雲市多伎町小田地内で地すべりが発生し、国道9号が全面通行止めとなっているが、平成31年3月に開通した山陰道「出雲多伎IC～大田朝山IC間」が国道9号の代替路として機能し、ダブルネットワークの効果を大いに発揮しており、あらためて山陰道の必要性が認識された。

人口減少に歯止めをかけ、希望と活力に満ちた新時代にふさわしい「島根創生」の実現を目指すためにも、その基盤となる山陰道の早期全線開通は県民の悲願である。

そのため、島根県内の山陰道事業中区間を一日も早く完成させるとともに、未着手区間にすみやかに着手し、山陰道の早期全線整備を行っていただきたい。

特に、出雲・湖陵道路、湖陵・多伎道路、大田・静間道路、静間・仁摩道路及び三隅・益田道路については開通見通しが公表されているので、一日でも早い開通を図っていただきたい。

事業評価監視委員会の意見

- ・ 事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。
- ・ 審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当であると意見集約した。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

- ・ H21年度に山陰自動車道（斐川IC～出雲IC間）が全線開通。
- ・ H26年度に中国横断自動車道尾道松江線及び仁摩・温泉津道路が全線開通。
- ・ H28年度に福光・浅利道路が事業化。
- ・ H28年度に浜田・三隅道路が全線開通。
- ・ H29年度に朝山・大田道路が全線開通。
- ・ H30年度に多伎・朝山道路が全線開通。
- ・ H30年度に県道浅利渡津線が全線開通。
- ・ R2年度に益田西道路が新規事業化。
- ・ R3年度に益田・田万川道路、松江北道路が新規事業化。安来道路4車線化が新規事業化。

事業の進捗状況、残事業の内容等

令和3年3月末時点で、事業全体の進捗率は64%、用地の進捗率は100%である。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き早期全線開通を目指し事業を推進する。

施設の構造や工法の変更等


技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

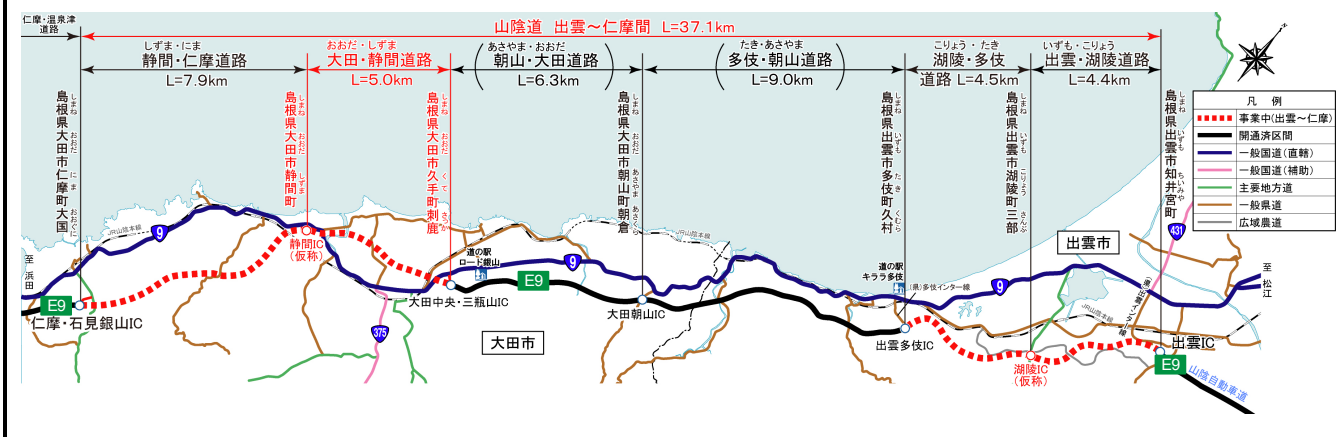

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。  
 ※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。
