

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道169号 奥瀬道路（Ⅱ期）
事業主体	近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	○費用 ・事業全体：事業費126億円（92億円）、維持管理費1.9億円（1.9億円） ○効果 ・災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮等 137億円（137億円） ※（）内の数値は残事業の効果 （注1）事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値であり、試算値を含む。 （注2）費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑な モビリティの 確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：9388万人・時間/年 渋滞損失削減時間：32万人・時間/年（50324万人・時間/年⇒50292万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：国道42号 熊野矢野川線 紀宝川瀬線 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：39万人・時間/年 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：0.3割削減
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
	<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
物流効率化 の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
	<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	新宮市、主な出荷先：東京都、大阪府
	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	国道169号（現道7.9km）
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	北山村（年間観光客入込数 56千人/年 平成23年度）
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての当該区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる		
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/徳台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	対象地区：和歌山県玉置口地区、奈良県竹筒地区
		<input type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道169号（現道7.9km）
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	異常気象時通行規制区間 国道169号（現道区間 5.2km）
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：788.02t-CO2/年

生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(推計結果) 評価対象区間(現道/平行区間等): 国道42号 熊野矢野川線 紀宝川瀬線 排出削減量: 10.52t/年、排出削減率: 0.4割削減
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(推計結果) 評価対象区間(現道/平行区間等): 国道42号 熊野矢野川線 紀宝川瀬線 排出削減量: 0.99t/年、排出削減率: 0.4割削減
	<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
	<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり <input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される

(再評価)

様式-2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道169号	奥瀬道路 (Ⅱ期)	L=5.2km	一次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
2,200	2車線	近畿地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成24年度		
単純合計	132億円	5.0億円	137億円
うち残事業分	99億円	5.0億円	104億円
基準年における 現在価値 (C)	126億円	1.9億円	128億円
うち残事業分	92億円	1.9億円	94億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成24年度			
供用年	平成28年度			
単年便益 (初年便益)	7.7億円	0.2億円	0.03億円	7.9億円
基準年における 現在価値 (B)	132億円	4.5億円	0.4億円	137億円
うち残事業分	132億円	4.5億円	0.4億円	137億円

注) 「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。

交通状況の変化

様式-3①

事業名：奥瀬道路（Ⅱ期）（事業全体）


（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 (5.2km)	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	1,700	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	9	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	2.41	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道169号 (7.8km)	交通量	[台/日]	700	0
		走行時間	[分]	19	0
		走行時間費用	[億円/年]	2.24	0.00
	国道42号 (25.2km)	交通量	[台/日]	24,500	24,200
		走行時間	[分]	92	92
		走行時間費用	[億円/年]	377.37	370.70
	熊野矢野川線 (10.8km)	交通量	[台/日]	1,100	700
		走行時間	[分]	26	24
		走行時間費用	[億円/年]	4.62	2.94
	紀宝川瀬線 (21.9km)	交通量	[台/日]	1,800	1,400
		走行時間	[分]	57	54
		走行時間費用	[億円/年]	17.29	11.81
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
③その他道路合計 (7.780.9km)	走行時間費用	[億円/年]	23,083.11	23,089.32	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：7,851.8km	走行時間短縮便益	[億円/年]	23,484.62	23,477.16	7.46

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること

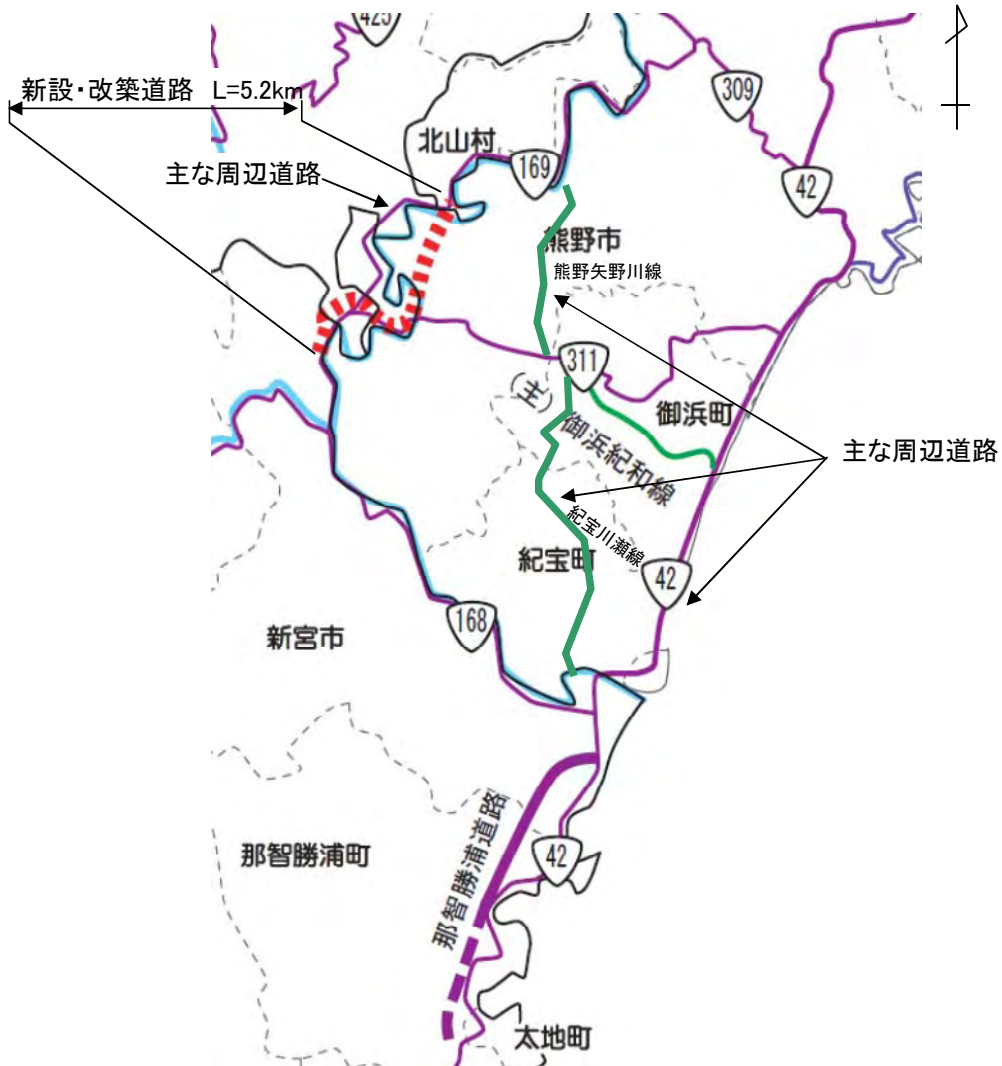

交通状況の変化

様式-3①

事業名：奥瀬道路（Ⅱ期）（残事業）


（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 (5.2km)	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	1,700	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	9	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	2.41	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道169号 (7.8km)	交通量	[台/日]	700	0
		走行時間	[分]	19	0
		走行時間費用	[億円/年]	2.24	0.00
	国道42号 (25.2km)	交通量	[台/日]	24,500	24,200
		走行時間	[分]	92	92
		走行時間費用	[億円/年]	377.37	370.70
	熊野矢野川線 (10.8km)	交通量	[台/日]	1,100	700
		走行時間	[分]	26	24
		走行時間費用	[億円/年]	4.62	2.94
	紀宝川瀬線 (21.9km)	交通量	[台/日]	1,800	1,400
		走行時間	[分]	57	54
		走行時間費用	[億円/年]	17.29	11.81
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
③その他道路合計 (7.780.9km)	走行時間費用	[億円/年]	23,083.11	23,089.32	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：7,851.8km	走行時間短縮便益	[億円/年]	23,484.62	23,477.16	7.46

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

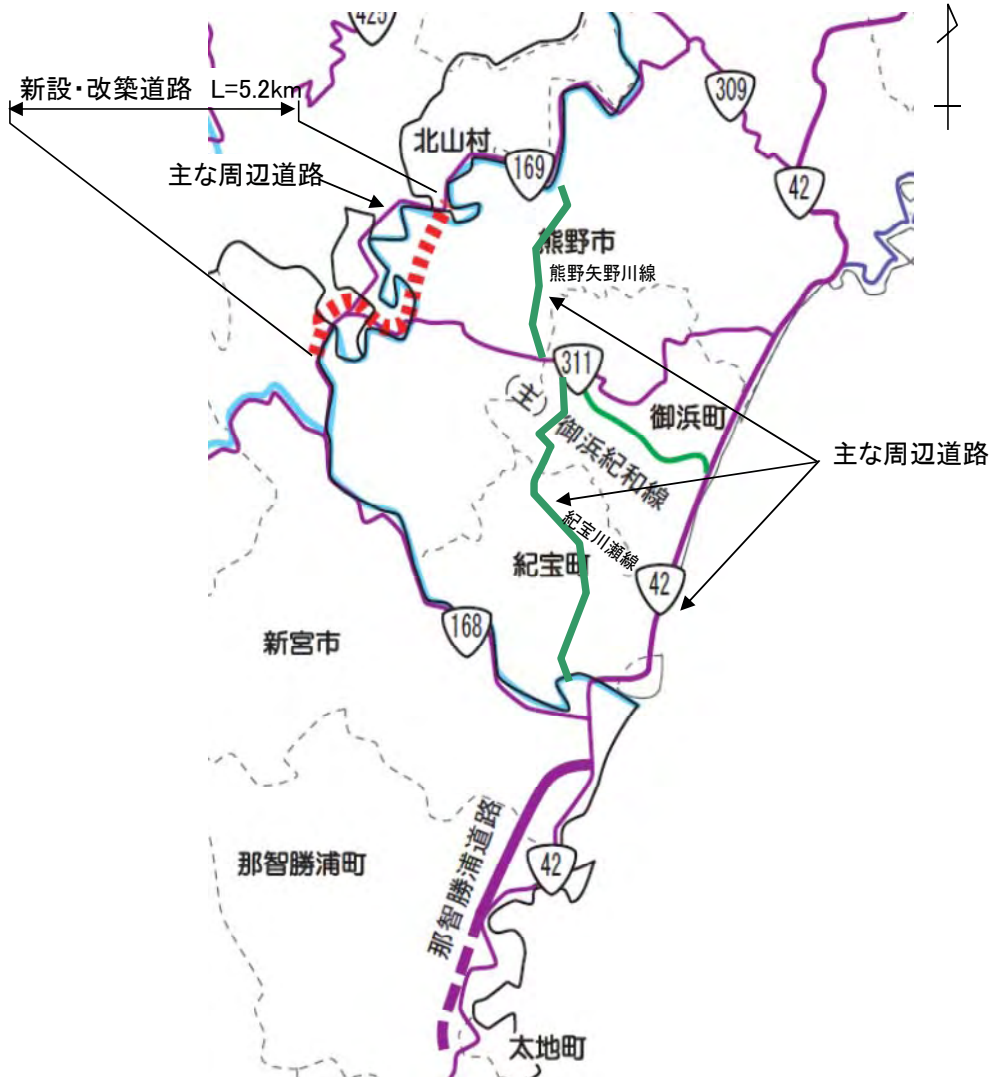

費用便益分析の条件

事業名：奥瀬道路(Ⅱ期)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成24年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサスベース)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他()	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	最終配分の速度	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載	分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、 最終速度を採用。	
	その他()	<input type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	(4) 日
			過去10年間の通行止め実績の平均値を採用 とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
	冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載			
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道169号 奥瀬道路(Ⅱ期)

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.02		5.2	0.10
-9年目	H 19	1.2167	97.6	4.56	5.33		
-8年目	H 20	1.1699	96.8	0.92	1.05		
-7年目	H 21	1.1249	95.6	1.31	1.45		
-6年目	H 22	1.0816	93.8	5.50	5.95		
-5年目	H 23	1.0400	93.8	4.77	4.96		
-4年目	H 24	1.0000	93.8	16.00	16.00		
-3年目	H 25	0.9615	93.8	20.00	19.23		
-2年目	H 26	0.9246	93.8	52.63	48.66		
-1年目	H 27	0.8890	93.8	26.68	23.72		
供用開始年次	H 28	0.8548	93.8			0.10	0.08
1年目	H 29	0.8219	93.8			0.10	0.08
2年目	H 30	0.7903	93.8			0.10	0.08
3年目	H 31	0.7599	93.8			0.10	0.08
4年目	H 32	0.7307	93.8			0.10	0.07
5年目	H 33	0.7026	93.8			0.10	0.07
6年目	H 34	0.6756	93.8			0.10	0.07
7年目	H 35	0.6496	93.8			0.10	0.06
8年目	H 36	0.6246	93.8			0.10	0.06
9年目	H 37	0.6006	93.8			0.10	0.06
10年目	H 38	0.5775	93.8			0.10	0.06
11年目	H 39	0.5553	93.8			0.10	0.06
12年目	H 40	0.5339	93.8			0.10	0.05
13年目	H 41	0.5134	93.8			0.10	0.05
14年目	H 42	0.4936	93.8			0.10	0.05
15年目	H 43	0.4746	93.8			0.10	0.05
16年目	H 44	0.4564	93.8			0.10	0.05
17年目	H 45	0.4388	93.8			0.10	0.04
18年目	H 46	0.4220	93.8			0.10	0.04
19年目	H 47	0.4057	93.8			0.10	0.04
20年目	H 48	0.3901	93.8			0.10	0.04
21年目	H 49	0.3751	93.8			0.10	0.04
22年目	H 50	0.3607	93.8			0.10	0.04
23年目	H 51	0.3468	93.8			0.10	0.03
24年目	H 52	0.3335	93.8			0.10	0.03
25年目	H 53	0.3207	93.8			0.10	0.03
26年目	H 54	0.3083	93.8			0.10	0.03
27年目	H 55	0.2965	93.8			0.10	0.03
28年目	H 56	0.2851	93.8			0.10	0.03
29年目	H 57	0.2741	93.8			0.10	0.03
30年目	H 58	0.2636	93.8			0.10	0.03
31年目	H 59	0.2534	93.8			0.10	0.03
32年目	H 60	0.2437	93.8			0.10	0.02
33年目	H 61	0.2343	93.8			0.10	0.02
34年目	H 62	0.2253	93.8			0.10	0.02
35年目	H 63	0.2166	93.8			0.10	0.02
36年目	H 64	0.2083	93.8			0.10	0.02
37年目	H 65	0.2003	93.8			0.10	0.02
38年目	H 66	0.1926	93.8			0.10	0.02
39年目	H 67	0.1852	93.8			0.10	0.02
40年目	H 68	0.1780	93.8			0.10	0.02
41年目	H 69	0.1712	93.8			0.10	0.02
42年目	H 70	0.1646	93.8			0.10	0.02
43年目	H 71	0.1583	93.8			0.10	0.02
44年目	H 72	0.1522	93.8			0.10	0.02
45年目	H 73	0.1463	93.8			0.10	0.01
46年目	H 74	0.1407	93.8			0.10	0.01
47年目	H 75	0.1353	93.8			0.10	0.01

48年目	H 76	0.1301	93.8			0.10	0.01
49年目	H 77	0.1251	93.8	-0.51	-0.06	0.10	0.01
合計				131.87	126.29	4.95	1.90
単純事業費計				132.38		4.95	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道169号 奥瀬道路(Ⅱ期)

年次	年度	割戻率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.02	5.2	0.10	
-3年目	H 25	0.9615	93.8	20.00	19.23		
-2年目	H 26	0.9246	93.8	52.63	48.66		
-1年目	H 27	0.8890	93.8	26.68	23.72		
供用開始年次	H 28	0.8548	93.8			0.10	0.08
1年目	H 29	0.8219	93.8			0.10	0.08
2年目	H 30	0.7903	93.8			0.10	0.08
3年目	H 31	0.7599	93.8			0.10	0.08
4年目	H 32	0.7307	93.8			0.10	0.07
5年目	H 33	0.7026	93.8			0.10	0.07
6年目	H 34	0.6756	93.8			0.10	0.07
7年目	H 35	0.6496	93.8			0.10	0.06
8年目	H 36	0.6246	93.8			0.10	0.06
9年目	H 37	0.6006	93.8			0.10	0.06
10年目	H 38	0.5775	93.8			0.10	0.06
11年目	H 39	0.5553	93.8			0.10	0.06
12年目	H 40	0.5339	93.8			0.10	0.05
13年目	H 41	0.5134	93.8			0.10	0.05
14年目	H 42	0.4936	93.8			0.10	0.05
15年目	H 43	0.4746	93.8			0.10	0.05
16年目	H 44	0.4564	93.8			0.10	0.05
17年目	H 45	0.4388	93.8			0.10	0.04
18年目	H 46	0.4220	93.8			0.10	0.04
19年目	H 47	0.4057	93.8			0.10	0.04
20年目	H 48	0.3901	93.8			0.10	0.04
21年目	H 49	0.3751	93.8			0.10	0.04
22年目	H 50	0.3607	93.8			0.10	0.04
23年目	H 51	0.3468	93.8			0.10	0.03
24年目	H 52	0.3335	93.8			0.10	0.03
25年目	H 53	0.3207	93.8			0.10	0.03
26年目	H 54	0.3083	93.8			0.10	0.03
27年目	H 55	0.2965	93.8			0.10	0.03
28年目	H 56	0.2851	93.8			0.10	0.03
29年目	H 57	0.2741	93.8			0.10	0.03
30年目	H 58	0.2636	93.8			0.10	0.03
31年目	H 59	0.2534	93.8			0.10	0.03
32年目	H 60	0.2437	93.8			0.10	0.02
33年目	H 61	0.2343	93.8			0.10	0.02
34年目	H 62	0.2253	93.8			0.10	0.02
35年目	H 63	0.2166	93.8			0.10	0.02
36年目	H 64	0.2083	93.8			0.10	0.02
37年目	H 65	0.2003	93.8			0.10	0.02
38年目	H 66	0.1926	93.8			0.10	0.02
39年目	H 67	0.1852	93.8			0.10	0.02
40年目	H 68	0.1780	93.8			0.10	0.02
41年目	H 69	0.1712	93.8			0.10	0.02
42年目	H 70	0.1646	93.8			0.10	0.02
43年目	H 71	0.1583	93.8			0.10	0.02
44年目	H 72	0.1522	93.8			0.10	0.02
45年目	H 73	0.1463	93.8			0.10	0.01
46年目	H 74	0.1407	93.8			0.10	0.01
47年目	H 75	0.1353	93.8			0.10	0.01
48年目	H 76	0.1301	93.8			0.10	0.01
49年目	H 77	0.1251	93.8	-0.01	0.00	0.10	0.01
合計				99.29	91.61	4.95	1.90
単純事業費計				99.30		4.95	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名： 一般国道169号 奥瀬道路（Ⅱ期）

年次	年度 (基準年) H 24	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 28	0.99712	0.99153	1.00981	0.99802	0.8548	93.8	5.08	1.80	0.78	7.66	6.35	0.15	0.01	0.08	0.24	0.20	0.03	0.02	7.93	6.57
1年目	H 29	0.99711	0.99146	1.00971	0.99802	0.8219	93.8	5.06	1.79	0.79	7.64	6.08	0.15	0.01	0.08	0.24	0.19	0.03	0.02	7.91	6.30
2年目	H 30	0.99710	0.99138	1.00962	0.99801	0.7903	93.8	5.05	1.77	0.80	7.62	5.83	0.15	0.01	0.08	0.24	0.19	0.03	0.02	7.89	6.04
3年目	H 31	0.99709	0.99131	1.00953	0.99801	0.7599	93.8	5.03	1.76	0.80	7.59	5.59	0.15	0.01	0.09	0.24	0.18	0.03	0.02	7.86	5.79
4年目	H 32	0.99817	0.99297	1.01258	0.99953	0.7307	93.8	5.02	1.74	0.81	7.57	5.36	0.15	0.01	0.09	0.24	0.17	0.03	0.02	7.84	5.55
5年目	H 33	0.99816	0.99292	1.01242	0.99953	0.7026	93.8	5.01	1.73	0.82	7.56	5.15	0.15	0.01	0.09	0.24	0.17	0.03	0.02	7.83	5.33
6年目	H 34	0.99816	0.99287	1.01227	0.99953	0.6756	93.8	5.00	1.72	0.83	7.55	4.94	0.15	0.01	0.09	0.25	0.16	0.03	0.02	7.82	5.12
7年目	H 35	0.99816	0.99282	1.01212	0.99953	0.6496	93.8	4.99	1.71	0.84	7.54	4.74	0.14	0.01	0.09	0.25	0.16	0.03	0.02	7.81	4.92
8年目	H 36	0.99815	0.99277	1.01198	0.99953	0.6246	93.8	4.98	1.69	0.85	7.53	4.56	0.14	0.01	0.09	0.25	0.15	0.03	0.02	7.80	4.72
9年目	H 37	0.99815	0.99272	1.01184	0.99953	0.6006	93.8	4.97	1.68	0.86	7.52	4.37	0.14	0.01	0.09	0.25	0.14	0.03	0.01	7.79	4.53
10年目	H 38	0.99815	0.99266	1.01170	0.99953	0.5775	93.8	4.96	1.67	0.87	7.50	4.20	0.14	0.01	0.09	0.25	0.14	0.03	0.01	7.78	4.35
11年目	H 39	0.99814	0.99261	1.01156	0.99953	0.5553	93.8	4.95	1.66	0.88	7.49	4.03	0.14	0.01	0.09	0.25	0.13	0.03	0.01	7.77	4.18
12年目	H 40	0.99814	0.99255	1.01143	0.99953	0.5339	93.8	4.94	1.64	0.89	7.48	3.87	0.14	0.01	0.09	0.25	0.13	0.03	0.01	7.76	4.01
13年目	H 41	0.99814	0.99250	1.01130	0.99953	0.5134	93.8	4.94	1.63	0.90	7.47	3.72	0.14	0.01	0.10	0.25	0.12	0.02	0.01	7.75	3.85
14年目	H 42	0.99814	0.99245	1.01116	0.99953	0.4936	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	3.57	0.14	0.01	0.10	0.25	0.12	0.02	0.01	7.74	3.70
15年目	H 43	0.99814	0.99240	1.01102	0.99953	0.4746	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	3.41	0.14	0.01	0.10	0.25	0.12	0.02	0.01	7.74	3.53
16年目	H 44	0.99814	0.99235	1.01088	0.99953	0.4564	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	3.25	0.14	0.01	0.10	0.25	0.11	0.02	0.01	7.72	3.37
17年目	H 45	0.99814	0.99230	1.01074	0.99953	0.4388	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	3.10	0.14	0.01	0.10	0.25	0.11	0.02	0.01	7.72	3.22
18年目	H 46	0.99814	0.99225	1.01060	0.99953	0.4220	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.96	0.14	0.01	0.10	0.25	0.10	0.02	0.01	7.71	3.07
19年目	H 47	0.99814	0.99220	1.01046	0.99953	0.4057	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.82	0.14	0.01	0.10	0.25	0.10	0.02	0.01	7.71	2.93
20年目	H 48	0.99814	0.99215	1.01032	0.99953	0.3901	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.69	0.13	0.01	0.10	0.24	0.09	0.02	0.01	7.70	2.80
21年目	H 49	0.99814	0.99210	1.01018	0.99953	0.3751	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.57	0.13	0.01	0.10	0.24	0.09	0.02	0.01	7.70	2.67
22年目	H 50	0.99814	0.99205	1.01004	0.99953	0.3607	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.45	0.13	0.01	0.10	0.24	0.08	0.02	0.01	7.70	2.54
23年目	H 51	0.99814	0.99200	1.00990	0.99953	0.3468	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.34	0.13	0.01	0.10	0.24	0.08	0.02	0.01	7.70	2.43
24年目	H 52	0.99814	0.99195	1.00976	0.99953	0.3335	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.23	0.13	0.01	0.10	0.24	0.08	0.02	0.01	7.70	2.32
25年目	H 53	0.99814	0.99190	1.00962	0.99953	0.3207	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.13	0.13	0.01	0.10	0.24	0.07	0.02	0.01	7.70	2.21
26年目	H 54	0.99814	0.99185	1.00948	0.99953	0.3083	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	2.03	0.13	0.01	0.10	0.24	0.07	0.02	0.01	7.70	2.11
27年目	H 55	0.99814	0.99180	1.00934	0.99953	0.2965	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.94	0.13	0.01	0.10	0.24	0.07	0.02	0.01	7.70	2.01
28年目	H 56	0.99814	0.99175	1.00920	0.99953	0.2851	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.85	0.12	0.01	0.10	0.23	0.06	0.02	0.01	7.70	1.92
29年目	H 57	0.99814	0.99170	1.00906	0.99953	0.2741	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.76	0.12	0.01	0.10	0.23	0.06	0.02	0.01	7.70	1.83
30年目	H 58	0.99814	0.99165	1.00892	0.99953	0.2636	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.68	0.12	0.01	0.10	0.23	0.06	0.02	0.01	7.70	1.74
31年目	H 59	0.99814	0.99160	1.00878	0.99953	0.2534	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.60	0.12	0.01	0.10	0.23	0.06	0.02	0.01	7.70	1.66
32年目	H 60	0.99814	0.99155	1.00864	0.99953	0.2437	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.53	0.12	0.01	0.10	0.23	0.05	0.02	0.01	7.70	1.59
33年目	H 61	0.99814	0.99150	1.00850	0.99953	0.2343	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.45	0.12	0.01	0.10	0.23	0.05	0.02	0.00	7.70	1.51
34年目	H 62	0.99814	0.99145	1.00836	0.99953	0.2253	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.39	0.12	0.01	0.10	0.23	0.05	0.02	0.00	7.70	1.44
35年目	H 63	0.99814	0.99140	1.00822	0.99953	0.2166	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.32	0.11	0.01	0.10	0.23	0.05	0.02	0.00	7.70	1.37
36年目	H 64	0.99814	0.99135	1.00808	0.99953	0.2083	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.26	0.11	0.01	0.10	0.22	0.05	0.02	0.00	7.70	1.31
37年目	H 65	0.99814	0.99130	1.00794	0.99953	0.2003	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.20	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.25
38年目	H 66	0.99814	0.99125	1.00780	0.99953	0.1926	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.14	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.19
39年目	H 67	0.99814	0.99120	1.00766	0.99953	0.1852	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.09	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.13
40年目	H 68	0.99814	0.99115	1.00752	0.99953	0.1780	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	1.04	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.08
41年目	H 69	0.99814	0.99110	1.00738	0.99953	0.1712	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	0.99	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.03
42年目	H 70	0.99814	0.99105	1.00724	0.99953	0.1646	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	0.94	0.11	0.01	0.10	0.22	0.03	0.02	0.00	7.70	0.98
43年目	H 71	0.99814	0.99100	1.00710	0.99953	0.1583	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	0.90	0.10	0.01	0.10	0.22	0.03	0.02	0.00	7.70	0.93
44年目	H 72	0.99814	0.99095	1.00696	0.99953	0.1522	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	0.85	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.89
45年目	H 73	0.99814	0.99090	1.00682	0.99953	0.1463	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	0.81	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.85
46年目	H 74	0.99814	0.99085	1.00668	0.99953	0.1407	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	0.77	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.81
47年目	H 75	0.99814	0.99080	1.00654	0.99953	0.1353	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	0.74	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.77
48年目	H 76	0.99814	0.99075	1.00640	0.99953	0.1301	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	0.70	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00</		

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名： 一般国道169号 奥瀬道路（Ⅱ期）

年次	年度 (基準年) H 24	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 28	0.99712	0.99153	1.00981	0.99802	0.8548	93.8	5.08	1.80	0.78	7.66	6.35	0.15	0.01	0.08	0.24	0.20	0.03	0.02	7.93	6.57
1年目	H 29	0.99711	0.99146	1.00971	0.99802	0.8219	93.8	5.06	1.79	0.79	7.64	6.08	0.15	0.01	0.08	0.24	0.19	0.03	0.02	7.91	6.30
2年目	H 30	0.99710	0.99138	1.00962	0.99801	0.7903	93.8	5.05	1.77	0.80	7.62	5.83	0.15	0.01	0.08	0.24	0.19	0.03	0.02	7.89	6.04
3年目	H 31	0.99709	0.99131	1.00953	0.99801	0.7599	93.8	5.03	1.76	0.80	7.59	5.59	0.15	0.01	0.09	0.24	0.18	0.03	0.02	7.86	5.79
4年目	H 32	0.99817	0.99297	1.01258	0.99953	0.7307	93.8	5.02	1.74	0.81	7.57	5.36	0.15	0.01	0.09	0.24	0.17	0.03	0.02	7.84	5.55
5年目	H 33	0.99816	0.99292	1.01242	0.99953	0.7026	93.8	5.01	1.73	0.82	7.56	5.15	0.15	0.01	0.09	0.24	0.17	0.03	0.02	7.83	5.33
6年目	H 34	0.99816	0.99287	1.01227	0.99953	0.6756	93.8	5.00	1.72	0.83	7.55	4.94	0.15	0.01	0.09	0.25	0.16	0.03	0.02	7.82	5.12
7年目	H 35	0.99816	0.99282	1.01212	0.99953	0.6496	93.8	4.99	1.71	0.84	7.54	4.74	0.14	0.01	0.09	0.25	0.16	0.03	0.02	7.81	4.92
8年目	H 36	0.99815	0.99277	1.01198	0.99953	0.6246	93.8	4.98	1.69	0.85	7.53	4.56	0.14	0.01	0.09	0.25	0.15	0.03	0.02	7.80	4.72
9年目	H 37	0.99815	0.99272	1.01184	0.99953	0.6006	93.8	4.97	1.68	0.86	7.52	4.37	0.14	0.01	0.09	0.25	0.14	0.03	0.01	7.79	4.53
10年目	H 38	0.99815	0.99266	1.01170	0.99953	0.5775	93.8	4.96	1.67	0.87	7.50	4.20	0.14	0.01	0.09	0.25	0.14	0.03	0.01	7.78	4.35
11年目	H 39	0.99814	0.99261	1.01156	0.99953	0.5553	93.8	4.95	1.66	0.88	7.49	4.03	0.14	0.01	0.09	0.25	0.13	0.03	0.01	7.77	4.18
12年目	H 40	0.99814	0.99255	1.01143	0.99953	0.5339	93.8	4.94	1.64	0.89	7.48	3.87	0.14	0.01	0.09	0.25	0.13	0.03	0.01	7.76	4.01
13年目	H 41	0.99814	0.99250	1.01130	0.99953	0.5134	93.8	4.94	1.63	0.90	7.47	3.72	0.14	0.01	0.10	0.25	0.12	0.02	0.01	7.75	3.85
14年目	H 42	0.99814	0.99245	1.01116	0.99953	0.4936	93.8	4.93	1.62	0.91	7.46	3.57	0.14	0.01	0.10	0.25	0.12	0.02	0.01	7.74	3.70
15年目	H 43	0.99814	0.99240	1.01102	0.99953	0.4746	93.8	4.93	1.61	0.92	7.45	3.41	0.14	0.01	0.10	0.25	0.12	0.02	0.01	7.73	3.53
16年目	H 44	0.99814	0.99235	1.01088	0.99953	0.4564	93.8	4.93	1.60	0.92	7.45	3.25	0.14	0.01	0.10	0.25	0.11	0.02	0.01	7.72	3.37
17年目	H 45	0.99814	0.99230	1.01074	0.99953	0.4388	93.8	4.93	1.59	0.92	7.45	3.10	0.14	0.01	0.10	0.25	0.11	0.02	0.01	7.72	3.22
18年目	H 46	0.99814	0.99225	1.01060	0.99953	0.4220	93.8	4.93	1.58	0.92	7.45	2.96	0.14	0.01	0.10	0.25	0.10	0.02	0.01	7.71	3.07
19年目	H 47	0.99814	0.99220	1.01046	0.99953	0.4057	93.8	4.93	1.57	0.92	7.45	2.82	0.14	0.01	0.10	0.25	0.10	0.02	0.01	7.71	2.93
20年目	H 48	0.99814	0.99215	1.01032	0.99953	0.3901	93.8	4.93	1.56	0.92	7.45	2.69	0.13	0.01	0.10	0.24	0.09	0.02	0.01	7.70	2.80
21年目	H 49	0.99814	0.99210	1.01018	0.99953	0.3751	93.8	4.93	1.55	0.92	7.45	2.57	0.13	0.01	0.10	0.24	0.09	0.02	0.01	7.70	2.67
22年目	H 50	0.99814	0.99205	1.01004	0.99953	0.3607	93.8	4.93	1.54	0.92	7.45	2.45	0.13	0.01	0.10	0.24	0.08	0.02	0.01	7.70	2.54
23年目	H 51	0.99814	0.99200	1.00990	0.99953	0.3468	93.8	4.93	1.53	0.92	7.45	2.34	0.13	0.01	0.10	0.24	0.08	0.02	0.01	7.70	2.43
24年目	H 52	0.99814	0.99195	1.00976	0.99953	0.3335	93.8	4.93	1.52	0.92	7.45	2.23	0.13	0.01	0.10	0.24	0.08	0.02	0.01	7.70	2.32
25年目	H 53	0.99814	0.99190	1.00962	0.99953	0.3207	93.8	4.93	1.51	0.92	7.45	2.13	0.13	0.01	0.10	0.24	0.07	0.02	0.01	7.70	2.21
26年目	H 54	0.99814	0.99185	1.00948	0.99953	0.3083	93.8	4.93	1.50	0.92	7.45	2.03	0.13	0.01	0.10	0.24	0.07	0.02	0.01	7.70	2.11
27年目	H 55	0.99814	0.99180	1.00934	0.99953	0.2965	93.8	4.93	1.49	0.92	7.45	1.94	0.13	0.01	0.10	0.24	0.07	0.02	0.01	7.70	2.01
28年目	H 56	0.99814	0.99175	1.00920	0.99953	0.2851	93.8	4.93	1.48	0.92	7.45	1.85	0.12	0.01	0.10	0.23	0.06	0.02	0.01	7.70	1.92
29年目	H 57	0.99814	0.99170	1.00906	0.99953	0.2741	93.8	4.93	1.47	0.92	7.45	1.76	0.12	0.01	0.10	0.23	0.06	0.02	0.01	7.70	1.83
30年目	H 58	0.99814	0.99165	1.00892	0.99953	0.2636	93.8	4.93	1.46	0.92	7.45	1.68	0.12	0.01	0.10	0.23	0.06	0.02	0.01	7.70	1.74
31年目	H 59	0.99814	0.99160	1.00878	0.99953	0.2534	93.8	4.93	1.45	0.92	7.45	1.60	0.12	0.01	0.10	0.23	0.06	0.02	0.01	7.70	1.66
32年目	H 60	0.99814	0.99155	1.00864	0.99953	0.2437	93.8	4.93	1.44	0.92	7.45	1.53	0.12	0.01	0.10	0.23	0.05	0.02	0.01	7.70	1.59
33年目	H 61	0.99814	0.99150	1.00850	0.99953	0.2343	93.8	4.93	1.43	0.92	7.45	1.45	0.12	0.01	0.10	0.23	0.05	0.02	0.00	7.70	1.51
34年目	H 62	0.99814	0.99145	1.00836	0.99953	0.2253	93.8	4.93	1.42	0.92	7.45	1.39	0.12	0.01	0.10	0.23	0.05	0.02	0.00	7.70	1.44
35年目	H 63	0.99814	0.99140	1.00822	0.99953	0.2166	93.8	4.93	1.41	0.92	7.45	1.32	0.11	0.01	0.10	0.23	0.05	0.02	0.00	7.70	1.37
36年目	H 64	0.99814	0.99135	1.00808	0.99953	0.2083	93.8	4.93	1.40	0.92	7.45	1.26	0.11	0.01	0.10	0.22	0.05	0.02	0.00	7.70	1.31
37年目	H 65	0.99814	0.99130	1.00794	0.99953	0.2003	93.8	4.93	1.39	0.92	7.45	1.20	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.25
38年目	H 66	0.99814	0.99125	1.00780	0.99953	0.1926	93.8	4.93	1.38	0.92	7.45	1.14	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.19
39年目	H 67	0.99814	0.99120	1.00766	0.99953	0.1852	93.8	4.93	1.37	0.92	7.45	1.09	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.13
40年目	H 68	0.99814	0.99115	1.00752	0.99953	0.1780	93.8	4.93	1.36	0.92	7.45	1.04	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.08
41年目	H 69	0.99814	0.99110	1.00738	0.99953	0.1712	93.8	4.93	1.35	0.92	7.45	0.99	0.11	0.01	0.10	0.22	0.04	0.02	0.00	7.70	1.03
42年目	H 70	0.99814	0.99105	1.00724	0.99953	0.1646	93.8	4.93	1.34	0.92	7.45	0.94	0.11	0.01	0.10	0.22	0.03	0.02	0.00	7.70	0.98
43年目	H 71	0.99814	0.99100	1.00710	0.99953	0.1583	93.8	4.93	1.33	0.92	7.45	0.90	0.10	0.01	0.10	0.22	0.03	0.02	0.00	7.70	0.93
44年目	H 72	0.99814	0.99095	1.00696	0.99953	0.1522	93.8	4.93	1.32	0.92	7.45	0.85	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.89
45年目	H 73	0.99814	0.99090	1.00682	0.99953	0.1463	93.8	4.93	1.31	0.92	7.45	0.81	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.85
46年目	H 74	0.99814	0.99085	1.00668	0.99953	0.1407	93.8	4.93	1.30	0.92	7.45	0.77	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.81
47年目	H 75	0.99814	0.99080	1.00654	0.99953	0.1353	93.8	4.93	1.29	0.92	7.45	0.74	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.77
48年目	H 76	0.99814	0.99075	1.00640	0.99953	0.1301	93.8	4.93	1.28	0.92	7.45	0.70	0.10	0.01	0.10	0.21	0.03	0.02	0.00	7.70	0.73
49年目																					
