

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	国道10号 都城道路
事業主体	九州地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比 (B/C) =2.5 (経済的純現在価値 (B-C) =481億円)、経済的内部収益率 (EIRR) =8.9% 残事業：費用便益比 (B/C) =4.6 (経済的純現在価値 (B-C) =553億円)、経済的内部収益率 (EIRR) =16%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間b(当該区間/並行区間)について：(該当区間名) 国道10号(都城市都北町~都城市五十町) 並行区間等(当該区間)の損失時間：68.8万人・時間/年 並行区間等(当該区間)の損失削減率：7割削減
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	並行区間(国道10号)のバス路線の利便性向上が期待できる ・都城道路(乙房10~五十町10間)の並行道路(国道10号)の所要時間短縮(約22分⇒約15分：約7分短縮)
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	重要港湾である志布志港へのアクセス向上が見込まれる ・都城10~志布志港間の所要時間短縮(約70分⇒約44分：約25分短縮[うち本事業(乙房10~五十町10)では約10分短縮])
<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上		輸送先までの所要時間の短縮により、輸送コストの低減が図られる ・都城市の畜産産出額は全国1位 ・志布志港の取扱貨物量の約9割が飼料であり、その約4割が都城地域・管外地域に輸送 ・都城10~志布志港間の所要時間短縮(約70分⇒約44分：約25分短縮[うち本事業(乙房10~五十町10)では約10分短縮])	
<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する			

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input checked="" type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	都城道路は「広域道路整備基本計画(宮崎の道路)」に位置づけられており、環状道路を形成する
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input checked="" type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	都城志布志道路(H6.12.16計画路線指定、H8.8.30調査区間指定、H10.12.18整備区間指定)
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	「都城広域定住自立圏」(3市1町 [※] :H21協定)など、地域間の交流促進を支援する ※都城市、三股町、鹿児島県曾於市、志布志市の3市1町
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	都城市への観光客数の増加や南九州地域の周遊エリアの拡大が期待される
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての区間に於いて、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できる暮らしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	都城市~宮崎大学医学部附属病院の搬送時間の短縮(約44分⇒約39分:約5分短縮)	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	
		■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道10号（都城1C～都市五十町）の代替路線を形成する
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：7,551t-CO2/年 （未整備：17,675t-CO2/年 ⇒ 整備後：10,125t-CO2/年）
		● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（現道）：国道10号（都市都北町～都市五十町） 排出削減量：15.0t-Nox/年、排出削減率：約4割削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてNox排出増加量：43.3t/年
	● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（現道）：国道10号（都市都北町～都市五十町） 排出削減量：0.8t-SPM/年、排出削減率：約4割削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてSPM排出増加量：2.0t/年	
	<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある		
	<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される		
	5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている
■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり			都城志布志道路の一部区間を形成
<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている			
<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる			

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
国道10号	都城道路	7.7km	地域高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
23,600～34,700	4	九州地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成24年度		
単純合計	318億円	66億円	384億円
うち残事業分	178億円	59億円	237億円
基準年における 現在価値 (C)	291億円	24億円	315億円
うち残事業分	135億円	19億円	154億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成24年度			
供用年	平成24年度			
単年便益 (初年便益)	4.0億円	0.93億円	0.47億円	5.4億円
基準年における 現在価値 (B)	564億円	141億円	91億円	797億円
うち残事業分	498億円	127億円	81億円	706億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	2.5
経済的純現在価値（事業全体）	481億円
経済的内部収益率（事業全体）	8.9%
費用便益比（残事業）	4.6
経済的純現在価値（残事業）	553億円
経済的内部収益率（残事業）	16%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（残事業を対象）

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	23,600～34,700	±10%	2.2 ～ 2.9
事業費	318億円	±10%	2.4 ～ 2.6
事業期間	27年	±20%	2.5 ～ 2.6

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	23,600～34,700	±10%	4.0 ～ 5.2
事業費	178億円	±10%	4.2 ～ 5.0
事業期間	13年	±20%	4.5 ～ 4.7

交通状況の変化


事業名：国道10号 都城道路

様式 - 3①

(推計時点 H42年) (事業全体)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [都城道路 未供用区間] : 5.8km	交通量	[台/日]	0.00	32,000	
	走行時間	[分]	0.00	4.5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	26	
①新設・改築道路 [都城道路 暫定供用区間] : 1.9km	交通量	[台/日]	0.00	23,600	
	走行時間	[分]	0.00	1.5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	6.2	
②主な周辺道路	九州縦貫 自動車道 : 87.9km	交通量	[台/日]	8,400	7,100
		走行時間	[分]	69	69
		走行時間費用	[億円/年]	112	96
	国道10号 : 11.5km	交通量	[台/日]	20,400	11,900
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	67	37
	(主)都城 霧島公園 線 : 25.3km	交通量	[台/日]	7,400	6,600
		走行時間	[分]	40	39
		走行時間費用	[億円/年]	56	47
	(県)財部 庄内安久 線 : 19.9km	交通量	[台/日]	8,000	7,100
		走行時間	[分]	36	36
		走行時間費用	[億円/年]	51	45
	(県)飯野 松山都城 線 : 9.0km	交通量	[台/日]	10,800	8,600
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	27	21
③その他道路合計 : 3,693.9km	走行時間費用	[億円/年]	5,032	5,024	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 3,855.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5,345	5,301	44

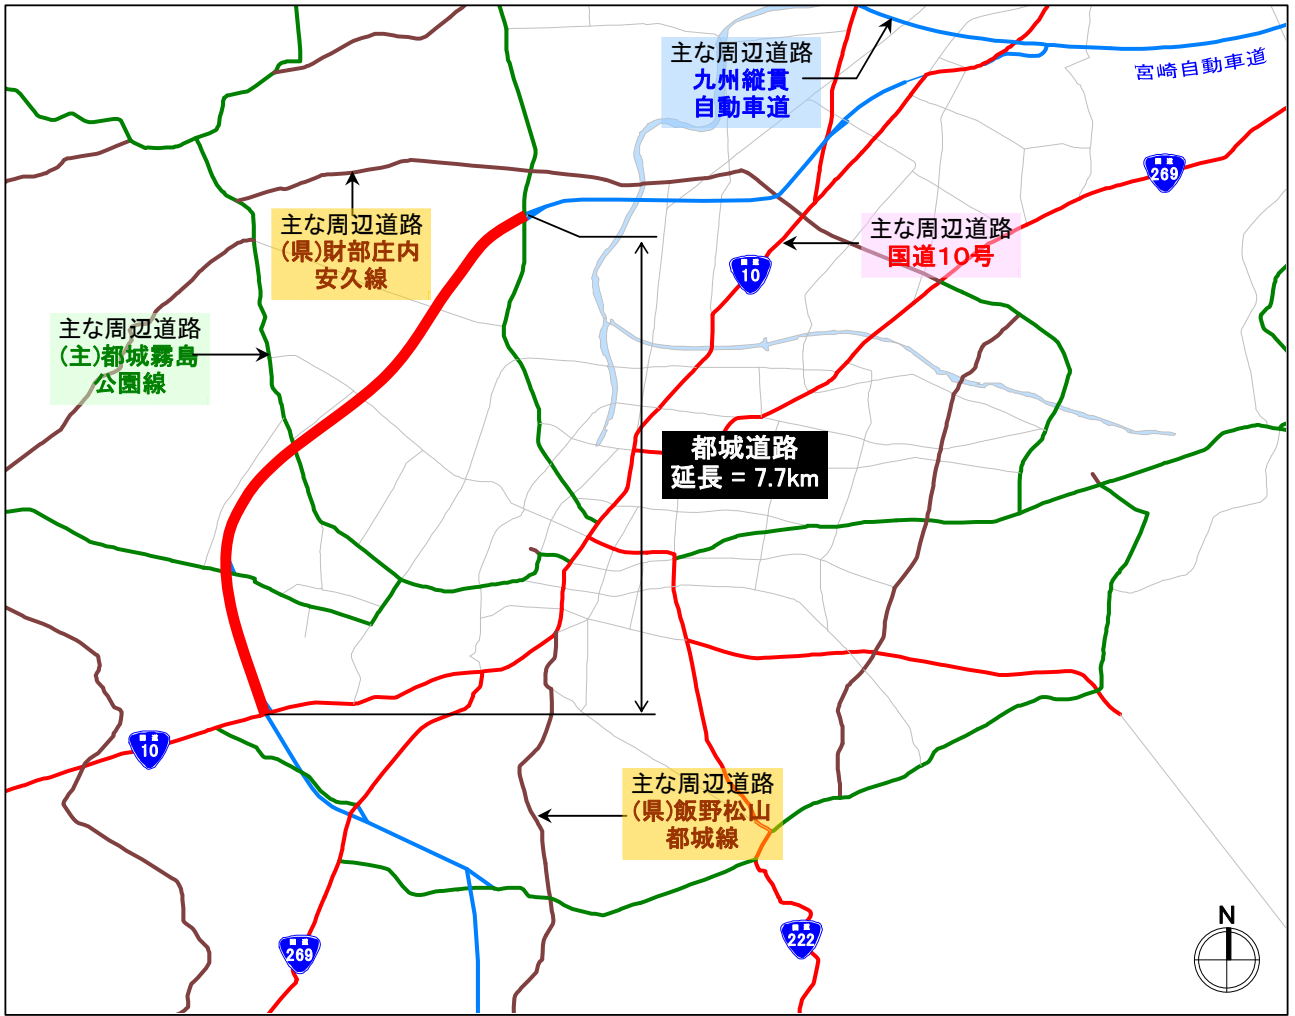


交通状況の変化

事業名：国道10号 都城道路

様式－3①

(推計時点 H42年) (残事業)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [都城道路 未供用区間] : 5.8km	交通量	[台/日]	0.00	32,000	
	走行時間	[分]	0.00	4.5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	26	
①新設・改築道路 [都城道路 暫定供用区間] : 1.9km	交通量	[台/日]	8,600	23,600	
	走行時間	[分]	1.7	1.5	
	走行時間費用	[億円/年]	2.5	6.2	
②主な周辺道路	九州縦貫 自動車道 : 87.9km	交通量	[台/日]	8,400	7,100
		走行時間	[分]	69	69
		走行時間費用	[億円/年]	112	96
	国道10号 : 11.5km	交通量	[台/日]	20,000	11,900
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	65	37
	(主)都城 霧島公園 線 : 25.3km	交通量	[台/日]	7,500	6,600
		走行時間	[分]	40	39
		走行時間費用	[億円/年]	56	47
	(県)財部 庄内安久 線 : 19.9km	交通量	[台/日]	7,800	7,100
		走行時間	[分]	36	36
		走行時間費用	[億円/年]	50	45
	(県)飯野 松山都城 線 : 9.0km	交通量	[台/日]	10,500	8,600
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	26	21
③その他道路合計 : 3,693.9km	走行時間費用	[億円/年]	5,029	5,024	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 3,855.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5,341	5,301	40

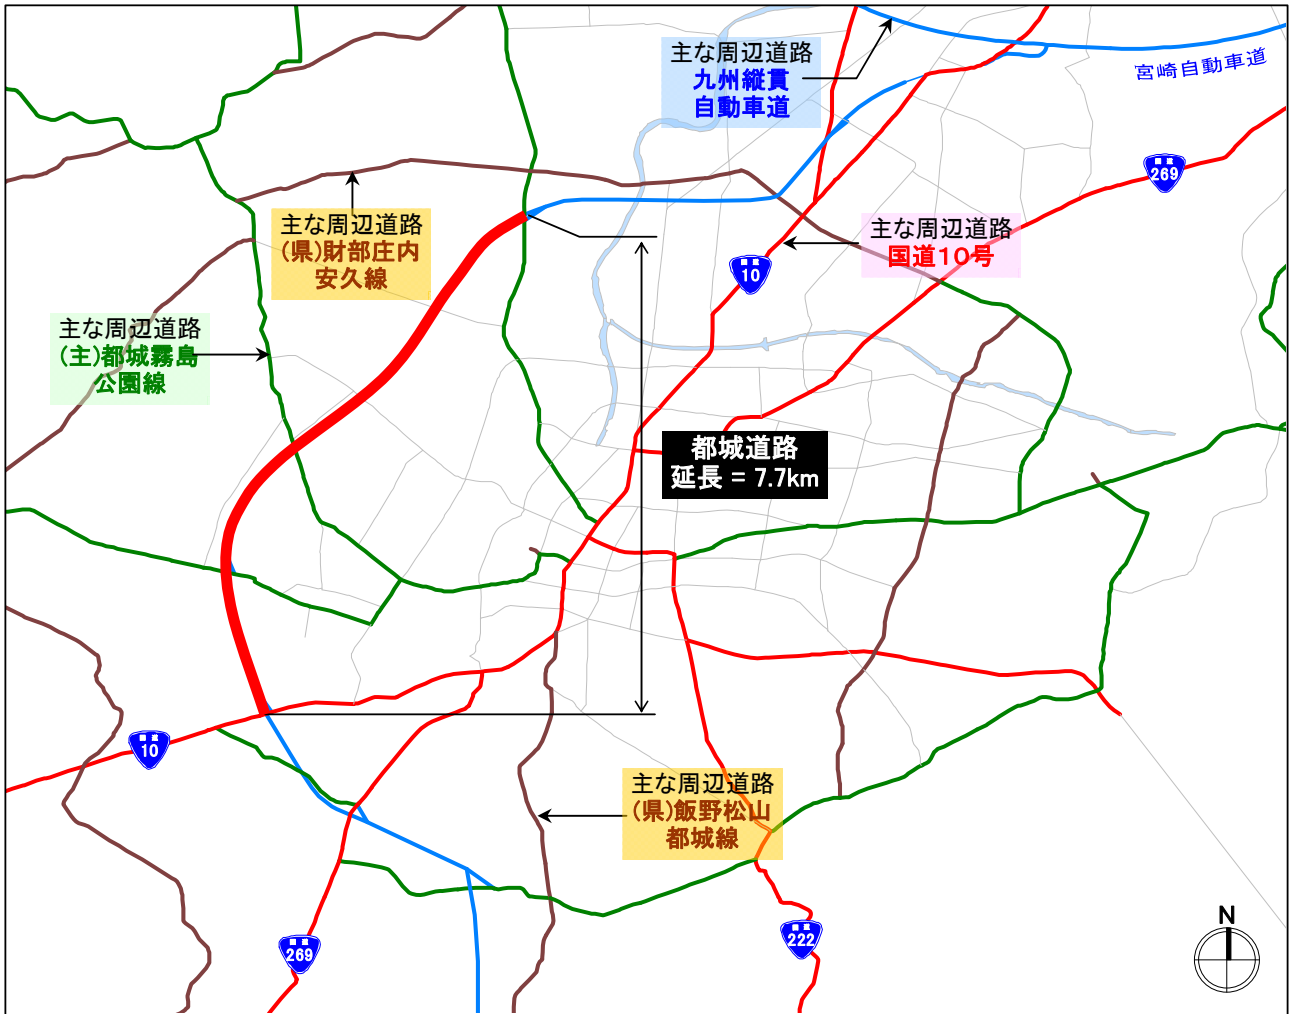

費用便益分析の条件

事業名: 国道10号 都城道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成24年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/> ()	
	複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H17, H42)	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみを推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (平成17年センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()	<input type="checkbox"/>		

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 国道10号 都城道路 (事業全体)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				0.22		7.7	1.67
-13年目	H 11	1.6651	108.4	0.87	1.25		
-12年目	H 12	1.6010	107.2	0.80	1.12		
-11年目	H 13	1.5395	105.7	1.80	2.45		
-10年目	H 14	1.4802	103.8	0.59	0.78		
-9年目	H 15	1.4233	102.3	2.77	3.61		
-8年目	H 16	1.3686	101.0	4.87	6.19		
-7年目	H 17	1.3159	99.6	6.31	7.82		
-6年目	H 18	1.2653	98.7	14.55	17.49		
-5年目	H 19	1.2167	97.6	21.07	24.64		
-4年目	H 20	1.1699	96.8	28.73	32.57		
-3年目	H 21	1.1249	95.6	19.75	21.80		
-2年目	H 22	1.0816	93.8	25.88	27.99		
-1年目	H 23	1.0400	93.8	6.71	6.98		
供用開始年次	H 24	1.0000	93.8	5.21	5.21	0.28	0.28
1年目	H 25	0.9615	93.8	11.16	10.73	0.28	0.27
2年目	H 26	0.9246	93.8	14.36	13.28	0.28	0.26
3年目	H 27	0.8890	93.8	17.58	15.63	0.28	0.25
4年目	H 28	0.8548	93.8	18.16	15.53	0.28	0.24
5年目	H 29	0.8219	93.8	16.04	13.18	0.28	0.23
6年目	H 30	0.7903	93.8	5.95	4.70	0.63	0.50
7年目	H 31	0.7599	93.8	8.25	6.27	0.63	0.48
8年目	H 32	0.7307	93.8	8.18	5.98	0.63	0.46
9年目	H 33	0.7026	93.8	12.29	8.63	1.03	0.72
10年目	H 34	0.6756	93.8	14.29	9.65	1.03	0.69
11年目	H 35	0.6496	93.8	19.22	12.49	1.03	0.67
12年目	H 36	0.6246	93.8	20.02	12.50	1.03	0.64
13年目	H 37	0.6006	93.8	12.29	7.38	1.03	0.62
14年目	H 38	0.5775	93.8			1.59	0.92
15年目	H 39	0.5553	93.8			1.59	0.88
16年目	H 40	0.5339	93.8			1.59	0.85
17年目	H 41	0.5134	93.8			1.59	0.82
18年目	H 42	0.4936	93.8			1.59	0.79
19年目	H 43	0.4746	93.8			1.59	0.75
20年目	H 44	0.4564	93.8			1.59	0.73
21年目	H 45	0.4388	93.8			1.59	0.70
22年目	H 46	0.4220	93.8			1.59	0.67
23年目	H 47	0.4057	93.8			1.59	0.65
24年目	H 48	0.3901	93.8			1.59	0.62
25年目	H 49	0.3751	93.8			1.59	0.60
26年目	H 50	0.3607	93.8			1.59	0.57
27年目	H 51	0.3468	93.8			1.59	0.55
28年目	H 52	0.3335	93.8			1.59	0.53
29年目	H 53	0.3207	93.8			1.59	0.51
30年目	H 54	0.3083	93.8			1.59	0.49
31年目	H 55	0.2965	93.8			1.59	0.47
32年目	H 56	0.2851	93.8			1.59	0.45
33年目	H 57	0.2741	93.8			1.59	0.44
34年目	H 58	0.2636	93.8			1.59	0.42
35年目	H 59	0.2534	93.8			1.59	0.40
36年目	H 60	0.2437	93.8			1.59	0.39
37年目	H 61	0.2343	93.8			1.59	0.37
38年目	H 62	0.2253	93.8			1.59	0.36
39年目	H 63	0.2166	93.8			1.59	0.34
40年目	H 64	0.2083	93.8			1.59	0.33
41年目	H 65	0.2003	93.8			1.59	0.32
42年目	H 66	0.1926	93.8			1.59	0.31
43年目	H 67	0.1852	93.8			1.59	0.29
44年目	H 68	0.1780	93.8			1.59	0.28
45年目	H 69	0.1712	93.8			1.59	0.27
46年目	H 70	0.1646	93.8			1.59	0.26
47年目	H 71	0.1583	93.8			1.59	0.25
48年目	H 72	0.1522	93.8			1.59	0.24
49年目	H 73	0.1463	93.8			1.59	0.23
合計				283.46	290.84	65.94	24.35
単純事業費計				317.67		65.94	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:国道10号 都城道路(残事業)

				単価(億円)	延長(km)	単価(億円)		
				0.18	7.7	1.36		
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		
				単価単価	現在価値	単価単価	現在価値	
-5年目	H 25	0.9615	93.8	11.16	10.73			
-4年目	H 26	0.9246	93.8	14.36	13.28			
-3年目	H 27	0.8890	93.8	17.58	15.63			
-2年目	H 28	0.8548	93.8	18.16	15.53			
-1年目	H 29	0.8219	93.8	16.04	13.18			
供用開始年次	H 30	0.7903	93.8	5.95	4.70	0.34	0.27	
1年目	H 31	0.7599	93.8	8.25	6.27	0.34	0.26	
2年目	H 32	0.7307	93.8	8.18	5.98	0.34	0.25	
3年目	H 33	0.7026	93.8	12.29	8.63	0.73	0.52	
4年目	H 34	0.6756	93.8	14.29	9.65	0.73	0.50	
5年目	H 35	0.6496	93.8	19.22	12.49	0.73	0.48	
6年目	H 36	0.6246	93.8	20.02	12.50	0.73	0.46	
7年目	H 37	0.6006	93.8	12.29	7.38	0.73	0.44	
8年目	H 38	0.5775	93.8			1.30	0.75	
9年目	H 39	0.5553	93.8			1.30	0.72	
10年目	H 40	0.5339	93.8			1.30	0.69	
11年目	H 41	0.5134	93.8			1.30	0.66	
12年目	H 42	0.4936	93.8			1.30	0.64	
13年目	H 43	0.4746	93.8			1.30	0.61	
14年目	H 44	0.4564	93.8			1.30	0.59	
15年目	H 45	0.4388	93.8			1.30	0.57	
16年目	H 46	0.4220	93.8			1.30	0.55	
17年目	H 47	0.4057	93.8			1.30	0.53	
18年目	H 48	0.3901	93.8			1.30	0.51	
19年目	H 49	0.3751	93.8			1.30	0.49	
20年目	H 50	0.3607	93.8			1.30	0.47	
21年目	H 51	0.3468	93.8			1.30	0.45	
22年目	H 52	0.3335	93.8			1.30	0.43	
23年目	H 53	0.3207	93.8			1.30	0.42	
24年目	H 54	0.3083	93.8			1.30	0.40	
25年目	H 55	0.2965	93.8			1.30	0.38	
26年目	H 56	0.2851	93.8			1.30	0.37	
27年目	H 57	0.2741	93.8			1.30	0.36	
28年目	H 58	0.2636	93.8			1.30	0.34	
29年目	H 59	0.2534	93.8			1.30	0.33	
30年目	H 60	0.2437	93.8			1.30	0.32	
31年目	H 61	0.2343	93.8			1.30	0.30	
32年目	H 62	0.2253	93.8			1.30	0.29	
33年目	H 63	0.2166	93.8			1.30	0.28	
34年目	H 64	0.2083	93.8			1.30	0.27	
35年目	H 65	0.2003	93.8			1.30	0.26	
36年目	H 66	0.1926	93.8			1.30	0.25	
37年目	H 67	0.1852	93.8			1.30	0.24	
38年目	H 68	0.1780	93.8			1.30	0.23	
39年目	H 69	0.1712	93.8			1.30	0.22	
40年目	H 70	0.1646	93.8			1.30	0.21	
41年目	H 71	0.1583	93.8			1.30	0.21	
42年目	H 72	0.1522	93.8			1.30	0.20	
43年目	H 73	0.1463	93.8			1.30	0.19	
44年目	H 74	0.1407	93.8			1.30	0.18	
45年目	H 75	0.1353	93.8			1.30	0.18	
46年目	H 76	0.1301	93.8			1.30	0.17	
47年目	H 77	0.1251	93.8			1.30	0.16	
48年目	H 78	0.1203	93.8			1.30	0.16	
49年目	H 79	0.1157	93.8	-10.14	-1.17	1.30	0.15	
合計				167.64	134.77	59.10	18.87	
単純事業費計				177.78		59.10		

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

