

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道277号 雲石道路
事業主体	北海道開発局

●事業の効果や必要性の評価に対応する事後評価項目

政策目標	指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切道の除去もしくは交通改善の状況	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	バス路線：八雲町八雲駅前～江差町江差ターミナル 2往復/日
		<input checked="" type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	特急停車駅：JR八雲駅 特急24本/日停車
		<input type="checkbox"/> 空港法による空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは国際拠点港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	熊石地域から森町の水産加工場へナマコの輸送 約79 t/年 熊石地域から新千歳空港へバカガイの輸送 約8 t/年 熊石地域から八雲地域の醸造食品会社へ海洋深層水の輸送 約20 t/年
		<input type="checkbox"/> 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行われたことによる効果	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となった	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する			

		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間が解消	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消	狭小幅員区間が解消（車道幅員5.5m→6.5m）
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上の状況	日常活動圏中心都市：旧八雲町市街地部 所要時間の短縮：夏季57分→34分 冬季54分→37分（R5交点～R229交点間）
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	熊石地域マリンビジョン計画（2006～）
		<input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上による効果	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共施設へと直結されたことによる効果	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化された	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成	
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上の状況	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	曲線半径80m未満13箇所の線形不良区間の解消 死傷事故率：開通前（H9～H11）12.0件/億台km→開通後（H26～H28）0件/億台km
		<input type="checkbox"/> 歩道がない又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	第二次緊急輸送道路に指定
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	回避された現道の防災点検対策箇所：落石・崩壊、岩石崩落6箇所、地すべり・盛土7箇所、雪崩3箇所、
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：532t-CO <sub>2</sub> /年
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果	

5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的整備の必要性又は一体的整備による効果	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに関する効果	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拮・BP・その他の別
一般国道277号	雲石道路	L=5.4Km	二次改築	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
1,500	2	北海道開発局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成 30 年度		
単純合計	154億円	18億円	172億円
基準年における 現在価値 (C)	252億円	9.4億円	261億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成 30 年度			
供用年	平成 26 年度			
単年便益 (初年便益)	3.2億円	0.24億円	0.03億円	3.5億円
基準年における 現在価値 (B)	77億円	5.8億円	0.64億円	83億円

## 交通状況の変化(事業全体)

事業名:雲石道路


(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]  5.4km	交通量	[台/日]	0	1,500	
	走行時間	[分]	0.0	6.2	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	1.78	
②主な周 辺道路  5.8km	交通量	[台/日]	1,200	0	
	走行時間	[分]	16.1	0.0	
	走行時間費用	[億円/年]	3.54	0.00	
③その他道路合計 :26388.9km		走行時間費用	[億円/年]	19889.80	19888.57
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 26400.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	19893.34	19890.35	2.99

事業名:雲石道路

---

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】

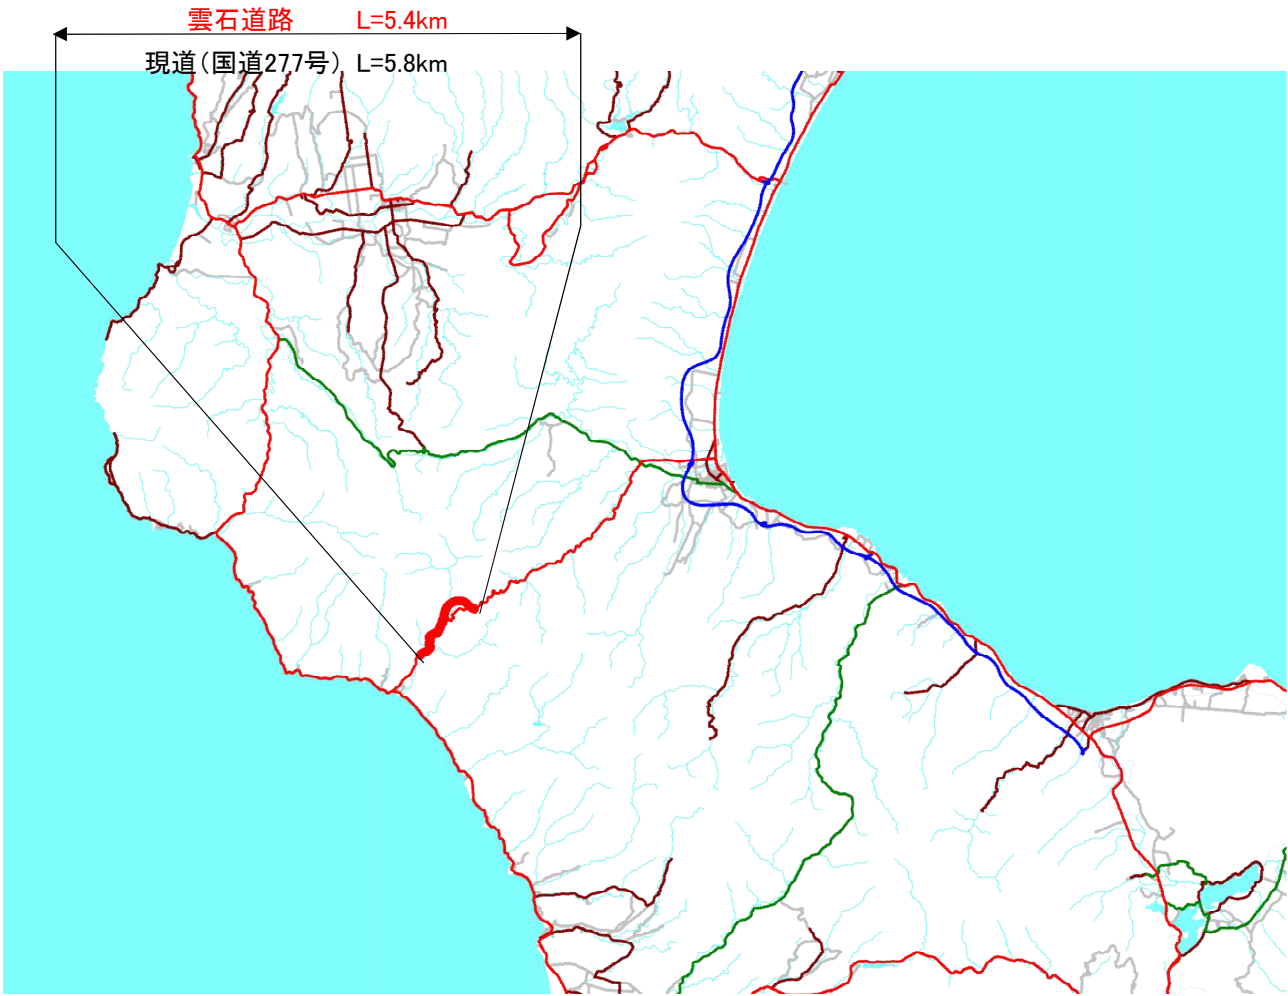

# 費用便益分析の条件

事業名：雲石道路

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成30年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計の場合 いずれかのみ推計とした理由を記載	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他( )	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	( )台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由 小規模事業である	<input type="checkbox"/>
	山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )		
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	その他( )	<input type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		( ) %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載 当該区間の通行止め実績を踏まえ、3.3日と設定	( 3.3 ) 日
			とり止め交通の考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
考慮する		<input checked="" type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 函館開発建設部管内の直近3ヶ年(平成27年～平成29年)における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、102日と設定	(102) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				





費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道277号 雲石道路

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.07	5.4	0.39

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-24年目	H 2	2.9987	113.25	0.01	0.03	0.00	0.00
-23年目	H 3	2.8834	115.98	0.02	0.04	0.00	0.00
-22年目	H 4	2.7725	117.57	1.00	2.43	0.00	0.00
-21年目	H 5	2.6658	117.91	0.93	2.16	0.00	0.00
-20年目	H 6	2.5633	117.80	1.72	3.86	0.00	0.00
-19年目	H 7	2.4647	117.10	6.05	13.10	0.00	0.00
-18年目	H 8	2.3699	116.60	3.00	6.28	0.00	0.00
-17年目	H 9	2.2788	117.50	7.98	15.92	0.00	0.00
-16年目	H 10	2.1911	116.90	3.59	6.93	0.00	0.00
-15年目	H 11	2.1068	115.20	2.14	4.03	0.00	0.00
-14年目	H 12	2.0258	113.80	7.69	14.08	0.00	0.00
-13年目	H 13	1.9479	112.40	6.23	11.11	0.00	0.00
-12年目	H 14	1.8730	110.50	5.65	9.85	0.00	0.00
-11年目	H 15	1.8009	109.00	6.39	10.86	0.00	0.00
-10年目	H 16	1.7317	107.90	14.19	23.42	0.00	0.00
-9年目	H 17	1.6651	106.70	7.15	11.46	0.00	0.00
-8年目	H 18	1.6010	105.90	14.78	22.97	0.00	0.00
-7年目	H 19	1.5395	105.00	16.50	24.88	0.00	0.00
-6年目	H 20	1.4802	104.40	12.43	18.11	0.00	0.00
-5年目	H 21	1.4233	103.00	14.45	20.52	0.00	0.00
-4年目	H 22	1.3686	101.30	6.95	9.66	0.00	0.00
-3年目	H 23	1.3159	99.80	5.22	7.07	0.00	0.00
-2年目	H 24	1.2653	99.00	5.12	6.73	0.00	0.00
-1年目	H 25	1.2167	99.00	4.92	6.22	0.00	0.00
供用開始年次	H 26	1.1699	101.50	0.00	0.00	0.36	0.43
1年目	H 27	1.1249	103.00	0.00	0.00	0.36	0.41
2年目	H 28	1.0816	102.80	0.00	0.00	0.36	0.39
3年目	H 29	1.0400	102.80	0.00	0.00	0.36	0.38
4年目	H 30	1.0000	102.80	0.00	0.00	0.36	0.36
5年目	H 31	0.9615	102.80	0.00	0.00	0.36	0.35
6年目	H 32	0.9246	102.80	0.00	0.00	0.36	0.33
7年目	H 33	0.8890	102.80	0.00	0.00	0.36	0.32
8年目	H 34	0.8548	102.80	0.00	0.00	0.36	0.31
9年目	H 35	0.8219	102.80	0.00	0.00	0.36	0.30
10年目	H 36	0.7903	102.80	0.00	0.00	0.36	0.29
11年目	H 37	0.7599	102.80	0.00	0.00	0.36	0.27
12年目	H 38	0.7307	102.80	0.00	0.00	0.36	0.26
13年目	H 39	0.7026	102.80	0.00	0.00	0.36	0.25
14年目	H 40	0.6756	102.80	0.00	0.00	0.36	0.24
15年目	H 41	0.6496	102.80	0.00	0.00	0.36	0.23
16年目	H 42	0.6246	102.80	0.00	0.00	0.36	0.23
17年目	H 43	0.6006	102.80	0.00	0.00	0.36	0.22
18年目	H 44	0.5775	102.80	0.00	0.00	0.36	0.21
19年目	H 45	0.5553	102.80	0.00	0.00	0.36	0.20
20年目	H 46	0.5339	102.80	0.00	0.00	0.36	0.19
21年目	H 47	0.5134	102.80	0.00	0.00	0.36	0.19
22年目	H 48	0.4936	102.80	0.00	0.00	0.36	0.18
23年目	H 49	0.4746	102.80	0.00	0.00	0.36	0.17
24年目	H 50	0.4564	102.80	0.00	0.00	0.36	0.16
25年目	H 51	0.4388	102.80	0.00	0.00	0.36	0.16
26年目	H 52	0.4220	102.80	0.00	0.00	0.36	0.15
27年目	H 53	0.4057	102.80	0.00	0.00	0.36	0.15
28年目	H 54	0.3901	102.80	0.00	0.00	0.36	0.14
29年目	H 55	0.3751	102.80	0.00	0.00	0.36	0.14
30年目	H 56	0.3607	102.80	0.00	0.00	0.36	0.13
31年目	H 57	0.3468	102.80	0.00	0.00	0.36	0.13
32年目	H 58	0.3335	102.80	0.00	0.00	0.36	0.12
33年目	H 59	0.3207	102.80	0.00	0.00	0.36	0.12
34年目	H 60	0.3083	102.80	0.00	0.00	0.36	0.11
35年目	H 61	0.2965	102.80	0.00	0.00	0.36	0.11
36年目	H 62	0.2851	102.80	0.00	0.00	0.36	0.10
37年目	H 63	0.2741	102.80	0.00	0.00	0.36	0.10
38年目	H 64	0.2636	102.80	0.00	0.00	0.36	0.10
39年目	H 65	0.2534	102.80	0.00	0.00	0.36	0.09
40年目	H 66	0.2437	102.80	0.00	0.00	0.36	0.09
41年目	H 67	0.2343	102.80	0.00	0.00	0.36	0.08
42年目	H 68	0.2253	102.80	0.00	0.00	0.36	0.08
43年目	H 69	0.2166	102.80	0.00	0.00	0.36	0.08
44年目	H 70	0.2083	102.80	0.00	0.00	0.36	0.08
45年目	H 71	0.2003	102.80	0.00	0.00	0.36	0.07
46年目	H 72	0.1926	102.80	0.00	0.00	0.36	0.07
47年目	H 73	0.1852	102.80	0.00	0.00	0.36	0.07
48年目	H 74	0.1780	102.80	0.00	0.00	0.36	0.06
49年目	H 75	0.1712	102.80	-0.48	-0.08	0.36	0.06
合計				153.67	251.63	18.06	9.44
単純事業費計				154.15		18.06	

注1) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道277号 雲石道路

年次	年度 (基準年) H30	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	1.00093	0.98783	1.01396	1.00101	1.1699	101.5000	1.93	0.43	0.86	3.23	3.82	0.15	0.02	0.07	0.24	0.28	0.03	0.03	3.49	4.14
1年目	H 27	0.98956	0.97634	1.00236	0.98964	1.1249	103.0000	1.93	0.43	0.87	3.23	3.63	0.15	0.02	0.07	0.24	0.27	0.03	0.03	3.50	3.93
2年目	H 28	0.99108	0.97756	1.00383	0.99116	1.0816	102.8000	1.91	0.42	0.88	3.21	3.47	0.15	0.02	0.07	0.24	0.26	0.03	0.03	3.47	3.75
3年目	H 29	0.99262	0.97880	1.00532	0.99270	1.0400	102.8000	1.90	0.41	0.88	3.18	3.31	0.15	0.02	0.07	0.24	0.25	0.03	0.03	3.45	3.58
4年目	H 30	0.99339	0.97926	1.00603	0.99347	1.0000	102.8000	1.88	0.40	0.88	3.17	3.17	0.15	0.02	0.07	0.24	0.24	0.03	0.03	3.43	3.43
5年目	H 31	0.99562	0.98115	1.00822	0.99570	0.9615	102.8000	1.87	0.39	0.89	3.15	3.03	0.14	0.02	0.07	0.23	0.23	0.03	0.03	3.41	3.28
6年目	H 32	0.99559	0.97981	1.00079	0.99448	0.9246	102.8000	1.86	0.38	0.90	3.14	2.90	0.14	0.02	0.08	0.23	0.22	0.03	0.02	3.40	3.15
7年目	H 33	0.99557	0.97939	1.00079	0.99445	0.8890	102.8000	1.85	0.38	0.90	3.13	2.78	0.14	0.02	0.08	0.23	0.21	0.03	0.02	3.39	3.01
8年目	H 34	0.99555	0.97896	1.00079	0.99442	0.8548	102.8000	1.84	0.37	0.90	3.11	2.66	0.14	0.01	0.08	0.23	0.20	0.03	0.02	3.37	3.01
9年目	H 35	0.99553	0.97850	1.00079	0.99438	0.8219	102.8000	1.84	0.36	0.90	3.10	2.54	0.14	0.01	0.08	0.23	0.19	0.03	0.02	3.35	2.76
10年目	H 36	0.99551	0.97803	1.00078	0.99435	0.7903	102.8000	1.83	0.35	0.90	3.08	2.43	0.14	0.01	0.08	0.23	0.18	0.03	0.02	3.34	2.64
11年目	H 37	0.99549	0.97754	1.00078	0.99432	0.7599	102.8000	1.82	0.34	0.90	3.07	2.33	0.14	0.01	0.08	0.23	0.17	0.03	0.02	3.32	2.52
12年目	H 38	0.99547	0.97702	1.00078	0.99429	0.7307	102.8000	1.81	0.34	0.90	3.05	2.23	0.14	0.01	0.08	0.23	0.17	0.03	0.02	3.30	2.41
13年目	H 39	0.99545	0.97648	1.00078	0.99426	0.7026	102.8000	1.80	0.33	0.90	3.04	2.13	0.14	0.01	0.08	0.23	0.16	0.03	0.02	3.29	2.31
14年目	H 40	0.99543	0.97591	1.00078	0.99422	0.6756	102.8000	1.80	0.32	0.90	3.02	2.04	0.14	0.01	0.08	0.23	0.15	0.03	0.02	3.27	2.21
15年目	H 41	0.99541	0.97532	1.00078	0.99419	0.6496	102.8000	1.79	0.31	0.90	3.00	1.95	0.14	0.01	0.08	0.23	0.15	0.03	0.02	3.26	2.12
16年目	H 42	0.99054	0.98886	0.99675	0.99134	0.6246	102.8000	1.78	0.31	0.90	2.99	1.87	0.14	0.01	0.08	0.23	0.14	0.03	0.02	3.24	2.02
17年目	H 43	0.99044	0.98874	0.99674	0.99126	0.6006	102.8000	1.76	0.30	0.90	2.97	1.78	0.14	0.01	0.08	0.22	0.13	0.02	0.01	3.21	1.93
18年目	H 44	0.99035	0.98861	0.99673	0.99119	0.5775	102.8000	1.75	0.30	0.90	2.94	1.70	0.13	0.01	0.08	0.22	0.13	0.02	0.01	3.19	1.84
19年目	H 45	0.99026	0.98848	0.99672	0.99111	0.5553	102.8000	1.73	0.30	0.90	2.92	1.62	0.13	0.01	0.07	0.22	0.12	0.02	0.01	3.16	1.76
20年目	H 46	0.99016	0.98834	0.99671	0.99103	0.5339	102.8000	1.71	0.29	0.89	2.90	1.55	0.13	0.01	0.07	0.22	0.12	0.02	0.01	3.14	1.68
21年目	H 47	0.99007	0.98820	0.99670	0.99095	0.5134	102.8000	1.69	0.29	0.89	2.87	1.48	0.13	0.01	0.07	0.22	0.11	0.02	0.01	3.11	1.60
22年目	H 48	0.98997	0.98806	0.99669	0.99086	0.4936	102.8000	1.68	0.29	0.89	2.85	1.41	0.13	0.01	0.07	0.22	0.11	0.02	0.01	3.09	1.52
23年目	H 49	0.98986	0.98792	0.99668	0.99078	0.4746	102.8000	1.66	0.28	0.88	2.83	1.34	0.13	0.01	0.07	0.21	0.10	0.02	0.01	3.06	1.45
24年目	H 50	0.98976	0.98777	0.99666	0.99069	0.4564	102.8000	1.64	0.28	0.88	2.80	1.28	0.13	0.01	0.07	0.21	0.10	0.02	0.01	3.04	1.39
25年目	H 51	0.98965	0.98762	0.99665	0.99061	0.4388	102.8000	1.63	0.28	0.88	2.78	1.22	0.13	0.01	0.07	0.21	0.09	0.02	0.01	3.01	1.32
26年目	H 52	0.98955	0.98747	0.99664	0.99052	0.4220	102.8000	1.61	0.27	0.87	2.76	1.16	0.12	0.01	0.07	0.21	0.09	0.02	0.01	2.99	1.26
27年目	H 53	0.98944	0.98731	0.99663	0.99043	0.4057	102.8000	1.59	0.27	0.87	2.73	1.11	0.12	0.01	0.07	0.21	0.08	0.02	0.01	2.96	1.20
28年目	H 54	0.98932	0.98714	0.99662	0.99034	0.3901	102.8000	1.58	0.27	0.87	2.71	1.06	0.12	0.01	0.07	0.21	0.08	0.02	0.01	2.94	1.15
29年目	H 55	0.98921	0.98698	0.99661	0.99024	0.3751	102.8000	1.56	0.26	0.87	2.69	1.01	0.12	0.01	0.07	0.20	0.08	0.02	0.01	2.91	1.09
30年目	H 56	0.98909	0.98680	0.99660	0.99014	0.3607	102.8000	1.54	0.26	0.86	2.66	0.96	0.12	0.01	0.07	0.20	0.07	0.02	0.01	2.89	1.04
31年目	H 57	0.98897	0.98663	0.99658	0.99005	0.3468	102.8000	1.53	0.26	0.86	2.64	0.92	0.12	0.01	0.07	0.20	0.07	0.02	0.01	2.86	0.99
32年目	H 58	0.98885	0.98645	0.99657	0.98995	0.3335	102.8000	1.51	0.25	0.86	2.62	0.87	0.12	0.01	0.07	0.20	0.07	0.02	0.01	2.84	0.95
33年目	H 59	0.98872	0.98626	0.99656	0.98984	0.3207	102.8000	1.49	0.25	0.85	2.60	0.83	0.12	0.01	0.07	0.20	0.06	0.02	0.01	2.81	0.90
34年目	H 60	0.98859	0.98607	0.99655	0.98974	0.3083	102.8000	1.48	0.24	0.85	2.57	0.79	0.11	0.01	0.07	0.19	0.06	0.02	0.01	2.79	0.86
35年目	H 61	0.98846	0.98587	0.99654	0.98963	0.2965	102.8000	1.46	0.24	0.85	2.55	0.76	0.11	0.01	0.07	0.19	0.06	0.02	0.01	2.76	0.82
36年目	H 62	0.98833	0.98567	0.99653	0.98953	0.2851	102.8000	1.44	0.24	0.85	2.53	0.72	0.11	0.01	0.07	0.19	0.05	0.02	0.01	2.74	0.78
37年目	H 63	0.98819	0.98546	0.99651	0.98941	0.2741	102.8000	1.43	0.23	0.84	2.50	0.69	0.11	0.01	0.07	0.19	0.05	0.02	0.01	2.71	0.74
38年目	H 64	0.98805	0.98525	0.99650	0.98930	0.2636	102.8000	1.41	0.23	0.84	2.48	0.65	0.11	0.01	0.07	0.19	0.05	0.02	0.01	2.69	0.71
39年目	H 65	0.98790	0.98502	0.99649	0.98919	0.2534	102.8000	1.39	0.23	0.84	2.46	0.62	0.11	0.01	0.07	0.19	0.05	0.02	0.01	2.66	0.67
40年目	H 66	0.98775	0.98480	0.99648	0.98907	0.2437	102.8000	1.37	0.22	0.83	2.43	0.59	0.11	0.01	0.07	0.18	0.05	0.02	0.00	2.64	0.64
41年目	H 67	0.98760	0.98456	0.99646	0.98895	0.2343	102.8000	1.36	0.22	0.83	2.41	0.56	0.10	0.01	0.07	0.18	0.04	0.02	0.00	2.61	0.61
42年目	H 68	0.98745	0.98432	0.99645	0.98882	0.2253	102.8000	1.34	0.22	0.83	2.39	0.54	0.10	0.01	0.07	0.18	0.04	0.02	0.00	2.59	0.58
43年目	H 69	0.98729	0.98407	0.99644	0.98870	0.2166	102.8000	1.32	0.21	0.82	2.36	0.51	0.10	0.01	0.07	0.18	0.04	0.02	0.00	2.56	0.56
44年目	H 70	0.98712	0.98381	0.99643	0.98857	0.2083	102.8000	1.31	0.21	0.82	2.34	0.49	0.10	0.01	0.07	0.18	0.04	0.02	0.00	2.54	0.53
45年目	H 71	0.98695	0.98355	0.99641	0.98844	0.2003	102.8000	1.29	0.21	0.82	2.32	0.46	0.10	0.01	0.07	0.18	0.04	0.02	0.00	2.51	0.50
46年目	H 72	0.98678	0.98327	0.99640	0.98830	0.1926	102.8000	1.27	0.20	0.82	2.29	0.44	0.10	0.01	0.07	0.17	0.03	0.02	0.00	2.49	0.48
47年目	H 73	0.98661	0.98299	0.99639	0.98816	0.1852	102.8000	1.26	0.20	0.81	2.27	0.42	0.10	0.01	0.07	0.17	0.03	0.02	0.00	2.46	0.46
48年目	H 74	0.98642	0.98269	0.99637	0.98802	0.1780	102.8000	1.24	0.20	0.81	2.25	0.40	0.10	0.01	0.07	0.17	0.03	0.02	0.00	2.44	0.43
49年目	H 75	0.98624	0.98239	0.99636	0.98787	0.1712	102.8000	1.22	0.19	0.81	2.22	0.38	0.09	0.01	0.07	0.17	0.03	0.02	0.00	2.41	0.41
合 計								80.70	14.46	43.37	138.53	76.63	6.22	0.59	3.63	10.44	5.75	1.15	0.64	150.12	83.02
