

記入要領

- ・当該事業によるアウトカム指標の変化を把握
- ・道路種別により、評価項目は適宜変更
- ・効果が認められる評価項目は口を■に変更
- ・●印の評価項目については定量的評価の結果を記載

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道2号 戸田拡幅
事業主体	中国地方整備局

●事業の効果や必要性の評価に対応する事後評価項目

政策目標	指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力 円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間a(費用便益分析対象区間)について 渋滞損失時間(整備無):16,372千人・時間/年 渋滞損失削減時間:531千人・時間/年(16,372千人・時間/年⇒15,841千人・時間/年) 区間b(当該区間/並行区間)について 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間:729千人・時間/年【戸田拡幅(周南市戸田)】 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率:約86.9%【戸田拡幅(周南市戸田)】	
	○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況		
	○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況		
	● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	事業区間の定時性向上により、都市間高速バスの運行ルートが事業区間経由に変更され、高速バス停留所が4箇所新設。 新設バス停:西国衙・牟礼・末田・湯野温泉口	
	● 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	防府市～徳山駅、66分⇒49分	
	○ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況		
	物流効率化の支援	● 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	防府市～徳山下松港、67分⇒50分
		○ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	
		□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
	都市の再生	○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成(又は一部形成)されたことによる効果			
○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果			
○ 中心市街地内で行われたことによる効果			
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である			
□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上			
□ 対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となった			

国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり		
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり		
	<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	周南市～防府市、65分⇒47分	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間が解消		
	<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消		
	<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況		
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況		
	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	道の駅「ソレーネ周年」が開業（H26.5）（H29年度 77.6万人）	
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上による効果	観光振興協定を締結している防府市・周南市間の所要時間が短縮、65分⇒47分	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果		
2.暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input checked="" type="checkbox"/> 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	周南市戸田地区において自転車歩行者道を整備（幅員 1.75m⇒3.50m）
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された	
無電柱化による美しい町並みの形成	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成	
安全で安心できるくらしの確保		<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上の状況	

3. 安全	安全な生活環境の確保	● 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	死傷事故件数：13.5件/年→7.3件/年（6.2件/年減少）
		○ 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	
	災害への備え	□ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消	
		■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	緊急輸送道路ネットワークの信頼性が向上 （山口県緊急輸送道路ネットワーク計画の第一次緊急輸送道路に位置付け（国道2号））
		■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	第一次緊急輸送道路である山陽自動車道の代替路線として機能
		□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能	
		□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	
□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消			
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：約3.7千t/年 排出削減率：約0.3%削減（整備なし：1,217.3千t/年 ⇒ 整備あり：1,213.6千t/年）
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間：費用便益分析算定範囲 NOX排出削減量：約19.8t/年 排出削減率：約0.6%削減（整備なし：3,181.3t/年 ⇒ 整備あり：3,161.5t/年）
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間：費用便益分析算定範囲 SPM排出削減量：約1.0t/年 排出削減率：約0.6%削減（整備なし：159.4t/年 ⇒ 整備あり：158.4t/年）
		○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	
		○ その他、環境や景観上の効果	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	● 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	隣接する一般国道2号富海拡幅（平成23年度事業化）の整備により日常生活における利便性の向上が期待
		○ 他機関との連携プログラムに関する効果	
	その他	○ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その 他の別
一般国道2号	戸田拡幅	L=2.4km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
40,100~44,800	4	中国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成30年度		
単純合計	78億円	37億円	115億円
基準年における 現在価値(C)	110億円	19億円	129億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成30年度			
供用年	平成26年度			
単年便益 (初年便益)	5.7億円	0.35億円	0.03億円	6.1億円
基準年における 現在価値(B)	135億円	8.9億円	0.68億円	144億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	1.1
経済的純現在価値(事業全体)	15億円
経済的内部収益率(事業全体)	4.7%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道2号 戸田拡幅(事業全体)


(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 :2.4km	交通量 ^{※1}	[台/日]	40,400	42,100	
	走行時間 ^{※2}	[分]	6	3	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	44.64	27.20	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道376号他 :32.0km	交通量	[台/日]	4,600	4,200
		走行時間	[分]	46	46
		走行時間費用	[億円/年]	40.13	36.47
	山陽道 :30.6km	交通量	[台/日]	27,000	26,100
		走行時間	[分]	18	18
		走行時間費用	[億円/年]	103.32	99.76
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計 :1182.7km	走行時間費用	[億円/年]	2,734.42	2,753.82	

		走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計:1247.7km	走行時間短縮便益 [億円/年]	2,922.49	2,917.25	5.25

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること

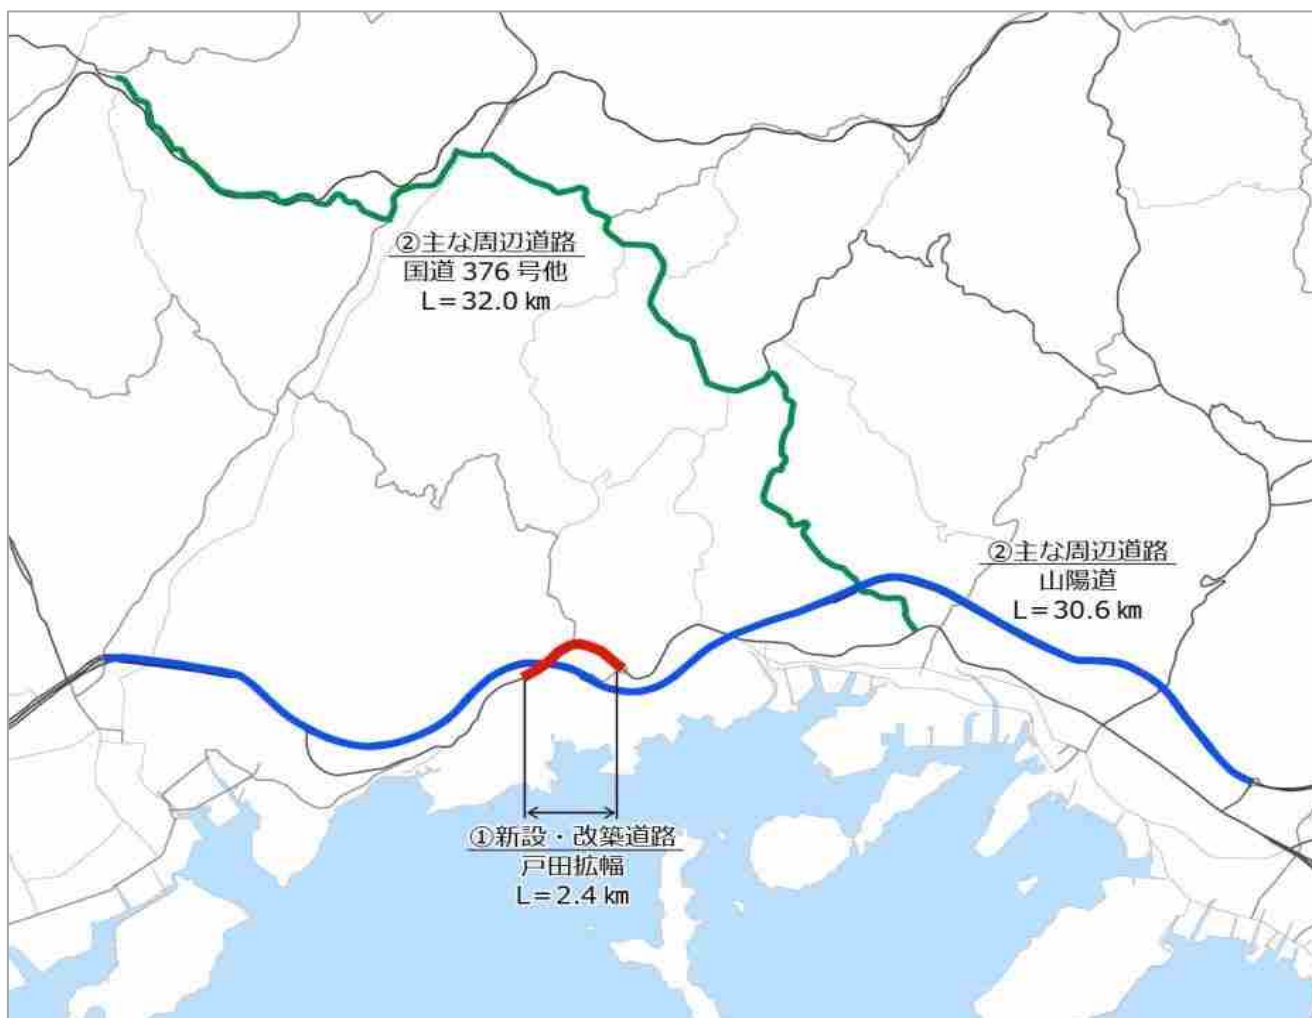

費用便益分析の条件

事業名:一般国道2号 戸田拡幅

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成30年度	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他(最終配分交通量とQV式との関係から平均速度を設定)	<input checked="" type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載 過去10年間の平均通行止め日数	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
	冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載			
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 戸田拡幅(事業全体)

採用単価の根拠 一般国道(雪寒費除く)		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.33	2.4	0.80

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-11年目	H15	1.8009	109.0	0.95	1.61		
-10年目	H16	1.7317	107.9	0.74	1.22		
-9年目	H17	1.6651	106.7	0.48	0.77		
-8年目	H18	1.6010	105.9	1.69	2.63		
-7年目	H19	1.5395	105.0	6.27	9.45		
-6年目	H20	1.4802	104.4	13.83	20.16		
-5年目	H21	1.4233	103.0	19.29	27.40		
-4年目	H22	1.3686	101.3	19.30	26.80		
-3年目	H23	1.3159	99.8	15.31	20.75		
-2年目	H24	1.2653	99.0	0.19	0.25		
-1年目	H25	1.2167	99.0				
供用開始年次	H26	1.1699	101.5			0.74	0.88
1年目	H27	1.1249	103.0			0.74	0.83
2年目	H28	1.0816	102.8			0.74	0.80
3年目	H29	1.0400	102.8			0.74	0.77
4年目	H30	1.0000	102.8			0.74	0.74
5年目	H31	0.9615	102.8			0.74	0.71
6年目	H32	0.9246	102.8			0.74	0.68
7年目	H33	0.8890	102.8			0.74	0.66
8年目	H34	0.8548	102.8			0.74	0.63
9年目	H35	0.8219	102.8			0.74	0.61
10年目	H36	0.7903	102.8			0.74	0.59
11年目	H37	0.7599	102.8			0.74	0.56
12年目	H38	0.7307	102.8			0.74	0.54
13年目	H39	0.7026	102.8			0.74	0.52
14年目	H40	0.6756	102.8			0.74	0.50
15年目	H41	0.6496	102.8			0.74	0.48
16年目	H42	0.6246	102.8			0.74	0.46
17年目	H43	0.6006	102.8			0.74	0.44
18年目	H44	0.5775	102.8			0.74	0.43
19年目	H45	0.5553	102.8			0.74	0.41
20年目	H46	0.5339	102.8			0.74	0.40
21年目	H47	0.5134	102.8			0.74	0.38
22年目	H48	0.4936	102.8			0.74	0.37
23年目	H49	0.4746	102.8			0.74	0.35
24年目	H50	0.4564	102.8			0.74	0.34
25年目	H51	0.4388	102.8			0.74	0.33
26年目	H52	0.4220	102.8			0.74	0.31
27年目	H53	0.4057	102.8			0.74	0.30
28年目	H54	0.3901	102.8			0.74	0.29
29年目	H55	0.3751	102.8			0.74	0.28
30年目	H56	0.3607	102.8			0.74	0.27
31年目	H57	0.3468	102.8			0.74	0.26
32年目	H58	0.3335	102.8			0.74	0.25
33年目	H59	0.3207	102.8			0.74	0.24
34年目	H60	0.3083	102.8			0.74	0.23
35年目	H61	0.2965	102.8			0.74	0.22
36年目	H62	0.2851	102.8			0.74	0.21
37年目	H63	0.2741	102.8			0.74	0.20
38年目	H64	0.2636	102.8			0.74	0.20
39年目	H65	0.2534	102.8			0.74	0.19
40年目	H66	0.2437	102.8			0.74	0.18
41年目	H67	0.2343	102.8			0.74	0.17
42年目	H68	0.2253	102.8			0.74	0.17
43年目	H69	0.2166	102.8			0.74	0.16
44年目	H70	0.2083	102.8			0.74	0.15
45年目	H71	0.2003	102.8			0.74	0.15
46年目	H72	0.1926	102.8			0.74	0.14
47年目	H73	0.1852	102.8			0.74	0.14
48年目	H74	0.1780	102.8			0.74	0.13
49年目	H75	0.1712	102.8	-7.34	-1.26	0.74	0.13
合計				70.71	109.79	37.04	19.37

単純事業費計		78.05	37.04
--------	--	-------	-------

注) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 戸田拡幅(事業全体)

年次	年度 (基準年) H30	総走行台キロの年次別伸び率 (山陽ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター (B)	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①*(A)*(B)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②*(A)*(B)	③	現在価値 ③*(A)*(B)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
1:完成供用	H26	0.99112	0.98841	1.00502	0.99240	1.1699	101.5	3.16	2.00	0.52	5.69	6.74	0.05	0.10	0.20	0.35	0.41	0.03	0.03	6.07	7.19
1年目	H27	1.00309	1.00033	1.01700	1.00439	1.1249	103.0	3.17	2.00	0.53	5.71	6.41	0.05	0.10	0.20	0.35	0.40	0.03	0.03	6.09	6.84
2年目	H28	0.99171	0.98896	1.00531	0.99299	1.0816	102.8	3.15	1.98	0.53	5.66	6.12	0.05	0.10	0.20	0.35	0.38	0.03	0.03	6.04	6.54
3年目	H29	0.99324	0.99047	1.00671	0.99453	1.0400	102.8	3.13	1.96	0.53	5.62	5.85	0.05	0.10	0.20	0.35	0.37	0.03	0.03	6.01	6.25
4年目	H30	0.99480	0.99201	1.00815	0.99609	1.0000	102.8	3.11	1.95	0.54	5.60	5.60	0.05	0.10	0.21	0.35	0.35	0.03	0.03	5.98	5.98
5年目	H31	0.99558	0.99277	1.00880	0.99687	0.9615	102.8	3.10	1.93	0.54	5.57	5.36	0.05	0.10	0.21	0.35	0.34	0.03	0.03	5.96	5.73
6年目	H32	0.99783	0.99500	1.01095	0.99913	0.9246	102.8	3.09	1.92	0.55	5.56	5.14	0.05	0.10	0.21	0.36	0.33	0.03	0.03	5.95	5.50
7年目	H33	0.99776	0.98618	1.00315	0.99649	0.8890	102.8	3.08	1.90	0.55	5.53	4.92	0.05	0.10	0.21	0.35	0.32	0.03	0.02	5.91	5.26
8年目	H34	0.99776	0.98598	1.00314	0.99648	0.8548	102.8	3.08	1.87	0.55	5.50	4.70	0.05	0.09	0.21	0.35	0.30	0.03	0.02	5.88	5.03
9年目	H35	0.99775	0.98578	1.00313	0.99646	0.8219	102.8	3.07	1.84	0.56	5.47	4.49	0.05	0.09	0.21	0.35	0.29	0.03	0.02	5.85	4.81
10年目	H36	0.99775	0.98558	1.00312	0.99645	0.7903	102.8	3.06	1.82	0.56	5.44	4.30	0.05	0.09	0.21	0.35	0.28	0.03	0.02	5.82	4.60
11年目	H37	0.99774	0.98537	1.00311	0.99644	0.7599	102.8	3.05	1.79	0.56	5.40	4.11	0.05	0.09	0.21	0.35	0.27	0.03	0.02	5.78	4.40
12年目	H38	0.99774	0.98515	1.00310	0.99642	0.7307	102.8	3.05	1.76	0.56	5.37	3.93	0.05	0.09	0.21	0.35	0.26	0.03	0.02	5.75	4.20
13年目	H39	0.99773	0.98493	1.00309	0.99641	0.7026	102.8	3.04	1.74	0.56	5.34	3.75	0.05	0.09	0.22	0.35	0.25	0.03	0.02	5.72	4.02
14年目	H40	0.99773	0.98470	1.00308	0.99640	0.6756	102.8	3.03	1.71	0.56	5.31	3.59	0.05	0.09	0.22	0.35	0.24	0.03	0.02	5.69	3.84
15年目	H41	0.99772	0.98446	1.00307	0.99639	0.6496	102.8	3.03	1.69	0.57	5.28	3.43	0.05	0.09	0.22	0.35	0.23	0.03	0.02	5.65	3.67
16年目	H42	0.99772	0.98421	1.00306	0.99637	0.6246	102.8	3.02	1.66	0.57	5.25	3.28	0.05	0.08	0.22	0.35	0.22	0.03	0.02	5.62	3.51
17年目	H43	0.99152	0.99089	0.99715	0.99226	0.6006	102.8	2.99	1.64	0.57	5.20	3.13	0.05	0.08	0.22	0.35	0.21	0.03	0.02	5.58	3.35
18年目	H44	0.99145	0.99081	0.99715	0.99220	0.5775	102.8	2.97	1.63	0.56	5.16	2.98	0.05	0.08	0.22	0.34	0.20	0.03	0.02	5.53	3.19
19年目	H45	0.99138	0.99072	0.99714	0.99214	0.5553	102.8	2.94	1.61	0.56	5.12	2.84	0.05	0.08	0.22	0.34	0.19	0.03	0.01	5.49	3.05
20年目	H46	0.99130	0.99064	0.99713	0.99208	0.5339	102.8	2.92	1.60	0.56	5.08	2.71	0.05	0.08	0.21	0.34	0.18	0.03	0.01	5.44	2.91
21年目	H47	0.99123	0.99055	0.99712	0.99201	0.5134	102.8	2.89	1.58	0.56	5.03	2.58	0.04	0.08	0.21	0.34	0.17	0.03	0.01	5.40	2.77
22年目	H48	0.99115	0.99046	0.99711	0.99195	0.4936	102.8	2.87	1.57	0.56	4.99	2.46	0.04	0.08	0.21	0.34	0.17	0.03	0.01	5.35	2.64
23年目	H49	0.99107	0.99036	0.99710	0.99188	0.4746	102.8	2.84	1.55	0.56	4.95	2.35	0.04	0.08	0.21	0.34	0.16	0.03	0.01	5.31	2.52
24年目	H50	0.99099	0.99027	0.99710	0.99182	0.4564	102.8	2.82	1.54	0.55	4.91	2.24	0.04	0.08	0.21	0.33	0.15	0.03	0.01	5.27	2.40
25年目	H51	0.99091	0.99018	0.99709	0.99175	0.4388	102.8	2.79	1.52	0.55	4.87	2.13	0.04	0.08	0.21	0.33	0.15	0.02	0.01	5.22	2.29
26年目	H52	0.99083	0.99008	0.99708	0.99168	0.4220	102.8	2.76	1.51	0.55	4.82	2.04	0.04	0.08	0.21	0.33	0.14	0.02	0.01	5.18	2.18
27年目	H53	0.99074	0.98998	0.99707	0.99161	0.4057	102.8	2.74	1.49	0.55	4.78	1.94	0.04	0.08	0.21	0.33	0.13	0.02	0.01	5.13	2.08
28年目	H54	0.99065	0.98988	0.99706	0.99154	0.3901	102.8	2.71	1.48	0.55	4.74	1.85	0.04	0.07	0.21	0.33	0.13	0.02	0.01	5.09	1.99
29年目	H55	0.99057	0.98977	0.99705	0.99147	0.3751	102.8	2.69	1.46	0.55	4.70	1.76	0.04	0.07	0.21	0.32	0.12	0.02	0.01	5.04	1.89
30年目	H56	0.99048	0.98967	0.99704	0.99139	0.3607	102.8	2.66	1.45	0.54	4.65	1.68	0.04	0.07	0.21	0.32	0.12	0.02	0.01	5.00	1.80
31年目	H57	0.99038	0.98956	0.99704	0.99132	0.3468	102.8	2.64	1.43	0.54	4.61	1.60	0.04	0.07	0.21	0.32	0.11	0.02	0.01	4.96	1.72
32年目	H58	0.99029	0.98945	0.99703	0.99124	0.3335	102.8	2.61	1.42	0.54	4.57	1.52	0.04	0.07	0.21	0.32	0.11	0.02	0.01	4.91	1.64
33年目	H59	0.99020	0.98934	0.99702	0.99117	0.3207	102.8	2.59	1.40	0.54	4.53	1.45	0.04	0.07	0.21	0.32	0.10	0.02	0.01	4.87	1.56
34年目	H60	0.99010	0.98922	0.99701	0.99109	0.3083	102.8	2.56	1.39	0.54	4.48	1.38	0.04	0.07	0.21	0.32	0.10	0.02	0.01	4.82	1.49
35年目	H61	0.99000	0.98911	0.99700	0.99101	0.2965	102.8	2.53	1.37	0.54	4.44	1.32	0.04	0.07	0.21	0.31	0.09	0.02	0.01	4.78	1.42
36年目	H62	0.98990	0.98899	0.99699	0.99093	0.2851	102.8	2.51	1.36	0.54	4.40	1.25	0.04	0.07	0.20	0.31	0.09	0.02	0.01	4.73	1.35
37年目	H63	0.98980	0.98886	0.99698	0.99084	0.2741	102.8	2.48	1.34	0.53	4.36	1.19	0.04	0.07	0.20	0.31	0.09	0.02	0.01	4.69	1.29
38年目	H64	0.98969	0.98874	0.99697	0.99076	0.2636	102.8	2.46	1.33	0.53	4.31	1.14	0.04	0.07	0.20	0.31	0.08	0.02	0.01	4.65	1.22
39年目	H65	0.98958	0.98861	0.99696	0.99067	0.2534	102.8	2.43	1.31	0.53	4.27	1.08	0.04	0.07	0.20	0.31	0.08	0.02	0.01	4.60	1.17
40年目	H66	0.98947	0.98848	0.99695	0.99058	0.2437	102.8	2.41	1.30	0.53	4.23	1.03	0.04	0.07	0.20	0.31	0.07	0.02	0.01	4.56	1.11
41年目	H67	0.98936	0.98834	0.99694	0.99049	0.2343	102.8	2.38	1.28	0.53	4.19	0.98	0.04	0.06	0.20	0.30	0.07	0.02	0.01	4.51	1.06
42年目	H68	0.98925	0.98821	0.99694	0.99040	0.2253	102.8	2.35	1.27	0.53	4.15	0.93	0.04	0.06	0.20	0.30	0.07	0.02	0.00	4.47	1.01
43年目	H69	0.98913	0.98806	0.99693	0.99031	0.2166	102.8	2.33	1.25	0.52	4.10	0.89	0.04	0.06	0.20	0.30	0.06	0.02	0.00	4.42	0.96
44年目	H70	0.98901	0.98792	0.99692	0.99022	0.2083	102.8	2.30	1.24	0.52	4.06	0.85	0.04	0.06	0.20	0.30	0.06	0.02	0.00	4.38	0.91
45年目	H71	0.98889	0.98777	0.99691	0.99012	0.2003	102.8	2.28	1.22	0.52	4.02	0.80	0.04	0.06	0.20	0.30	0.06	0.02	0.00	4.34	0.87
46年目	H72	0.98876	0.98762	0.99690	0.99002	0.1926	102.8	2.25	1.21	0.52	3.98	0.77	0.03	0.06	0.20	0.29	0.06	0.02	0.00	4.29	0.83
47年目	H73	0.98864	0.98747	0.99689	0.98992	0.1852	102.8	2.23	1.19	0.52	3.93	0.73	0.03	0.06	0.20	0.29	0.05	0.02	0.00	4.25	0.79
48年目	H74	0.98850	0.98731	0.99688	0.98982	0.1780	102.8	2.20	1.18	0.52	3.89	0.69	0.03	0.06	0.20	0.29	0.05	0.02	0.00	4.20	0.75
49年目	H75	0.98837	0.98714	0.99687	0.98971	0.1712	102.8	2.18	1.16	0.51	3.85	0.66	0.03	0.06	0.20	0.29	0.05	0.02	0.00	4.16	0.71
合計								137.73	77.80	27.16	242.68	134.68	2.13	3.94	10.39	16.46	8.88	1.24	0.68	260.38	144.25
