

(再評価)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	首都圏中央連絡自動車道(川島~大栄)
事業主体	国土交通省関東地方整備局、東日本高速道路会社

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	事業全体：費用便益比(B/C)=1.5 (経済的純現在価値(B-C)=8,563億円、経済的内部収益率(EIRR)=5.5%) 残事業：費用便益比(B/C)=1.3 (経済的純現在価値(B-C)=1,143億円、経済的内部収益率(EIRR)=6.2%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	● 並行区間等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間a(費用便益対象区間)について 渋滞損失時間：2,417,568千人・時間/年 渋滞損失削減時間：49,797千人・時間/年(2,417,568千人・時間/年⇒2,367,771千人・時間/年)	区間a(費用便益対象区間)について 渋滞損失時間：2,417,568千人・時間/年 渋滞損失削減時間：49,797千人・時間/年(2,417,568千人・時間/年⇒2,367,771千人・時間/年) 区間b(並行区間)について：(国道354：群馬県大泉町邑楽郡~茨城県土浦市中村陸橋下) 並行区間の渋滞損失時間：12,664千人・時間/年 並行区間の渋滞損失削減率：約1割削減
		□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる	・並行する国道354号及び国道408号に関東鉄道のバス路線が存在する。 ・利便性向上が見込まれるバス路線：西武バス(本川越駅⇄川越グリーンパーク他)、東武バス(工業団地循環他) 国際興業バス(アーバンみらい循環他)、春日部市コミュニティバス、平成バス(春日部駅⇄イオンモール春日部)
		■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	・対象駅：大宮駅(東北・上越新幹線) ・アクセス向上が見込まれる自治体：古河市(96分⇒70分)
	物流効率化の支援	■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	・成田国際空港(第一種空港)へのアクセス向上が見込まれる(桶川市~成田空港、144分⇒71分)
		□ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
	都市の再生	□ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
		■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	・都市再生プロジェクト「大都市圏における環状道路体系の整備」に指定
		■ 三大都市圏の環状道路を形成する	・首都圏三環状道路を構成する首都圏中央連絡自動車道の一部として位置づけ
	国土・地域ネットワークの構築	■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	・阿見吉原東土地区画整理事業、阿見東部工業団地開発等との連携あり
		■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	・横浜~八王子~つくば~成田~千葉など首都圏の業務核都市を連絡するルートとして機能する
		■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	・対象となる日常活動圏中心都市：埼玉県さいたま市・茨城県水戸市
□ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる			

1. 活力	個性ある地域の形成	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	<ul style="list-style-type: none"> 沿線市町村の工場立地および進行中の工業系プロジェクトを支援する 土浦全国花火競技大会等大規模イベントを支援する イオンモールつくば等の周辺の商業施設の活性化を支援する
		<input checked="" type="checkbox"/> 10等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する	<ul style="list-style-type: none"> 沿線地域に多数立地するゴルフ場へのアクセスが向上し、東京方面からの利用者の増加が見込まれる 牛久大仏や阿見プレミアム・アウトレット等の観光地へのアクセスが向上する
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	<ul style="list-style-type: none"> 筑波メディカルセンターなど圏央道沿線の第三次救命救急医療施設へのアクセス向上が見込まれる。(稲敷市～筑波メディカルセンター) (49分～36分)
3. 安全	安全な生活環境の確保 災害への備え	<input type="checkbox"/> 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	<ul style="list-style-type: none"> 計画名：埼玉県地域防災計画（平成26年12月） 計画における位置づけ：第一次緊急交通路
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	<ul style="list-style-type: none"> 代替する緊急輸送道路路線名：国道16号
		<input checked="" type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する	<ul style="list-style-type: none"> 並行する高速道路路線：東京外かく環状道路、首都高速中央環状線
		<input type="checkbox"/> 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する	
4. 環境	地球環境の保全 生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：138,326t/年
		<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率	(推計結果) 評価対象区間（国道354：群馬県大泉町邑楽郡～茨城県土浦市中村陸橋下） 排出削減量：46t/年、排出削減率：5.9%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率	(推計結果) 評価対象区間（国道354：群馬県大泉町邑楽郡～茨城県土浦市中村陸橋下） 排出削減量：2.7t/年、排出削減率：5.9%削減
		<input type="checkbox"/> 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	<ul style="list-style-type: none"> 圏央道関連振興プロジェクトあり（上河原崎・中西特定土地区画整理事業、島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業、阿見吉原土地区画整理事業、未来産業基盤強化プロジェクト等）
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道468号	首都圏中央連絡 自動車道 (川島~大栄)	L=111.9km	高規格 B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
22,900 ~ 54,500	4	関東地方整備局 東日本高速道路(株)

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和2年度		
単純合計	12,417億円	3,006億円	15,422億円
うち残事業分	3,120億円	1,704億円	4,824億円
基準年における 現在価値 (C)	16,708億円	1,113億円	17,820億円
うち残事業分	2,782億円	630億円	3,411億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和2年度			
供用年	令和7年度			
単年便益 (初年便益)	1,399億円	90億円	28億円	1,517億円
基準年における 現在価値 (B)	24,327億円	1,579億円	477億円	26,383億円
うち残事業分	4,408億円	61億円	85億円	4,554億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.5
経済的純現在価値（事業全体）	8,563 億円
経済的内部収益率（事業全体）	5.5%
費用便益比（残事業）	1.3
経済的純現在価値（残事業）	1,143 億円
経済的内部収益率（残事業）	6.2%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	22,900 ~ 54,500 （台/日）	±10%	1.5~1.5
事業費	12,417億円	±10%	1.5~1.5
事業期間	34年	±20%	1.4~1.5

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	22,900 ~ 54,500 （台/日）	±10%	1.3~1.4
事業費	3,120億円	±10%	1.2~1.5
事業期間	4年	±20%	1.3~1.4

交通状況の変化

様式-3①

事業名： 首都圏中央連絡自動車道(川島～大栄) (事業全体)

(推計時点 R12年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 111.9 km	交通量	[台/日]	-	32,300	
	走行時間	[分]	-	94	
	走行時間費用	[億円/年]	-	620.76	
②主な周辺道路	北関東道(波志江PA～茨城町JCT) 129.5 km	交通量	[台/日]	29,700	25,500
		走行時間	[分]	100	98
		走行時間費用	[億円/年]	619.23	520.74
	東関東道(大栄JCT～茨城町JCT) 71.9 km	交通量	[台/日]	18,100	13,100
		走行時間	[分]	69	61
		走行時間費用	[億円/年]	243.61	158.35
	常磐道(三郷JCT～谷田部IC) 29.5 km	交通量	[台/日]	81,700	76,100
		走行時間	[分]	38	37
		走行時間費用	[億円/年]	607.29	550.53
	外環道(和光IC～高谷JCT) 46.3 km	交通量	[台/日]	84,400	77,600
		走行時間	[分]	57	55
		走行時間費用	[億円/年]	941.49	846.89
	国道16号 40.6 km	交通量	[台/日]	53,500	52,800
		走行時間	[分]	140	138
		走行時間費用	[億円/年]	1,555.98	1,515.05
	国道125号 162.7 km	交通量	[台/日]	19,100	18,300
		走行時間	[分]	303	293
		走行時間費用	[億円/年]	1,114.79	1,032.13
	国道354号 149.8 km	交通量	[台/日]	15,700	15,100
		走行時間	[分]	259	253
		走行時間費用	[億円/年]	836.63	793.78
	国道50号 85.8 km	交通量	[台/日]	39,200	38,500
		走行時間	[分]	122	121
		走行時間費用	[億円/年]	979.03	955.92
	国道6号 48.6 km	交通量	[台/日]	34,300	34,200
		走行時間	[分]	122	121
		走行時間費用	[億円/年]	870.07	862.77
国道464号 34.6 km	交通量	[台/日]	43,300	42,600	
	走行時間	[分]	73	72	
	走行時間費用	[億円/年]	547.96	534.38	
(県)稲敷阿見線 14.6 km	交通量	[台/日]	5,000	3,400	
	走行時間	[分]	24	23	
	走行時間費用	[億円/年]	23.52	14.61	

国道408号 42.5 km	交通量	[台/日]	15,600	14,100	
	走行時間	[分]	66	62	
	走行時間費用	[億円/年]	188.36	161.73	
国道294号 67.9 km	交通量	[台/日]	24,200	23,400	
	走行時間	[分]	97	95	
	走行時間費用	[億円/年]	436.12	414.33	
(主) 竜ヶ崎潮来線 17.2 km	交通量	[台/日]	9,100	8,800	
	走行時間	[分]	28	27	
	走行時間費用	[億円/年]	48.22	45.03	
国道4号 15.0 km	交通量	[台/日]	56,000	51,600	
	走行時間	[分]	30	28	
	走行時間費用	[億円/年]	321.01	280.67	
首都高速6号(三郷JCT~ 小菅JCT) 9.7 km	交通量	[台/日]	97,200	91,600	
	走行時間	[分]	15	15	
	走行時間費用	[億円/年]	291.79	264.31	
首都高速5号(美女木JCT ~北池袋IC) 11.8 km	交通量	[台/日]	76,100	73,800	
	走行時間	[分]	14	13	
	走行時間費用	[億円/年]	202.27	193.95	
国道355号 36.3 km	交通量	[台/日]	10,000	9,700	
	走行時間	[分]	54	52	
	走行時間費用	[億円/年]	109.42	101.72	
首都高速中央環状線(西新 宿JCT~葛西JCT) 29.0 km	交通量	[台/日]	74,900	72,600	
	走行時間	[分]	36	35	
	走行時間費用	[億円/年]	513.47	490.82	
③その他道路合計 16,731.4km	走行時間費用	[億円/年]	101,017.27	99,691.82	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計	17,886.7km	走行時間短縮便益 [億円/年]	111,467.52	110,050.29	1,417.24

※1: 四捨五入の関係で、合計値が一致しない場合がある。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



交通状況の変化

様式-3①

事業名： 首都圏中央連絡自動車道(川島～大栄) (残事業)

(推計時点 R12年)


			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 [バイパス等] 111.9 km	交通量	[台/日]	25,000	32,300
	走行時間	[分]	112	94
	走行時間費用	[億円/年]	560.33	620.76
②主な周辺道路	北関東道(波志江PA～茨城町JCT) 129.5 km	交通量	[台/日]	26,300
		走行時間	[分]	98
		走行時間費用	[億円/年]	539.85
	東関東道(大栄JCT～茨城町JCT) 71.9 km	交通量	[台/日]	14,200
		走行時間	[分]	64
		走行時間費用	[億円/年]	177.73
	常磐道(三郷JCT～谷田部IC) 26.8 km	交通量	[台/日]	76,900
		走行時間	[分]	37
		走行時間費用	[億円/年]	558.31
	外環道(和光IC～高谷JCT) 45.6 km	交通量	[台/日]	78,800
		走行時間	[分]	56
		走行時間費用	[億円/年]	865.46
	国道16号 40.6 km	交通量	[台/日]	52,800
		走行時間	[分]	139
		走行時間費用	[億円/年]	1,518.56
	国道125号 162.7 km	交通量	[台/日]	18,400
		走行時間	[分]	294
		走行時間費用	[億円/年]	1,039.47
	国道354号 149.8 km	交通量	[台/日]	15,400
		走行時間	[分]	255
		走行時間費用	[億円/年]	811.28
	国道50号 85.8 km	交通量	[台/日]	38,500
		走行時間	[分]	121
		走行時間費用	[億円/年]	958.04
国道6号 48.6 km	交通量	[台/日]	34,400	
	走行時間	[分]	121	
	走行時間費用	[億円/年]	868.64	
国道464号 34.6 km	交通量	[台/日]	42,900	
	走行時間	[分]	73	
	走行時間費用	[億円/年]	542.17	
(県) 稲敷阿見線 14.6 km	交通量	[台/日]	3,400	
	走行時間	[分]	23	
	走行時間費用	[億円/年]	15.07	

	国道408号 42.5 km	交通量	[台/日]	14,400	14,100
		走行時間	[分]	62	62
		走行時間費用	[億円/年]	166.14	161.73
	国道294号 67.9 km	交通量	[台/日]	23,600	23,400
		走行時間	[分]	96	95
		走行時間費用	[億円/年]	419.97	414.33
	(主) 竜ヶ崎潮来線 17.2 km	交通量	[台/日]	8,900	8,800
		走行時間	[分]	28	27
		走行時間費用	[億円/年]	46.49	45.03
	国道4号 15.0 km	交通量	[台/日]	52,500	51,600
		走行時間	[分]	28	28
		走行時間費用	[億円/年]	285.31	280.67
	首都高速6号(三郷JCT~ 小菅JCT) 9.7 km	交通量	[台/日]	92,100	91,600
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	266.87	264.31
	首都高速5号(美女木JCT ~北池袋IC) 11.8 km	交通量	[台/日]	74,900	73,800
		走行時間	[分]	14	13
		走行時間費用	[億円/年]	197.20	193.95
	国道355号 36.3 km	交通量	[台/日]	9,800	9,700
		走行時間	[分]	53	52
		走行時間費用	[億円/年]	103.59	101.72
	首都高速中央環状線(西新 宿JCT~葛西JCT) 29.0 km	交通量	[台/日]	73,100	72,600
		走行時間	[分]	35	35
		走行時間費用	[億円/年]	495.38	490.82
③その他道路合計 18,509.9km		走行時間費用	[億円/年]	99,872.55	99,691.82

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)	
合計	19,655.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	110,308.38	110,050.29	258.10

※1: 四捨五入の関係で、合計値が一致しない場合がある。

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること

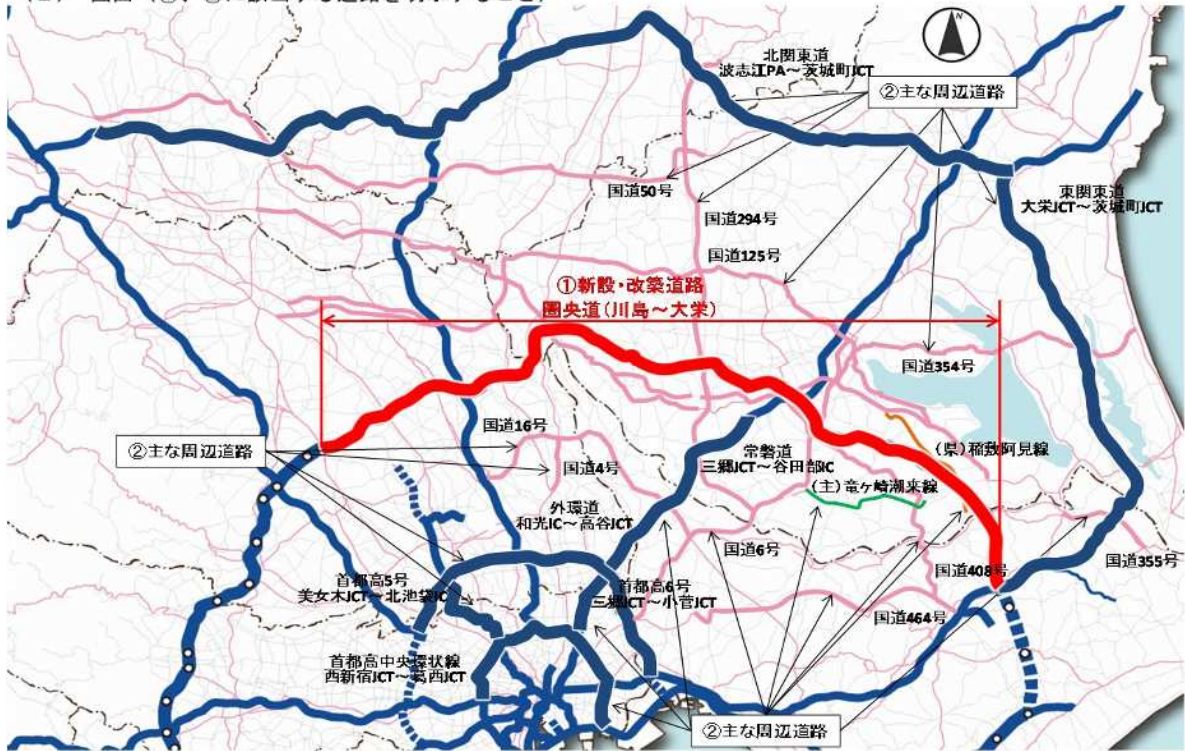

費用便益分析の条件

様式-3②

事業名：首都圏中央連絡自動車道（川島～大栄）

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和2年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R12)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他 ()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量 (トリップ数) () 台トリップ/日 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分 (リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由	小規模事業である <input type="checkbox"/> 山間部海岸部で併行道路が少ない <input type="checkbox"/> その他 ()
	簡易手法の考え方 (将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 交通量が、交通容量 (Qmax~Qmin) 以上の路線、交通容量 (Qmin~Qmax) の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	その他 ()	<input type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する 場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行 経費減少・交通事故 減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名: 首都圏中央連絡自動車道(川島~大栄)(事業全体)					維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)		
					単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
					111.9		
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-34年目	H 3	3.1187	116.0	2.69	7.43		
-33年目	H 4	2.9987	117.6	3.52	9.24		
-32年目	H 5	2.8834	117.9	7.53	18.94		
-31年目	H 6	2.7725	117.8	7.56	18.30		
-30年目	H 7	2.6658	117.1	12.81	29.97		
-29年目	H 8	2.5633	116.6	11.69	26.42		
-28年目	H 9	2.4647	117.5	26.96	58.13		
-27年目	H 10	2.3699	116.9	59.94	124.91		
-26年目	H 11	2.2788	115.2	130.22	264.80		
-25年目	H 12	2.1911	113.8	203.88	403.54		
-24年目	H 13	2.1068	112.4	310.91	599.08		
-23年目	H 14	2.0258	110.5	340.67	642.03		
-22年目	R 15	1.9479	109.0	417.80	767.55		
-21年目	H 16	1.8730	107.9	399.38	712.68		
-20年目	H 17	1.8009	106.7	448.34	777.90		
-19年目	H 18	1.7317	105.9	503.97	847.18		
-18年目	H 19	1.6651	105.0	509.07	829.90		
-17年目	H 20	1.6010	104.4	523.83	825.80		
-16年目	H 21	1.5395	103.0	480.92	738.94		
-15年目	H 22	1.4802	101.3	422.75	635.03		
-14年目	H 23	1.4233	99.8	411.78	603.70		
-13年目	H 24	1.3686	99.0	645.10	916.77		
-12年目	H 25	1.3159	99.0	667.50	912.07		
-11年目	H 26	1.2653	101.5	1,092.37	1,399.88		
-10年目	H 27	1.2167	103.0	896.64	1,088.83		
-9年目	H 28	1.1699	102.8	234.70	274.57		
-8年目	H 29	1.1249	102.9	96.97	108.97		
-7年目	H 30	1.0816	102.8	41.11	44.47		
-6年目	R 1	1.0400	102.8	92.23	95.91		
-5年目	R 2	1.0000	102.8	293.64	293.64		
-4年目	R 3	0.9615	102.8	407.85	392.15		
-3年目	R 4	0.9246	102.8	641.88	593.49		
-2年目	R 5	0.8890	102.8	797.59	709.06		
-1年目	R 6	0.8548	102.8	1,272.73	1,087.93		
供用開始年次	R 7	0.8219	102.8			59.25	48.70
1年目	R 8	0.7903	102.8			59.61	47.11
2年目	R 9	0.7599	102.8			59.75	45.40
3年目	R 10	0.7307	102.8			60.00	43.84
4年目	R 11	0.7026	102.8			60.24	42.32
5年目	R 12	0.6756	102.8			60.63	40.96
6年目	R 13	0.6496	102.8			60.80	39.50
7年目	R 14	0.6246	102.8			61.01	38.11
8年目	R 15	0.6006	102.8			61.12	36.71
9年目	R 16	0.5775	102.8			61.38	35.45
10年目	R 17	0.5553	102.8			61.62	34.22
11年目	R 18	0.5339	102.8			61.81	33.00
12年目	R 19	0.5134	102.8			61.99	31.83
13年目	R 20	0.4936	102.8			62.17	30.69
14年目	R 21	0.4746	102.8			62.35	29.59
15年目	R 22	0.4564	102.8			62.48	28.52
16年目	R 23	0.4388	102.8			62.47	27.41
17年目	R 24	0.4220	102.8			62.41	26.34
18年目	R 25	0.4057	102.8			62.23	25.25
19年目	R 26	0.3901	102.8			62.06	24.21
20年目	R 27	0.3751	102.8			61.88	23.21
21年目	R 28	0.3607	102.8			61.71	22.26
22年目	R 29	0.3468	102.8			61.53	21.34
23年目	R 30	0.3335	102.8			61.36	20.46
24年目	R 31	0.3207	102.8			61.18	19.62
25年目	R 32	0.3083	102.8			61.01	18.81
26年目	R 33	0.2965	102.8			60.83	18.04
27年目	R 34	0.2851	102.8			60.66	17.29
28年目	R 35	0.2741	102.8			60.48	16.58
29年目	R 36	0.2636	102.8			60.31	15.90
30年目	R 37	0.2534	102.8			60.13	15.24
31年目	R 38	0.2437	102.8			59.96	14.61
32年目	R 39	0.2343	102.8			59.78	14.01
33年目	R 40	0.2253	102.8			59.61	13.43
34年目	R 41	0.2166	102.8			59.43	12.87
35年目	R 42	0.2083	102.8			59.26	12.34
36年目	R 43	0.2003	102.8			59.08	11.83
37年目	R 44	0.1926	102.8			58.91	11.35
38年目	R 45	0.1852	102.8			58.73	10.88
39年目	R 46	0.1780	102.8			58.56	10.42
40年目	R 47	0.1712	102.8			58.38	9.99
41年目	R 48	0.1646	102.8			58.21	9.58
42年目	R 49	0.1583	102.8			58.03	9.19
43年目	R 50	0.1522	102.8			57.86	8.81
44年目	R 51	0.1463	102.8			57.68	8.44
45年目	R 52	0.1407	102.8			57.51	8.09
46年目	R 53	0.1353	102.8			57.33	7.76
47年目	R 54	0.1301	102.8			57.16	7.44
48年目	R 55	0.1251	102.8			56.98	7.13
49年目	R 56	0.1203	102.8	-1,260.74	-151.67	56.80	6.83
合計				11,155.79	16,707.53	3,005.72	1,112.88
単純事業費計				12,416.52		3,005.72	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:首都圏中央連絡自動車道(川島~大栄)(残事業)

				単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
						111.9			
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)			
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値		
-4年目	R 3	0.9615	102.8	407.85	392.15				
-3年目	R 4	0.9246	102.8	641.88	593.49				
-2年目	R 5	0.8890	102.8	797.59	709.06				
-1年目	R 6	0.8548	102.8	1,272.73	1,087.93				
供用開始年次	R 7	0.8219	102.8			33.72	27.71		
1年目	R 8	0.7903	102.8			33.89	26.78		
2年目	R 9	0.7599	102.8			33.87	25.74		
3年目	R 10	0.7307	102.8			33.94	24.80		
4年目	R 11	0.7026	102.8			34.01	23.90		
5年目	R 12	0.6756	102.8			34.20	23.11		
6年目	R 13	0.6496	102.8			34.26	22.26		
7年目	R 14	0.6246	102.8			34.35	21.46		
8年目	R 15	0.6006	102.8			34.37	20.64		
9年目	R 16	0.5775	102.8			34.52	19.94		
10年目	R 17	0.5553	102.8			34.65	19.24		
11年目	R 18	0.5339	102.8			34.76	18.56		
12年目	R 19	0.5134	102.8			34.88	17.91		
13年目	R 20	0.4936	102.8			34.99	17.27		
14年目	R 21	0.4746	102.8			35.11	16.66		
15年目	R 22	0.4564	102.8			35.20	16.07		
16年目	R 23	0.4388	102.8			35.20	15.45		
17年目	R 24	0.4220	102.8			35.19	14.85		
18年目	R 25	0.4057	102.8			35.11	14.24		
19年目	R 26	0.3901	102.8			35.03	13.67		
20年目	R 27	0.3751	102.8			34.95	13.11		
21年目	R 28	0.3607	102.8			34.86	12.57		
22年目	R 29	0.3468	102.8			34.78	12.06		
23年目	R 30	0.3335	102.8			34.70	11.57		
24年目	R 31	0.3207	102.8			34.62	11.10		
25年目	R 32	0.3083	102.8			34.53	10.65		
26年目	R 33	0.2965	102.8			34.45	10.21		
27年目	R 34	0.2851	102.8			34.37	9.80		
28年目	R 35	0.2741	102.8			34.29	9.40		
29年目	R 36	0.2636	102.8			34.20	9.02		
30年目	R 37	0.2534	102.8			34.12	8.65		
31年目	R 38	0.2437	102.8			34.04	8.30		
32年目	R 39	0.2343	102.8			33.96	7.96		
33年目	R 40	0.2253	102.8			33.87	7.63		
34年目	R 41	0.2166	102.8			33.79	7.32		
35年目	R 42	0.2083	102.8			33.71	7.02		
36年目	R 43	0.2003	102.8			33.63	6.74		
37年目	R 44	0.1926	102.8			33.54	6.46		
38年目	R 45	0.1852	102.8			33.46	6.20		
39年目	R 46	0.1780	102.8			33.38	5.94		
40年目	R 47	0.1712	102.8			33.30	5.70		
41年目	R 48	0.1646	102.8			33.21	5.47		
42年目	R 49	0.1583	102.8			33.13	5.24		
43年目	R 50	0.1522	102.8			33.05	5.03		
44年目	R 51	0.1463	102.8			32.97	4.82		
45年目	R 52	0.1407	102.8			32.88	4.63		
46年目	R 53	0.1353	102.8			32.80	4.44		
47年目	R 54	0.1301	102.8			32.72	4.26		
48年目	R 55	0.1251	102.8			32.64	4.08		
49年目	R 56	0.1203	102.8			32.55	3.92		
合計									
単純事業費計						3,112.73	2,781.74	1,703.75	629.52
						3,120.05		1,703.75	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 首都圏中央連絡自動車道(川島～大栄)(事業全体)

年次	年度 (基準年) R2年	総走行台和の年次別伸び率 関東臨海ブロック				割引率 (A)	GDP デフレート 102.8	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	割引率4%
供用開始年次	R 7	0.99911	0.98681	1.01113	0.99961	0.8219	102.8	686.47	151.45	561.13	1,399.05	1,149.88	44.61	4.36	40.73	89.70	73.72	28.24	23.21	1,516.99	1,246.81
1年目	R 8	0.99911	0.98663	1.01101	0.99961	0.7903	102.8	685.86	149.45	567.38	1,402.68	1,108.54	44.57	4.30	41.19	90.05	71.17	28.23	22.31	1,520.97	1,202.02
2年目	R 9	0.99911	0.98645	1.01089	0.99961	0.7599	102.8	685.24	147.45	573.62	1,406.32	1,068.66	44.53	4.24	41.64	90.41	68.70	28.22	21.45	1,524.96	1,158.81
3年目	R 10	0.99911	0.98626	1.01077	0.99961	0.7307	102.8	684.63	145.46	579.87	1,409.96	1,030.26	44.49	4.18	42.10	90.77	66.32	28.21	20.61	1,528.94	1,117.20
4年目	R 11	0.99911	0.98607	1.01066	0.99961	0.7026	102.8	684.02	143.46	586.12	1,413.60	993.19	44.45	4.13	42.55	91.12	64.02	28.20	19.81	1,532.92	1,077.03
5年目	R 12	0.99220	0.99007	0.99915	0.99324	0.6756	102.8	683.41	141.46	592.37	1,417.24	957.49	44.41	4.07	43.00	91.48	61.80	28.19	19.04	1,536.91	1,038.33
6年目	R 13	0.99214	0.98997	0.99915	0.99320	0.6496	102.8	678.08	140.05	591.86	1,410.00	915.93	44.06	4.03	42.97	91.06	59.15	28.00	18.19	1,529.05	993.27
7年目	R 14	0.99208	0.98987	0.99915	0.99315	0.6246	102.8	672.75	138.65	591.36	1,402.76	876.16	43.72	3.99	42.93	90.63	56.61	27.81	17.37	1,521.20	950.14
8年目	R 15	0.99201	0.98976	0.99914	0.99310	0.6006	102.8	667.42	137.24	590.85	1,395.52	838.15	43.37	3.95	42.89	90.21	54.18	27.62	16.59	1,513.35	908.92
9年目	R 16	0.99195	0.98966	0.99914	0.99306	0.5775	102.8	662.09	135.84	590.35	1,388.28	801.73	43.02	3.91	42.86	89.79	51.85	27.43	15.84	1,505.49	869.42
10年目	R 17	0.99189	0.98955	0.99914	0.99301	0.5553	102.8	656.76	134.43	589.84	1,381.04	766.89	42.68	3.87	42.82	89.36	49.62	27.24	15.12	1,497.64	831.64
11年目	R 18	0.99182	0.98944	0.99914	0.99296	0.5339	102.8	651.43	133.03	589.33	1,373.80	733.47	42.33	3.83	42.78	88.94	47.48	27.05	14.44	1,489.78	795.40
12年目	R 19	0.99175	0.98933	0.99914	0.99291	0.5134	102.8	646.10	131.62	588.83	1,366.56	701.59	41.98	3.79	42.75	88.52	45.44	26.86	13.79	1,481.93	760.82
13年目	R 20	0.99168	0.98921	0.99914	0.99286	0.4936	102.8	640.78	130.22	588.32	1,359.32	670.96	41.64	3.75	42.71	88.09	43.48	26.67	13.16	1,474.08	727.60
14年目	R 21	0.99161	0.98909	0.99914	0.99281	0.4746	102.8	635.45	128.81	587.82	1,352.08	641.70	41.29	3.70	42.67	87.67	41.61	26.47	12.57	1,466.22	695.87
15年目	R 22	0.99154	0.98897	0.99914	0.99275	0.4564	102.8	630.12	127.41	587.31	1,344.84	613.78	40.95	3.66	42.64	87.25	39.82	26.28	12.00	1,458.37	665.60
16年目	R 23	0.99147	0.98885	0.99914	0.99270	0.4388	102.8	624.79	126.00	586.81	1,337.60	586.94	40.60	3.62	42.60	86.82	38.10	26.09	11.45	1,450.51	636.49
17年目	R 24	0.99140	0.98872	0.99914	0.99265	0.4220	102.8	619.46	124.60	586.30	1,330.36	561.41	40.25	3.58	42.56	86.40	36.46	25.90	10.93	1,442.66	608.80
18年目	R 25	0.99132	0.98860	0.99914	0.99259	0.4057	102.8	614.13	123.19	585.80	1,323.12	536.79	39.91	3.54	42.53	85.98	34.88	25.71	10.43	1,434.81	582.10
19年目	R 26	0.99125	0.98846	0.99914	0.99254	0.3901	102.8	608.80	121.79	585.29	1,315.88	513.32	39.56	3.50	42.49	85.55	33.37	25.52	9.96	1,426.95	556.65
20年目	R 27	0.99117	0.98833	0.99914	0.99248	0.3751	102.8	603.47	120.38	584.78	1,308.64	490.87	39.21	3.46	42.45	85.13	31.93	25.33	9.50	1,419.10	532.30
21年目	R 28	0.99109	0.98819	0.99913	0.99242	0.3607	102.8	598.14	118.98	584.28	1,301.40	469.41	38.87	3.42	42.42	84.71	30.55	25.14	9.07	1,411.25	509.04
22年目	R 29	0.99101	0.98805	0.99913	0.99237	0.3468	102.8	592.81	117.57	583.77	1,294.16	448.81	38.52	3.38	42.38	84.28	29.23	24.95	8.65	1,403.39	486.70
23年目	R 30	0.99093	0.98791	0.99913	0.99231	0.3335	102.8	587.48	116.17	583.27	1,286.92	429.19	38.18	3.34	42.34	83.86	27.97	24.76	8.26	1,395.54	465.41
24年目	R 31	0.99085	0.98776	0.99913	0.99225	0.3207	102.8	582.15	114.76	582.76	1,279.68	410.39	37.83	3.30	42.31	83.44	26.76	24.57	7.88	1,387.68	445.03
25年目	R 32	0.99076	0.98761	0.99913	0.99219	0.3083	102.8	576.82	113.36	582.26	1,272.44	392.29	37.48	3.26	42.27	83.01	25.59	24.38	7.52	1,379.83	425.40
26年目	R 33	0.99067	0.98745	0.99913	0.99213	0.2965	102.8	571.49	111.96	581.75	1,265.20	375.13	37.14	3.22	42.23	82.59	24.49	24.24	7.19	1,372.03	406.81
27年目	R 34	0.99059	0.98729	0.99913	0.99206	0.2851	102.8	566.16	110.55	581.25	1,257.96	358.64	36.79	3.18	42.20	82.16	23.43	24.10	6.87	1,364.23	388.94
28年目	R 35	0.99050	0.98713	0.99913	0.99200	0.2741	102.8	560.83	109.15	580.74	1,250.72	342.82	36.44	3.14	42.16	81.74	22.41	23.96	6.57	1,356.42	371.80
29年目	R 36	0.99041	0.98696	0.99913	0.99194	0.2636	102.8	555.50	107.74	580.23	1,243.48	327.78	36.10	3.10	42.12	81.32	21.44	23.82	6.28	1,348.62	355.50
30年目	R 37	0.99031	0.98679	0.99913	0.99187	0.2534	102.8	550.17	106.34	579.73	1,236.24	313.26	35.75	3.06	42.09	80.89	20.50	23.69	6.00	1,340.82	339.76
31年目	R 38	0.99022	0.98661	0.99913	0.99180	0.2437	102.8	544.85	104.93	579.22	1,229.00	299.51	35.40	3.02	42.05	80.47	19.61	23.55	5.74	1,333.02	324.86
32年目	R 39	0.99012	0.98643	0.99913	0.99174	0.2343	102.8	539.52	103.53	578.72	1,221.76	286.26	35.06	2.98	42.01	80.05	18.76	23.41	5.48	1,325.22	310.50
33年目	R 40	0.99002	0.98624	0.99913	0.99167	0.2253	102.8	534.19	102.12	578.21	1,214.52	273.63	34.71	2.94	41.98	79.62	17.94	23.27	5.24	1,317.41	296.81
34年目	R 41	0.98992	0.98605	0.99912	0.99160	0.2166	102.8	528.86	100.72	577.71	1,207.28	261.50	34.37	2.90	41.94	79.20	17.15	23.13	5.01	1,309.61	283.66
35年目	R 42	0.98982	0.98585	0.99912	0.99152	0.2083	102.8	523.53	99.31	577.20	1,200.04	249.97	34.02	2.86	41.90	78.78	16.41	22.99	4.79	1,301.81	271.17
36年目	R 43	0.98972	0.98565	0.99912	0.99145	0.2003	102.8	518.20	97.91	576.70	1,192.80	238.92	33.67	2.82	41.87	78.35	15.69	22.85	4.58	1,294.01	259.19
37年目	R 44	0.98961	0.98544	0.99912	0.99138	0.1926	102.8	512.87	96.50	576.19	1,185.56	228.34	33.33	2.78	41.83	77.93	15.01	22.72	4.37	1,286.21	247.72
38年目	R 45	0.98950	0.98523	0.99912	0.99130	0.1852	102.8	507.54	95.10	575.68	1,178.32	218.22	32.98	2.73	41.79	77.51	14.35	22.58	4.18	1,278.40	236.76
39年目	R 46	0.98939	0.98500	0.99912	0.99123	0.1780	102.8	502.21	93.69	575.18	1,171.08	208.45	32.63	2.69	41.76	77.08	13.72	22.44	3.99	1,270.60	226.17
40年目	R 47	0.98927	0.98478	0.99912	0.99115	0.1712	102.8	496.88	92.29	574.67	1,163.84	199.25	32.29	2.65	41.72	76.66	13.12	22.30	3.82	1,262.80	216.19
41年目	R 48	0.98916	0.98454	0.99912	0.99107	0.1646	102.8	491.55	90.88	574.17	1,156.60	190.38	31.94	2.61	41.68	76.24	12.55	22.16	3.65	1,255.00	206.57
42年目	R 49	0.98904	0.98430	0.99912	0.99099	0.1583	102.8	486.22	89.48	573.66	1,149.36	181.94	31.60	2.57	41.64	75.81	12.00	22.02	3.49	1,247.20	197.43
43年目	R 50	0.98892	0.98405	0.99912	0.99091	0.1522	102.8	480.89	88.07	573.16	1,142.12	173.83	31.25	2.53	41.61	75.39	11.47	21.88	3.33	1,239.39	188.64
44年目	R 51	0.98879	0.98379	0.99912	0.99083	0.1463	102.8	475.56	86.67	572.65	1,134.88	166.03	30.90	2.49	41.57	74.97	10.97	21.74	3.18	1,231.59	180.18
45年目	R 52	0.98867	0.98352	0.99912	0.99074	0.1407	102.8	470.23	85.26	572.15	1,127.64	158.66	30.56	2.45	41.53	74.54	10.49	21.61	3.04	1,223.79	172.19
46年目	R 53	0.98854	0.98325	0.99912	0.99065	0.1353	102.8	464.90	83.86	571.64	1,120.40	151.59	30.21	2.41	41.50	74.12	10.03	21.47	2.90	1,215.99	164.52
47年目	R 54	0.98840	0.98296	0.99911	0.99057	0.1301	102.8	459.57	82.45	571.14	1,113.16	144.82	29.86	2.37	41.46	73.70	9.59	21.33	2.77	1,208.19	157.18
48年目	R 55	0.98827	0.98266	0.99911	0.99048	0.1251	102.8	454.24	81.05	570.63	1,105.92	138.35	29.52	2.33	41.42	73.27	9.17	21.19	2.65</		

便益の現在価値算定表

箇所名: 首都圏中央連絡自動車道(川島~大栄)(残事業)

年次	年度 (基準年) R2年	総走行台和の年次別伸び率 関東臨海ブロック				割引率 (A)	GDP デフレート 102.8	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%
供用開始年次	R 7	0.99911	0.98681	1.01113	0.99961	0.8219	102.8	138.70	28.93	88.09	255.72	210.18	7.28	-0.34	-2.86	4.08	3.35	5.06	4.16	264.85	217.68
1年目	R 8	0.99911	0.98663	1.01101	0.99961	0.7903	102.8	138.57	28.55	89.07	256.19	202.47	7.28	-0.34	-2.89	4.04	3.20	5.05	3.99	265.29	209.66
2年目	R 9	0.99911	0.98645	1.01089	0.99961	0.7599	102.8	138.45	28.16	90.05	256.67	195.04	7.27	-0.33	-2.93	4.01	3.05	5.05	3.84	265.73	201.93
3年目	R 10	0.99911	0.98626	1.01077	0.99961	0.7307	102.8	138.33	27.78	91.04	257.15	187.90	7.26	-0.33	-2.96	3.98	2.90	5.05	3.69	266.17	194.49
4年目	R 11	0.99911	0.98607	1.01066	0.99961	0.7026	102.8	138.20	27.40	92.02	257.62	181.00	7.26	-0.32	-2.99	3.94	2.77	5.05	3.55	266.61	187.32
5年目	R 12	0.99220	0.99007	0.99915	0.99324	0.6756	102.8	138.08	27.02	93.00	258.10	174.37	7.25	-0.32	-3.02	3.91	2.64	5.05	3.41	267.05	180.42
6年目	R 13	0.99214	0.98997	0.99915	0.99320	0.6496	102.8	137.00	26.75	92.92	256.67	166.73	7.19	-0.32	-3.02	3.86	2.51	5.01	3.26	265.54	172.50
7年目	R 14	0.99208	0.98987	0.99915	0.99315	0.6246	102.8	135.93	26.48	92.84	255.25	159.43	7.14	-0.31	-3.02	3.81	2.38	4.98	3.11	264.03	164.92
8年目	R 15	0.99201	0.98976	0.99914	0.99310	0.6006	102.8	134.85	26.21	92.76	253.82	152.45	7.08	-0.31	-3.01	3.76	2.26	4.94	2.97	262.52	157.67
9年目	R 16	0.99195	0.98966	0.99914	0.99306	0.5775	102.8	133.77	25.95	92.68	252.40	145.76	7.02	-0.31	-3.01	3.70	2.14	4.91	2.84	261.01	150.74
10年目	R 17	0.99189	0.98955	0.99914	0.99301	0.5553	102.8	132.70	25.68	92.60	250.97	139.37	6.97	-0.30	-3.01	3.65	2.03	4.88	2.71	259.50	144.10
11年目	R 18	0.99182	0.98944	0.99914	0.99296	0.5339	102.8	131.62	25.41	92.52	249.55	133.23	6.91	-0.30	-3.01	3.60	1.92	4.84	2.59	258.00	137.74
12年目	R 19	0.99175	0.98933	0.99914	0.99291	0.5134	102.8	130.54	25.14	92.44	248.13	127.39	6.85	-0.30	-3.00	3.55	1.82	4.81	2.47	256.49	131.68
13年目	R 20	0.99168	0.98921	0.99914	0.99286	0.4936	102.8	129.47	24.87	92.36	246.70	121.77	6.80	-0.29	-3.00	3.50	1.73	4.77	2.36	254.98	125.86
14年目	R 21	0.99161	0.98909	0.99914	0.99281	0.4746	102.8	128.39	24.60	92.28	245.28	116.41	6.74	-0.29	-3.00	3.45	1.64	4.74	2.25	253.47	120.30
15年目	R 22	0.99154	0.98897	0.99914	0.99275	0.4564	102.8	127.31	24.34	92.20	243.85	111.29	6.69	-0.29	-3.00	3.40	1.55	4.71	2.15	251.96	114.99
16年目	R 23	0.99147	0.98885	0.99914	0.99270	0.4388	102.8	126.24	24.07	92.12	242.43	106.38	6.63	-0.29	-2.99	3.35	1.47	4.67	2.05	250.45	109.90
17年目	R 24	0.99140	0.98872	0.99914	0.99265	0.4220	102.8	125.16	23.80	92.05	241.00	101.70	6.57	-0.28	-2.99	3.30	1.39	4.64	1.96	248.94	105.05
18年目	R 25	0.99132	0.98860	0.99914	0.99259	0.4057	102.8	124.08	23.53	91.97	239.58	97.20	6.52	-0.28	-2.99	3.25	1.32	4.60	1.87	247.43	100.38
19年目	R 26	0.99125	0.98846	0.99914	0.99254	0.3901	102.8	123.00	23.26	91.89	238.15	92.90	6.46	-0.28	-2.99	3.20	1.25	4.57	1.78	245.92	95.93
20年目	R 27	0.99117	0.98833	0.99914	0.99248	0.3751	102.8	121.93	22.99	91.81	236.73	88.80	6.40	-0.27	-2.98	3.15	1.18	4.54	1.70	244.41	91.68
21年目	R 28	0.99109	0.98819	0.99913	0.99242	0.3607	102.8	120.85	22.73	91.73	235.31	84.87	6.35	-0.27	-2.98	3.10	1.12	4.50	1.62	242.90	87.61
22年目	R 29	0.99101	0.98805	0.99913	0.99237	0.3468	102.8	119.77	22.46	91.65	233.88	81.11	6.29	-0.27	-2.98	3.04	1.06	4.47	1.55	241.39	83.71
23年目	R 30	0.99093	0.98791	0.99913	0.99231	0.3335	102.8	118.70	22.19	91.57	232.46	77.52	6.23	-0.26	-2.98	2.99	1.00	4.43	1.48	239.88	80.00
24年目	R 31	0.99085	0.98776	0.99913	0.99225	0.3207	102.8	117.62	21.92	91.49	231.03	74.09	6.18	-0.26	-2.97	2.94	0.94	4.40	1.41	238.37	76.45
25年目	R 32	0.99076	0.98761	0.99913	0.99219	0.3083	102.8	116.54	21.65	91.41	229.61	70.79	6.12	-0.26	-2.97	2.89	0.89	4.36	1.35	236.86	73.03
26年目	R 33	0.99067	0.98745	0.99913	0.99213	0.2965	102.8	115.47	21.38	91.33	228.18	67.66	6.06	-0.25	-2.97	2.84	0.84	4.34	1.29	235.36	69.78
27年目	R 34	0.99059	0.98729	0.99913	0.99206	0.2851	102.8	114.39	21.12	91.25	226.76	64.65	6.01	-0.25	-2.97	2.79	0.80	4.31	1.23	233.86	66.67
28年目	R 35	0.99050	0.98713	0.99913	0.99200	0.2741	102.8	113.31	20.85	91.17	225.33	61.76	5.95	-0.25	-2.96	2.74	0.75	4.28	1.17	232.36	63.69
29年目	R 36	0.99041	0.98696	0.99913	0.99194	0.2636	102.8	112.24	20.58	91.09	223.91	59.02	5.89	-0.24	-2.96	2.69	0.71	4.26	1.12	230.85	60.85
30年目	R 37	0.99031	0.98679	0.99913	0.99187	0.2534	102.8	111.16	20.31	91.01	222.48	56.38	5.84	-0.24	-2.96	2.64	0.67	4.23	1.07	229.35	58.12
31年目	R 38	0.99022	0.98661	0.99913	0.99180	0.2437	102.8	110.08	20.04	90.93	221.06	53.87	5.78	-0.24	-2.96	2.59	0.63	4.20	1.02	227.85	55.53
32年目	R 39	0.99012	0.98643	0.99913	0.99174	0.2343	102.8	109.01	19.77	90.85	219.64	51.46	5.72	-0.23	-2.95	2.54	0.59	4.18	0.98	226.35	53.03
33年目	R 40	0.99002	0.98624	0.99913	0.99167	0.2253	102.8	107.93	19.51	90.78	218.21	49.16	5.67	-0.23	-2.95	2.49	0.56	4.15	0.93	224.85	50.66
34年目	R 41	0.98992	0.98605	0.99912	0.99160	0.2166	102.8	106.85	19.24	90.70	216.79	46.96	5.61	-0.23	-2.95	2.44	0.53	4.12	0.89	223.34	48.38
35年目	R 42	0.98982	0.98585	0.99912	0.99152	0.2083	102.8	105.78	18.97	90.62	215.36	44.86	5.55	-0.22	-2.95	2.38	0.50	4.09	0.85	221.84	46.21
36年目	R 43	0.98972	0.98565	0.99912	0.99145	0.2003	102.8	104.70	18.70	90.54	213.94	42.85	5.50	-0.22	-2.94	2.33	0.47	4.07	0.81	220.34	44.13
37年目	R 44	0.98961	0.98544	0.99912	0.99138	0.1926	102.8	103.62	18.43	90.46	212.51	40.93	5.44	-0.22	-2.94	2.28	0.44	4.04	0.78	218.84	42.15
38年目	R 45	0.98950	0.98523	0.99912	0.99130	0.1852	102.8	102.55	18.16	90.38	211.09	39.09	5.38	-0.22	-2.94	2.23	0.41	4.01	0.74	217.33	40.25
39年目	R 46	0.98939	0.98500	0.99912	0.99123	0.1780	102.8	101.47	17.90	90.30	209.66	37.32	5.33	-0.21	-2.93	2.18	0.39	3.99	0.71	215.83	38.42
40年目	R 47	0.98927	0.98478	0.99912	0.99115	0.1712	102.8	100.39	17.63	90.22	208.24	35.65	5.27	-0.21	-2.93	2.13	0.36	3.96	0.68	214.33	36.69
41年目	R 48	0.98916	0.98454	0.99912	0.99107	0.1646	102.8	99.32	17.36	90.14	206.81	34.04	5.22	-0.21	-2.93	2.08	0.34	3.93	0.65	212.83	35.03
42年目	R 49	0.98904	0.98430	0.99912	0.99099	0.1583	102.8	98.24	17.09	90.06	205.39	32.51	5.16	-0.20	-2.93	2.03	0.32	3.90	0.62	211.32	33.45
43年目	R 50	0.98892	0.98405	0.99912	0.99091	0.1522	102.8	97.16	16.82	89.98	203.97	31.04	5.10	-0.20	-2.92	1.98	0.30	3.88	0.59	209.82	31.93
44年目	R 51	0.98879	0.98379	0.99912	0.99083	0.1463	102.8	96.09	16.55	89.90	202.54	29.63	5.05	-0.20	-2.92	1.93	0.28	3.85	0.56	208.32	30.48
45年目	R 52	0.98867	0.98352	0.99912	0.99074	0.1407	102.8	95.01	16.29	89.82	201.12	28.30	4.99	-0.19	-2.92	1.88	0.26	3.82	0.54	206.82	29.10
46年目	R 53	0.98854	0.98325	0.99912	0.99065	0.1353	102.8	93.93	16.02	89.74	199.69	27.02	4.93	-0.19	-2.92	1.83	0.25	3.80	0.51	205.31	27.78
47年目	R 54	0.98840	0.98296	0.99911	0.99057	0.1301	102.8	92.85	15.75	89.66	198.27	25.79	4.88	-0.19	-2.91	1.77	0.23	3.77	0.49	203.81	26.52
48年目	R 55	0.98827	0.98266	0.99911	0.99048	0.1251	102.8	91.78	15.48	89.58	196.84	24.63	4.82	-0.18	-2.91	1.72	0.22	3.74	0.47	202.31	25.31
49年目	R 56	0.98813	0.98236	0.99911	0.99038	0.1203	102.8	90.70	15.21	89.51	195.42	23.51	4.76	-0.18	-2.91	1.67	0.20	3.71	0.45	200.81	24.16
合計								5,839.83	1,091.05	4,556.59	11,487.46	4,408.26	306.65	-12.94	-148.09	145.62	60.54	220.72	85.26	11,853.80	4,554.06
