

職人データ

年齢：50代

経験年数：20～30年

作業内容

壁ボード貼り作業


危険

墜落・転落

ヒヤリ・ハットした状況

壁ボード貼り作業中、ボードを再カットするため取り出しているとき、勢いがついて脚立から落ちそうになった。

イラスト

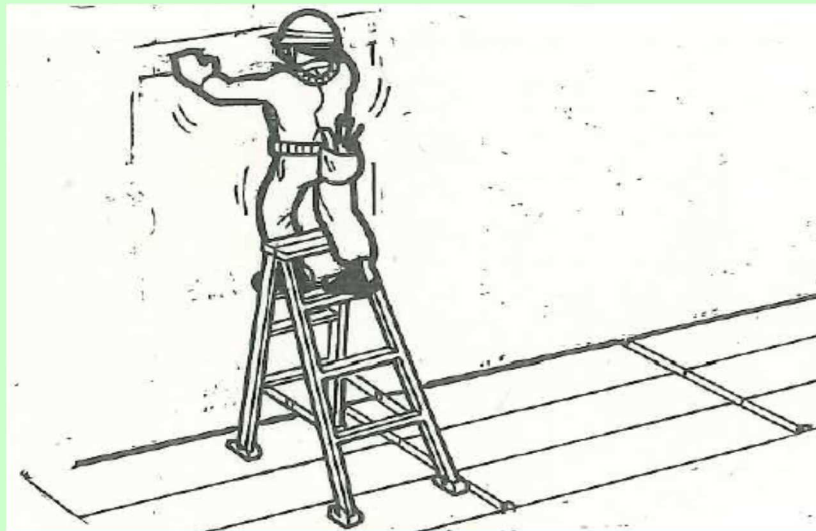

再発防止策

勢いがつくおそれがあるので、脚立ではなく、立馬等を使用する。

職人データ

年齢：40代

経験年数：20～30年

作業内容

天井ボード貼り作業



ヒヤリ・ハットした状況

天井ボード貼り作業時、立馬の端部から足を滑らせ落下しそうになった。
(先があると思っていたら、なかったため。)

イラスト



再発防止策

足元を目視で確認しながら天井施工を行う。

職人データ

年齢：40代

経験年数：10～20年

作業内容


長尺シート搬入時



ヒヤリ・ハットした状況

長尺シート搬入時、作業通路のコーナーに差し掛かったところ、反対から来た他の資材を搬入していた作業員と出会い頭に衝突しそうになった。

イラスト

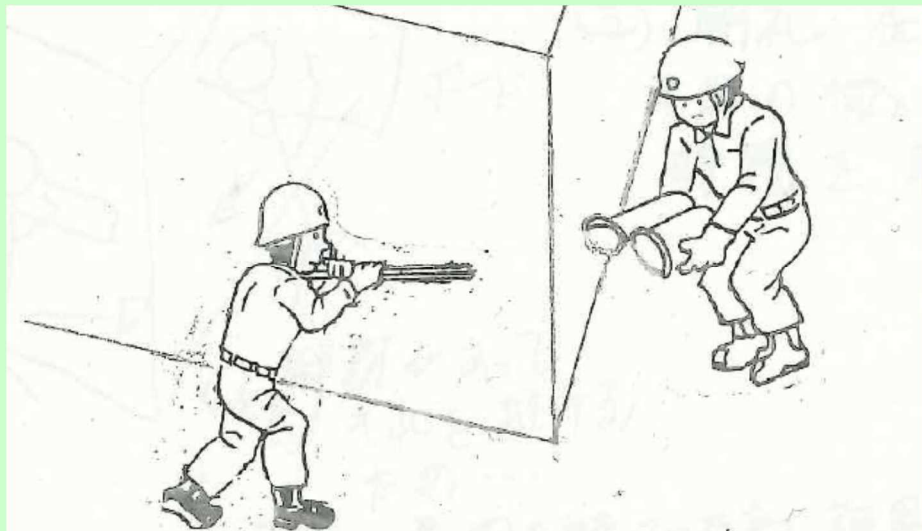

再発防止策

作業前に搬入経路を確認し、作業通路を確保する。
朝礼、昼礼時に各社が当日の搬入予定・作業予定時間を報告する。

職人データ

年齢：50代

経験年数：30年以上

作業内容

資材の台車への積み替え

危険

挟まれ、巻き込まれ

ヒヤリ・ハットした状況

床材を台車に積んでいたところ、台車を止めた場所が少しだけ傾斜しており、台車が動いてしまった。
他の人に当たる、台車に挟まれる等の危険があった。

イラスト



再発防止策

台車設置の際は、確実にストッパー、ブレーキをかける。台車に積む際は、過剰に積載しない、片荷にならないようバランスをとることに注意する。

職人データ

年齢：40代

経験年数：20～30年

作業内容

長尺シート貼り作業



ヒヤリ・ハットした状況

長尺シート巻き上げ作業の際、速乾ボンドを塗布した後のオープンタイム時、間仕切りの反対側で作業していた床仕上業者のタッチファイヤーの火が、ボード下を通り長尺シートに引火した。

すぐに気付いたが、ボンド塗布部は燃えつきた。

イラスト



再発防止策

事前の声掛けをし、消火器を準備しておく。

職人データ

年齢：30代

経験年数：10～20年

作業内容

クッションフロア貼り

危険

挟まれ、巻き込まれ

ヒヤリ・ハットした状況

トイレ内のクッションフロア貼り作業中、建具周辺の切り込みをしていたら、廊下を通る人に建具を閉められ、手を挟みそうになった。

イラスト



再発防止策

建具を外して施工する。
