

応急仮設住宅着工・完成状況

都道府県名	市町村名	着工予定		着工済み			合計	
		地区数	戸数	地区数	戸数	着工済みのうち 完成戸数	地区数	戸数
岩手県 【必要戸数 :13,984戸】	陸前高田市	-	-	53地区	2,168戸	2,168戸	53地区	2,168戸
	釜石市	-	-	50地区	3,164戸	3,164戸	50地区	3,164戸
	大船渡市	-	-	39地区	1,811戸	1,811戸	39地区	1,811戸
	宮古市	-	-	62地区	2,010戸	2,010戸	62地区	2,010戸
	久慈市	-	-	2地区	15戸	15戸	2地区	15戸
	遠野市	-	-	1地区	40戸	40戸	1地区	40戸
	おおいちちよう 大槌町	-	-	48地区	2,146戸	2,146戸	48地区	2,146戸
	やまだまち 山田町	-	-	49地区	1,990戸	1,990戸	49地区	1,990戸
	岩泉町	-	-	3地区	143戸	143戸	3地区	143戸
	ひろのちよう 洋野町	-	-	1地区	5戸	5戸	1地区	5戸
	田野畑村	-	-	3地区	186戸	186戸	3地区	186戸
	野田村	-	-	5地区	213戸	213戸	5地区	213戸
住田町	-	-	3地区	93戸	93戸	3地区	93戸	
	計	-	-	319地区	13,984戸	13,984戸	319地区	13,984戸
宮城県 【必要戸数 :22,043戸】	仙台市	-	-	19地区	1,523戸	1,523戸	19地区	1,523戸
	石巻市	-	-	131地区	7,298戸	7,298戸	131地区	7,298戸
	しおがま 塩竈市	-	-	7地区	206戸	206戸	7地区	206戸
	気仙沼市	-	-	87地区	3,451戸	3,451戸	87地区	3,451戸
	名取市	-	-	8地区	910戸	910戸	8地区	910戸
	たがじようし 多賀城市	-	-	6地区	373戸	373戸	6地区	373戸
	岩沼市	-	-	3地区	384戸	384戸	3地区	384戸
	東松島市	-	-	25地区	1,753戸	1,753戸	25地区	1,753戸
	わたりくんちよう 亶理郡亶理町	-	-	5地区	1,126戸	1,126戸	5地区	1,126戸
	やまもとちよう 亶理郡山元町	-	-	11地区	1,030戸	1,030戸	11地区	1,030戸
	しちがはままち 宮城郡七ヶ浜町	-	-	7地区	421戸	421戸	7地区	421戸
	おしかくおながわちよう 牡鹿郡女川町	-	-	30地区	1,294戸	1,105戸	30地区	1,294戸
	おおさとちよう 黒川郡大郷町	-	-	1地区	15戸	15戸	1地区	15戸
	とおだ 遠田郡美里町	-	-	2地区	64戸	64戸	2地区	64戸
もとよしくんちよう 本吉郡南三陸町	-	-	58地区	2,195戸	2,195戸	58地区	2,195戸	
	計	-	-	400地区	22,043戸	21,854戸	400地区	22,043戸

応急仮設住宅着工・完成状況


都道府県名	市町村名	着工予定					合計	
		着工予定		着工済み			地区数	戸数
		地区数	戸数	地区数	戸数	着工済みのうち 完成戸数		
福島県	福島市	-	-	14地区	1,382戸	1,382戸	14地区	1,382戸
	二本松市	-	-	11地区	1,069戸	1,069戸	11地区	1,069戸
	伊達市	-	-	1地区	126戸	126戸	1地区	126戸
	本宮市	-	-	7地区	475戸	475戸	7地区	475戸
	伊達郡国見町	-	-	4地区	100戸	100戸	4地区	100戸
	伊達郡桑折町	-	-	1地区	300戸	300戸	1地区	300戸
	川俣町	-	-	4地区	230戸	230戸	4地区	230戸
	大玉村	-	-	1地区	648戸	648戸	1地区	648戸
	郡山市	-	-	6地区	1,273戸	1,273戸	6地区	1,273戸
	須賀川市	-	-	4地区	194戸	194戸	4地区	194戸
	田村市	-	-	4地区	360戸	360戸	4地区	360戸
	鏡石町	-	-	4地区	100戸	100戸	4地区	100戸
	白河市	-	-	4地区	260戸	260戸	4地区	260戸
	矢吹町	-	-	3地区	85戸	85戸	3地区	85戸
	西郷村	-	-	1地区	42戸	42戸	1地区	42戸
	会津若松市	-	-	12地区	884戸	776戸	12地区	884戸
	会津美里町	-	-	1地区	259戸	259戸	1地区	259戸
	猪苗代町	-	-	1地区	10戸	10戸	1地区	10戸
	相馬市	-	-	13地区	1,500戸	1,500戸	13地区	1,500戸
	南相馬市	-	-	25地区	2,277戸	2,134戸	25地区	2,277戸
相馬郡新地町	-	-	8地区	573戸	573戸	8地区	573戸	
三春町	-	-	15地区	770戸	770戸	15地区	770戸	
いわき市	-	-	25地区	2,870戸	2,673戸	25地区	2,870戸	
	計	-	-	169地区	15,787戸	15,339戸	169地区	15,787戸
茨城県	北茨城市	-	-	2地区	10戸	10戸	2地区	10戸
【必要戸数：10戸】	計	-	-	2地区	10戸	10戸	2地区	10戸
千葉県	旭市	-	-	2地区	200戸	200戸	2地区	200戸
【必要戸数：230戸】	香取市	-	-	1地区	30戸	30戸	1地区	30戸
	計	-	-	3地区	230戸	230戸	3地区	230戸
栃木県	那須烏山市	-	-	1地区	20戸	20戸	1地区	20戸
【必要戸数：20戸】	計	-	-	1地区	20戸	20戸	1地区	20戸
長野県	栄村	-	-	2地区	55戸	55戸	2地区	55戸
【必要戸数：55戸】	計	-	-	2地区	55戸	55戸	2地区	55戸
着工予定及び着工済み 合計								
【必要戸数：52,513戸】		-	-	896地区	52,129戸	51,492戸	896地区	52,129戸

注1) 着工済みの戸数は、地区内の一部の戸数のみ着工済みの場合についても、全戸数を計上している。

注2) 完成戸数は、概成が完了した段階の戸数も含んでいる。

応急仮設住宅 着工・完成戸数の推移

住 宅 局
平成23年10月17日
10時00分現在

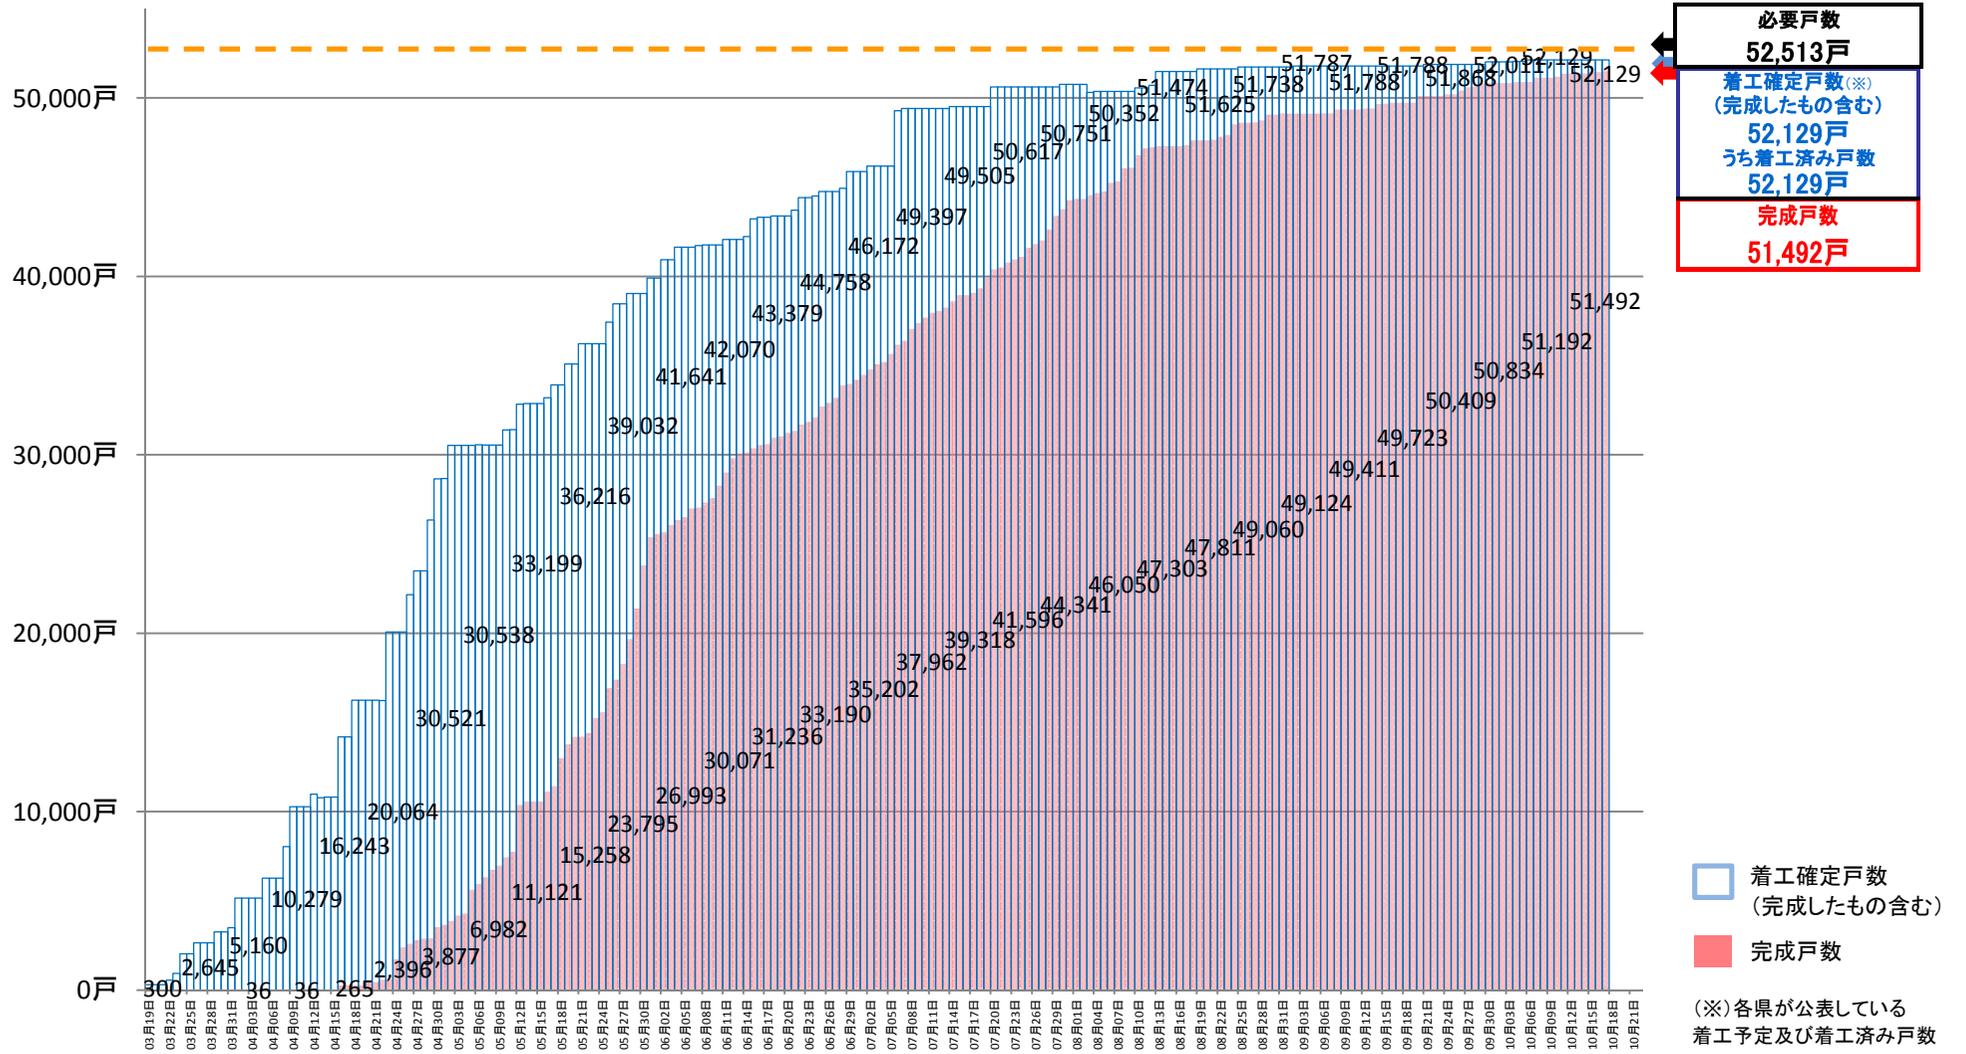


必要戸数	52,513戸
着工確定戸数(※) (完成したものを含む)	52,129戸
うち着工済み戸数	52,129戸
完成戸数	51,492戸

□ 着工確定戸数
(完成したものを含む)
■ 完成戸数
 (※)各県が公表している
 着工予定及び着工済み戸数

応急仮設住宅 発注・完成・入居戸数の推移 — 東日本大震災と阪神・淡路大震災との比較 —

住 宅 局
平成23年10月17日
10時00分 現在

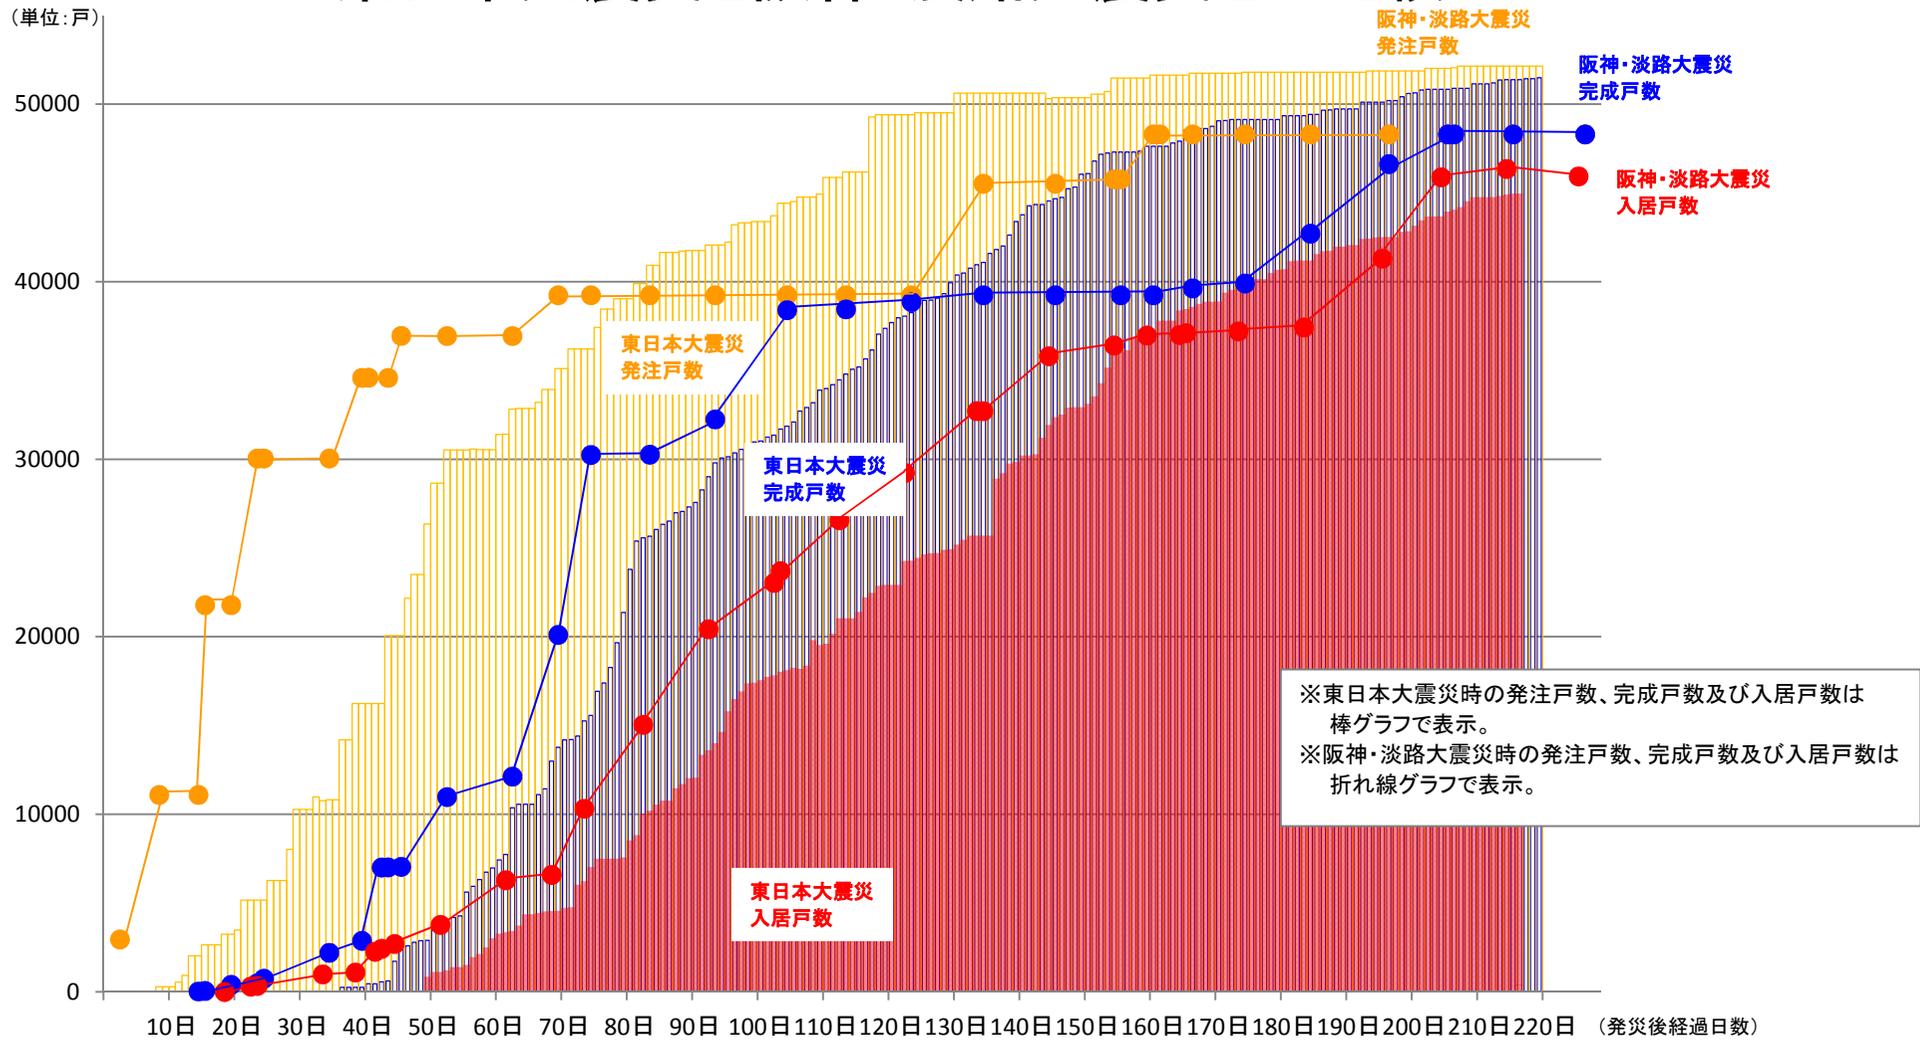

被災者向けの住宅の確保状況

住宅の種類	戸数
仮設住宅 建設戸数(完成戸数)	51,492戸
民間賃貸住宅等(借り上げ分)入居戸数	60,556戸 <内訳> (①民間賃貸住宅 60,431戸 ②地方公務員宿舎 125戸)
公営住宅等 入居戸数	7,331戸
国家公務員宿舎等 入居戸数	2,338戸
雇用促進住宅 入居戸数	6,867戸
合計	128,584戸

※ 国土交通省・厚生労働省調べ

※ 建設戸数は10月17日。その他は10月14日時点把握数(避難所扱い分を含む。)

※ 上表の他、旅館・ホテル(二次避難所)への累計の入居人数は27,803名。
(8月11日時点・観光庁調べ)
また、旅館・ホテルへの直近の調査時点における入居人数は4,337名。
(9月22日時点・内閣府調べ)
