



富山県の地方公共団体におけるトンネルの老朽化対策の状況

2巡目点検(2019~2021)の点検実施率

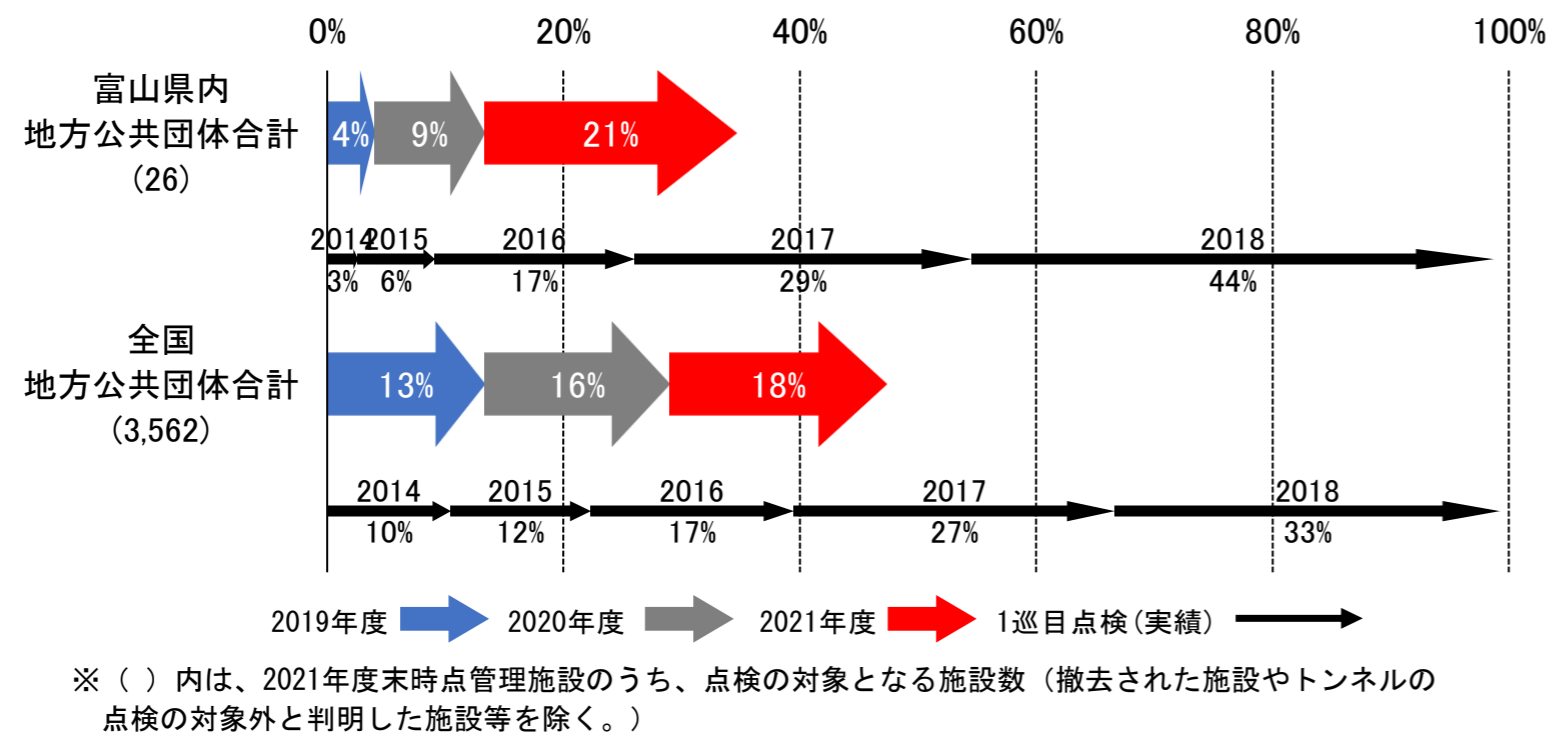

2021年度末時点の判定区分

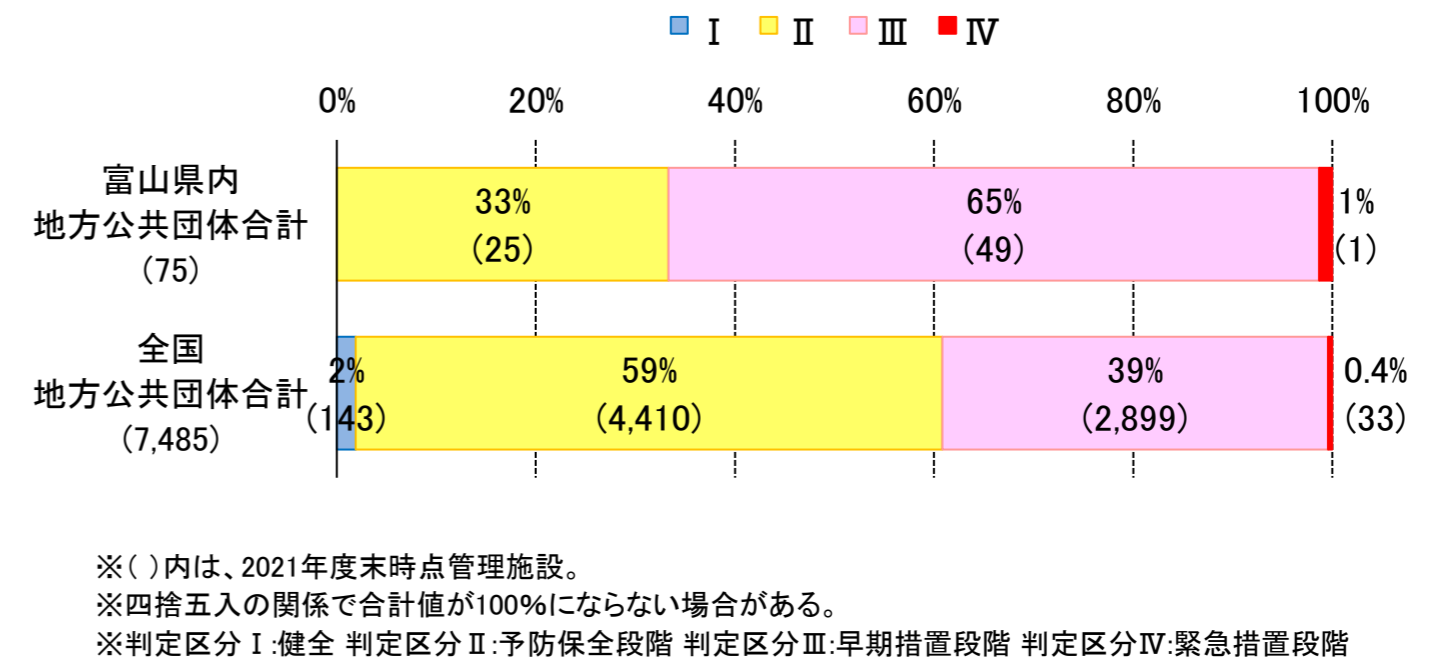

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2021年度末時点)

○1巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置完了済の施設数	
			昨年度からの着手済施設増加数 ※	昨年度からの完了済施設増加数 ※
富山県内 地方公共団体 合計	51	33 (65%)	4	18 (35%)
全国 地方公共団体 合計	3,205	2,728 (85%)	306	1,991 (62%)

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

○2巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置完了済の施設数	
		昨年度からの着手済施設増加数 ※	昨年度からの完了済施設増加数 ※
15	6 (40%)	6	3 (20%)
1,307	757 (58%)	634	143 (11%)

富山県の地方公共団体におけるトンネルの老朽化対策の状況

2021年度末時点

管理者	施設数 (2021年度末時点の判定区分 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	2021年度末時点で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況					
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置完了済の施設数	着手率 完了率		
1 国土交通省	0	12	17	0	29	41%	59%	17	15	5	29%	88%
2 高速道路会社	0	14	0	0	14	100%		0	0	0		
3 富山県道路公社	0	1	1	0	2	50%	50%	1	0	0	0%	
4 富山県	0	12	33	0	45	27%	73%	33	19	8	24%	58%
5 富山市	0	1	2	1	4	25%	50%	3	2	1	33%	67%
6 高岡市	0	0	3	0	3	100%		3	0	0	0%	
7 魚津市	0	0	0	0	0			0	0	0		
8 氷見市	0	2	3	0	5	40%	60%	3	3	3	100%	100%
9 滑川市	0	0	0	0	0			0	0	0		
10 黒部市	0	6	2	0	8	75%	25%	2	0	0	0%	
11 砺波市	0	0	0	0	0			0	0	0		
12 小矢部市	0	0	0	0	0			0	0	0		
13 南砺市	0	1	4	0	5	20%	80%	4	2	1	25%	50%
14 射水市	0	0	0	0	0			0	0	0		
15 舟橋村	0	0	0	0	0			0	0	0		
16 上市町	0	1	1	0	2	50%	50%	1	0	0	0%	
17 立山町	0	0	0	0	0			0	0	0		
18 入善町	0	0	0	0	0			0	0	0		
19 朝日町	0	1	0	0	1	100%		0	0	0		
20 富山県内地公体合計	0	25	49	1	75	33%	65%	50	26	13	26%	52%

※1 2021年度末時点の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 2021年度末時点の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理するトンネルのみ

富山県の地方公共団体におけるトンネルの老朽化対策の状況(1巡目)

2021年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況					着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	着手率	完了率			
1 国土交通省	6	3	20	0	29		20	20	0	14	6					
2 高速道路会社	0	10	4	0	14		4	4	0	4	0					
3 富山県道路公社	0	2	0	0	2		0	0	0	0	0					
4 富山県	0	11	34	0	45		34	25	1	12	2					
5 富山市	0	1	2	1	4		3	2	1	1	1					
6 高岡市	0	0	3	0	3		3	0	0	0	0					
7 魚津市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
8 氷見市	0	2	4	0	6		4	4	0	4	2					
9 滑川市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
10 黒部市	0	6	2	0	8		2	0	0	0	0					
11 砺波市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
12 小矢部市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
13 南砺市	0	1	4	0	5		4	2	2	1	1					
14 射水市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
15 舟橋村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
16 上市町	0	1	1	0	2		1	0	0	0	0					
17 立山町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
18 入善町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
19 朝日町	0	1	0	0	1		0	0	0	0	0					
20 富山県内地公体合計	0	25	50	1	76		51	33	4	18	6					

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理するトンネルのみ

富山県の地方公共団体におけるトンネルの老朽化対策の状況(2巡目)

2021年度末時点

管理者	施設数 (2巡目(2019~2021年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	2巡目(2019~2021年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況					着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	着手率	完了率			
1 国土交通省	0	11	6	0	17		6	4	4	0	0					
2 高速道路会社	0	7	0	0	7		0	0	0	0	0					
3 富山県道路公社	0	1	1	0	2		1	0	0	0	0					
4 富山県	0	5	10	0	15		10	4	4	1	1					
5 富山市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
6 高岡市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
7 魚津市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
8 氷見市	0	0	2	0	2		2	2	2	2	2		100%			
9 滑川市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
10 黒部市	0	5	2	0	7		2	0	0	0	0					
11 砺波市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
12 小矢部市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
13 南砺市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
14 射水市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
15 舟橋村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
16 上市町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
17 立山町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
18 入善町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
19 朝日町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
20 富山県内地公体合計	0	11	15	0	26		15	6	6	3	3					

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理するトンネルのみ
